

Informe Técnico de Avances de Subproyectos

Nombre de la organización:	Conexión Colombia
Nombre del subproyecto:	Fortalecimiento de las cadenas de valor sostenibles de los PFM para promover la gobernanza ambiental, cultural y social de las comunidades de la cuenca del Río Putumayo - Içá en Colombia y Ecuador.
Lugar de intervención:	Colombia - Ecuador
Código del acuerdo de asociación:	
Coordinador del Proyecto:	Carlos Vinasco Sandoval
Periodo de Reporte y fecha de entrega:	Agosto – Noviembre (Entrega 6 de enero de 2026)
Persona/ email de contacto:	c.vinasco@conexioncol.org



Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivos	4
2.1. Objetivo general.....	4
2.2. Objetivos específicos.....	4
3. Metodología	4
3.1. Metodología por objetivos del subproyecto	6
4. Avances, resultados y discusión de la implementación del Subproyecto	8
4.1. Avances en los actividades e indicadores del Subproyecto	8
4.2. Dificultades presentadas en la ejecución del Subproyecto	20
4.2.1. Medidas adoptadas para superar las dificultades	21
4.3. Lecciones aprendidas	21
5. Avances en el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales	22
6. Recomendaciones para mejorar la ejecución	23
7. Anexos.....	24

meliponicultura y al aprovechamiento de frutos amazónicos como lo son el inchi o cacay (*Caryodendron orinocense*) y la canangucha (*Mauritia flexuosa*).

Si bien durante este periodo se presentaron retrasos en la conformación total del equipo técnico del subproyecto, en el marco de los procedimientos definidos en el plan de adquisiciones, así como en la contratación del socio local Fundación Ecuatoriana Populorum Progressio (FEPP) para la implementación de acciones en territorio ecuatoriano con comunidades indígenas de los pueblos Cofán y Kichwa, estas situaciones no han limitado el avance sustantivo del subproyecto. En vista de esta situación, y en coordinación con Wildlife Conservation Society (WCS), las acciones del subproyecto se concentraron de manera prioritaria en territorio colombiano, donde se avanzó en la implementación de actividades estratégicas previamente definidas.

En este contexto, el presente informe técnico de avances documenta de manera estructurada el enfoque metodológico adoptado, los principales avances y resultados alcanzados durante el período reportado, las dificultades identificadas en la ejecución, las lecciones aprendidas y el estado de cumplimiento del marco de resultados y de los estándares ambientales y sociales del subproyecto. Asimismo, el informe presenta recomendaciones orientadas a fortalecer la implementación en la siguiente fase, en coherencia con el enfoque binacional, intercultural y de sostenibilidad que orienta la intervención con un enfoque en el fortalecimiento de las cadenas de valor priorizadas.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Fortalecimiento de las cadenas de valor sostenibles de los PFSM para promover la gobernanza ambiental, cultural y social de las comunidades de la cuenca del Río Putumayo - Içá en Colombia y Ecuador.

2.2. Objetivos específicos

- Fortalecer capacidades productivas, organizativas y comunitarias en el manejo sostenible de los PFSM
- Gestionar la planificación del uso y aprovechamiento de los PFSM para la conectividad ecosistémica
- Fortalecer las cadenas de valor de PFSM, desde la innovación y desarrollo

3. Metodología

La metodología de implementación del subproyecto se ha fundamentado en los lineamientos técnicos y estratégicos definidos para el Fortalecimiento de las cadenas de valor sostenibles de los Productos Forestales No Maderables (PFSM) en la cuenca del río Putumayo-Içá, y se encuentra alineada con el Subcomponente 2.2 del Proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Río Putumayo-Içá, liderado por Wildlife Conservation Society (WCS).

El enfoque metodológico ha integrado principios participativos, interculturales, territoriales y de género, reconociendo los saberes tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, el rol estratégico de las mujeres y los jóvenes, y la necesidad de fortalecer la gobernanza ambiental local como eje para el uso sostenible del bosque. En este sentido, la intervención se ha concebido como un proceso progresivo y adaptativo, ajustado a las dinámicas sociales, culturales, productivas y ambientales de cada territorio en Colombia y Ecuador.

De manera transversal, la metodología articula herramientas de diagnóstico participativo, planificación predial y territorial, fortalecimiento organizativo, asistencia técnica, análisis de cadenas de valor y articulación institucional comercial, promoviendo el diálogo de saberes y la construcción colectiva de acuerdos para el manejo sostenible de los PFNM priorizados, tales como camu camu, asaí, aguaje, cacay y miel de abejas nativas sin aguijón.

Herramientas metodológicas aplicadas

Para la planificación e implementación del subproyecto se emplean herramientas metodológicas participativas que permiten integrar dimensiones sociales, ambientales, productivas y comerciales, entre las cuales se destacan:

- **Diagnósticos participativos:** Se realizó a través de una herramienta de evaluación del estado actual de una organización construida por Conexión Colombia a lo largo de su trayectoria en el territorio. Incluye cinco (5) dimensiones que abarcan procesos administrativos, sociales y ambientales, mercado, operación y contables y financieros.
- **Talleres comunitarios de socialización y fortalecimiento organizativo:** Se validaron y priorizaron las actividades a desarrollar en el marco del subproyecto con enfoque de cadena de valor, reconociendo la especialidad de cada actor dentro de cada eslabón, i) insumos, ii) cosecha y postcosecha, iii) transformación, iv) comercialización.
- **Entrevistas semiestructuradas:** A los participantes del subproyecto se aplicó un instrumento de caracterización organizacional, familiar, y predial; ampliando un componente productivo que lograra dar mayor claridad de las capacidades de desarrollo de fruto/miel, áreas de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.
- **Recorridos de campo y visitas prediales:** Incluye el levantamiento de cartografía social y zonificación predial participativa, donde se identificaron áreas de polígono i) áreas de bosque natural (conservación), ii) áreas de infraestructura, iii) sistemas productivos.
- **Análisis de cadenas de valor por especies priorizadas:** Se identificaron las actividades clave, los cuellos de botella presentes en cada eslabón de la cadena de valor y los actores responsables de su desarrollo. Este análisis permitió priorizar de manera estratégica las acciones de fortalecimiento requeridas en cada eslabón, con el fin de mejorar su desempeño, articulación y sostenibilidad.

Estas herramientas han sido aplicadas de manera diferenciada según el contexto organizativo y territorial, permitiendo no solo el levantamiento de información técnica, sino también el

fortalecimiento del trabajo asociativo, la cohesión interna y la apropiación del subproyecto por parte de las comunidades participantes.

Criterios de selección de participantes

La selección de las familias de las organizaciones MELIPO y ASOMUJER beneficiarias del subproyecto se realizó con base en criterios previamente socializados y concertados con estas, orientados a garantizar el compromiso, la transparencia y la coherencia con los objetivos del proyecto. Los criterios aplicados fueron los siguientes:

- Ser asociado activo de la organización participante.
- El enfoque de atención es por familia, entendida como el conjunto de personas que comparten un mismo hogar y medios de vida vinculados al aprovechamiento de los PFNM, y la meliponicultura, dentro de un predio determinado.
- Se define un (1) participante o beneficiario directo por familia, quien asume los compromisos establecidos en el subproyecto, priorizando la participación de mujeres.
- Cada familia deberá contar con una unidad productiva, entendida como la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA): predio rural, finca, parcela o espacio físico donde la familia desarrolla las actividades de aprovechamiento sostenible de los PFNM, incluyendo colmenas de abejas nativas sin aguijón.
- Residencia en el área de influencia del subproyecto.
- Compromiso con la implementación de prácticas de manejo sostenible de los PFNM.
- Participación activa en los espacios organizativos y asociativos de la organización.
- Disponibilidad para participar en actividades de capacitación, asistencia técnica y seguimiento previstas en el subproyecto.

3.1. Metodología por objetivos del subproyecto

Objetivo 1. Fortalecer capacidades productivas, organizativas y comunitarias para el manejo sostenible de los PFNM

Para este objetivo, la metodología se ha centrado en la caracterización participativa de las capacidades existentes y la identificación de brechas técnicas, organizativas, empresariales y comerciales de las organizaciones y comunidades participantes. Se han desarrollado talleres comunitarios, entrevistas, recorridos de campo y ejercicios de cartografía social, que permitieron construir diagnósticos integrales y definir planes de fortalecimiento ajustados a cada contexto territorial.

A partir de estos insumos, se implementan procesos de formación y asistencia técnica orientados al manejo sostenible, la recolección y la poscosecha de PFNM, así como al fortalecimiento organizativo y socioempresarial, incorporando de manera transversal el enfoque de género en cadenas de valor y promoviendo la participación activa de mujeres y jóvenes.

Objetivo 2. Gestionar la planificación del uso y aprovechamiento de los PFNM para la conectividad ecosistémica

La metodología asociada a este objetivo se orienta a fortalecer la gobernanza territorial mediante la planificación participativa del uso y aprovechamiento sostenible de los PFM. A través de ejercicios de zonificación predial, definición participativa de áreas de uso, formulación de protocolos y planes de manejo, y acompañamiento al monitoreo comunitario, se busca integrar la conservación de los bosques y la conectividad ecosistémica con las dinámicas productivas locales.

En Ecuador, estas acciones se desarrollarán en articulación con el socio local Fundación Ecuatoriana Populorum Progressio (FEPP), una vez se formalice el contrato correspondiente, incorporando los planes de vida de los pueblos indígenas Cofán y Kichwa y asegurando la aplicación del Plan de Pueblos Indígenas (PPI) y de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del proyecto. En Colombia, las acciones se articulan con los instrumentos de planificación territorial, la normatividad ambiental vigente y las iniciativas locales de desarrollo rural sostenible, garantizando igualmente la aplicación transversal de los EAS y los lineamientos de participación, salvaguardas sociales y ambientales definidos para el subproyecto.

Objetivo 3. Fortalecer las cadenas de valor de PFM desde la innovación y el desarrollo de mercados

La metodología del Objetivo 3 se orienta al fortalecimiento de las cadenas de valor de los PFM priorizados, mediante la identificación de oportunidades de innovación, mejora de la calidad y trazabilidad de los productos, y la articulación con mercados de mayor valor, con el fin de generar incentivos económicos sostenibles que contribuyan a la conservación de los bosques y a la mejora de los medios de vida de las comunidades indígenas y campesinas de la cuenca del río Putumayo-Içá.

Durante el periodo de reporte, este objetivo se encuentra en fase preparatoria y se desarrollará con mayor énfasis en los siguientes meses, conforme a los resultados de los diagnósticos participativos y a la formulación de los planes de fortalecimiento productivo, organizativo y socioempresarial construidos con las organizaciones y comunidades participantes, así como una vez se cuente con la vinculación del consultor comercial, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el plan de adquisiciones.

Las acciones previstas incluyen el análisis de los eslabones de las cadenas de valor, el fortalecimiento de capacidades comerciales, la mejora de procesos de calidad y trazabilidad, y la articulación con aliados estratégicos y espacios comerciales, garantizando de manera transversal la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) y, cuando aplique, del Plan de Pueblos Indígenas (PPI).

Enfoques transversales y aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS)

La implementación metodológica del subproyecto incorpora de manera transversal los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Río Putumayo-Içá, garantizando la identificación, prevención y mitigación de riesgos ambientales y sociales, así como la maximización de impactos positivos en las comunidades participantes.

Finalmente, durante el proceso de implementación metodológica, Conexión Colombia ha mantenido una articulación permanente con los equipos de adquisiciones, cadenas de valor, Estándares Ambientales y Sociales (EAS) y monitoreo y seguimiento de Wildlife Conservation Society (WCS), con el fin de asegurar la coherencia técnica, administrativa y programática del subproyecto.

4. Avances, resultados y discusión de la implementación del Subproyecto

Durante el periodo de reporte comprendido entre los meses de agosto y noviembre de 2025, se avanzó conforme a las actividades priorizadas en el cronograma de trabajo exclusivamente con las organizaciones en Colombia, específicamente con la Asociación de Mujeres Frutos Amazónicos de Colombia (ASOMUJER) y la Asociación Meliponas del Sur (MELIPO).

Durante este periodo no fue posible avanzar en la implementación de actividades con las comunidades indígenas en Ecuador, correspondientes a los pueblos Cofán y Kichwa, debido a que el proceso de contratación directa, definido en el manual de adquisiciones del proyecto, limitó la vinculación oportuna del socio local Fundación Ecuatoriana Populorum Progressio (FEPP), conforme a la propuesta presentada en la convocatoria.

En este contexto, los avances se concentraron en actividades relacionadas con el diagnóstico técnico, organizativo y comercial, la socialización del subproyecto con las organizaciones, el levantamiento de información predial y territorial y la construcción de insumos técnicos para la planificación del uso sostenible de los Productos Forestales No Maderables (PFNM), en coherencia con la fase inicial de implementación prevista para este periodo.

4.1. Avances en los actividades e indicadores del Subproyecto

Durante estos meses, y en alineación con la planificación y en coherencia con las dificultades presentadas para iniciar en el territorio de Ecuador, los avances se desarrollaron exclusivamente en Colombia, con el acompañamiento a la Asociación de Mujeres Frutos Amazónicos de Colombia (ASOMUJER) y la Asociación Meliponas del Sur (MELIPO), priorizando las actividades correspondientes a la fase inicial de implementación del subproyecto.

Objetivo 1. Fortalecer las capacidades productivas, organizativas y comunitarias para el manejo sostenible de los PFNM

Actividades e indicadores asociados

Las actividades desarrolladas en el marco de este objetivo se enfocaron en la socialización del subproyecto, el fortalecimiento organizativo y el levantamiento de información diagnóstica a nivel técnico, productivo y socioeconómico (Anexo 1, Diagnóstico).

Con la Asociación de Mujeres Frutos Amazónicos (ASOMUJER) se identificaron brechas prioritarias en el eslabón de cosecha del inchi o cacay, particularmente relacionadas con la ausencia de metodologías de trazabilidad en los procesos de cosecha y postcosecha, así

como vacíos en el conocimiento de las rutas institucionales para el acceso a permisos de uso y aprovechamiento del recurso ante la autoridad ambiental. Como respuesta a estas brechas, se realizaron 20 visitas prediales, correspondientes a 20 unidades productivas, de un total de 60 asociados y recolectores vinculados al subproyecto.

Imagen 1. Socialización con la Asociación de Mujeres Frutos Amazónicos (ASOMUJER)




Fuente: Conexión Colombia, 2025

Las visitas se desarrollaron en el municipio de Villagarzón (Putumayo) y permitieron levantar información biofísica, productiva y territorial como insumo para el diagnóstico organizativo y la planificación predial. Durante este periodo se visitaron cinco (5) veredas: La Pradera, La Betulia y Miravalle, ubicadas en zona de montaña, y Guineo y La Esperanza, localizadas en la parte media y baja de la cuenca del río Putumayo. Estas dos grandes áreas presentan diferencias significativas en los medios de vida de las familias campesinas. En las zonas de montaña, los medios de vida están principalmente asociados a la provisión y aprovechamiento de los recursos del bosque natural. En contraste, en la parte media y baja de la cuenca, además del aprovechamiento del inchi o cacay silvestre, las familias cuentan con ingresos complementarios derivados de actividades productivas como el cultivo de chontaduro, cacao, la ganadería, entre otros.

Las unidades prediales visitadas tienen, en promedio, una extensión de 20 hectáreas. En la zona de cordillera, se registró que aproximadamente el 70 % del área corresponde a bosque natural, mientras que en la cuenca media y baja del río Putumayo el promedio de cobertura boscosa es del 25 %. El diagnóstico completo de esta organización se evidencia en el anexo 1.1.

Imagen 2. Visitas a unidades prediales y árboles de inchi o cacay

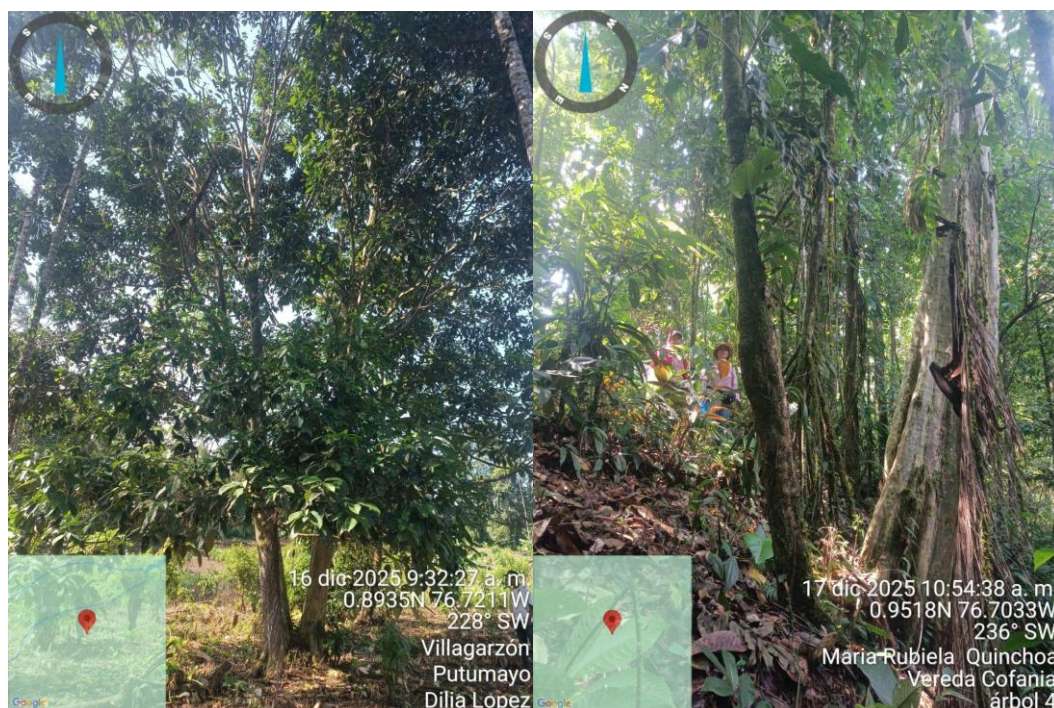

Fuente: Conexión Colombia, 2025

A nivel productivo, se evidenció que el 100 % de los individuos de inchi o cacay (*Caryodendron orinocense*) son silvestres, con una altura promedio de 30 metros y una producción bianual estimada en 1,5 bultos por individuo, es decir 35 kilogramos. En promedio, cada familia cuenta con 15 árboles de inchi, de los cuales el 90 % corresponde a individuos machos y el 10 % a hembras; de estas últimas, el 80 % se encuentra en producción y el 20 % en etapa de crecimiento. En el caso de la canangucha (*Mauritia flexuosa*), si bien la mayoría de las familias reporta presencia de la especie en sus predios, actualmente no se realiza aprovechamiento del recurso, debido al desconocimiento de mercados y canales de comercialización, lo cual fue identificado como una oportunidad estratégica de fortalecimiento dentro del subproyecto.

En cuanto a la Asociación Meliponas del Sur (MELIPO), se precisa que, si bien la organización reporta un total de 35 asociados, el proceso de diagnóstico participativo permitió establecer que estos corresponden en la práctica a 15 familias, entendidas como unidades de medios de vida que comparten un mismo predio y una unidad productiva vinculada a la meliponicultura. Esta situación fue identificada durante la fase diagnóstica y posteriormente ratificada a partir de la atención de un mecanismo de Petición, Queja o Reclamo (PQRS) presentado ante Wildlife Conservation Society (WCS), lo cual derivó en un espacio de revisión y verificación de la información con la organización, fortaleciendo la transparencia, la gobernanza interna y la aplicación consistente de los criterios de selección del subproyecto.

Imagen 3. Socialización subproyecto a la Asociación Meliponas del Sur (MELIPO)



Fuente: Conexión Colombia, 2025

A partir de esta clarificación, se identificaron brechas asociadas a la cadena de valor de la miel, principalmente en los componentes de valor agregado y comercialización, considerando los eslabones de insumos, cosecha, transformación y mercado. En este marco, se realizaron 15 visitas técnicas a familias meliponicultoras del municipio de Puerto Asís (Putumayo). El diagnóstico completo de esta organización se evidencia en el anexo 1.2.

Imagen 4. Visitas de campo realizadas a las áreas productivas y trabajos comunitarios



Fuente: Conexión Colombia, 2025

Cada familia cuenta, en promedio, con 20 colmenas de especies como *Tetragonisca angustula* (angelita) y *Melipona eburnea* (boca de sapo), con una producción anual de hasta 1,5 litros de miel por colmena. Desde el punto de vista ambiental, se evidenció que el 30 % de las familias se localiza en zonas suburbanas y el 70 % en áreas de bosque natural, donde se identifican árboles frutales y maderables como las principales fuentes de alimento para las especies de abejas nativas. Adicionalmente, se registró un promedio de tres fuentes hídricas por finca, así como la presencia de cultivos complementarios como cacao y chontaduro.

De manera transversal, se avanzó en la formulación del plan de fortalecimiento de las organizaciones, el cual integra el diagnóstico organizacional y productivo, la evaluación por eslabón dentro de cada cadena de valor, los alcances del proyecto y una batería de indicadores sociales, ambientales y económicos para el seguimiento del subproyecto.

Desde el enfoque social, se identificó que aproximadamente el 90 % de las familias presenta un bajo nivel educativo, sin haber completado la educación primaria, y que sus ingresos se encuentran por debajo del salario mínimo legal vigente, información que sustenta la pertinencia de las acciones de fortalecimiento planteadas.

Las evidencias generadas durante este periodo incluyen, actas, listados de asistencia, registros fotográficos, fichas de caracterización y matrices de diagnóstico, las cuales respaldan los avances reportados en las actividades e indicadores del subproyecto.

Acompañamiento Técnico

Se realizó acompañamiento a las comunidades de la asociación Melipo y Asomujer con la finalidad de llevar a cabo encuentros comunitarios que fortalezcan las capacidades de los productores y promover espacios de interacción directa con los integrantes vinculadas a este proceso.

En la Asociación Asomujer, la jornada desarrollada inició a las 9:00 a. m. en la caseta comunal de la Vereda La Betulia, contando con la participación activa de los asociados. Este espacio fue cuidadosamente estructurado con el propósito de fortalecer el diálogo, la cohesión grupal y el aprendizaje técnico, aspectos fundamentales para el adecuado desarrollo y sostenibilidad del subproyecto.

Dentro de la jornada, tuvieron especial relevancia las actividades didácticas, orientadas a identificar las cualidades y fortalezas de cada asociado, así como a estimular la creatividad, la expresión personal y la autoestima. Estas dinámicas propiciaron un ambiente de integración caracterizado por la participación activa, risas y comentarios positivos, lo que contribuyó de manera significativa al fortalecimiento de la confianza y el trabajo en equipo.

Posteriormente, se continuó con la socialización de las prácticas clave para la recolección sostenible del fruto de Inche, haciendo énfasis en la importancia de aplicar técnicas responsables que permitan la protección del ecosistema y, al mismo tiempo, garanticen la obtención de un producto de calidad. Este espacio se desarrolló a través de un diálogo abierto con los recolectores, facilitando el intercambio de experiencias y saberes locales, lo cual enriqueció de manera significativa el proceso formativo.

Los principales temas abordados fueron:

- Buenas prácticas para la recolección y manejo del fruto.
- Importancia del cumplimiento de estándares de calidad para asegurar la comercialización.
- Beneficios económicos del Inchi como fuente de ingresos complementaria y estable para las
- familias campesinas.

- Su rol como alternativa productiva frente a economías ilícitas, aportando a la transición hacia
- modelos sostenibles.
- Ventajas del trabajo asociativo y de la articulación con proyectos institucionales.
- Este espacio permitió consolidar la visión del Inchi como una opción viable de diversificación productiva, contribuyendo a la sostenibilidad económica y ambiental del territorio (*Anexo 1.3*).

Imagen 5. Talleres de fortalecimiento organizacional



Fuente: Conexión Colombia, 2025

En la Asociación Melipo se desarrollaron dos jornadas de trabajo, organizadas mediante la distribución del grupo en dos sub-grupos, con el fin de facilitar la participación activa de los asociados y garantizar un adecuado desarrollo de los encuentros. Esta estrategia metodológica permitió optimizar los espacios de diálogo, atención técnica y toma de decisiones colectivas.

En una primera fase, se realizó la socialización y análisis del PQRS allegado a la institución, brindando las claridades técnicas y administrativas necesarias frente a los aspectos señalados. Este ejercicio permitió generar compromisos claros por parte de la asociación, orientados a fortalecer los mecanismos internos de organización y a definir de manera adecuada y transparente la participación de los integrantes dentro del subproyecto.

Desde el componente técnico, se llevó a cabo la socialización de los criterios para la selección de beneficiarios del subproyecto, haciendo énfasis en el enfoque de fortalecimiento por familia, como estrategia para garantizar impactos sostenibles y equitativos a nivel organizativo y comunitario. Este espacio permitió aclarar dudas, unificar criterios y fortalecer la comprensión del alcance del subproyecto por parte de los asociados.

Posteriormente, se dio continuidad con la revisión técnica de los equipos destinados a la dotación y fortalecimiento de la Asociación Melipo, evaluando su pertinencia, funcionalidad y coherencia con las actividades productivas desarrolladas por la organización. Se resaltó la importancia de insumos como postes plásticos, congeladores solares y ollas, así como el apoyo a la actividad de turismo comunitario, los cuales se solicitan puedan ser ajustados y priorizados dentro de la dotación a entregar, ya que van de acuerdo con las necesidades identificadas y las capacidades operativas de la asociación. (*Anexo 1.4*).

Imagen 6. Jornada de trabajo con asociados de Melipo




Fuente: Conexión Colombia, 2025

Objetivo 2. Gestionar la planificación del uso y aprovechamiento de los PFM para la conectividad ecosistémica.

Durante el periodo de reporte, las acciones asociadas a este objetivo se desarrollaron con base en la suscripción de actas de acuerdo de trabajo con las organizaciones participantes en Colombia, en las cuales se formalizaron compromisos relacionados con la participación en el subproyecto, el uso sostenible de los PFM y la implementación progresiva de procesos de planificación predial y territorial, en coherencia con los criterios ambientales y sociales definidos (Anexo 2. Acuerdos de trabajo).

A partir de estos acuerdos, las actividades se enfocaron en el levantamiento de información predial y territorial de las familias participantes, como insumo para la planificación del uso sostenible del territorio y la integración de criterios de conectividad ecosistémica en los sistemas productivos basados en PFM.

Mapa 2. Ubicación de las familias participantes del proyecto sobre la cuenca del río Putumayo Ica

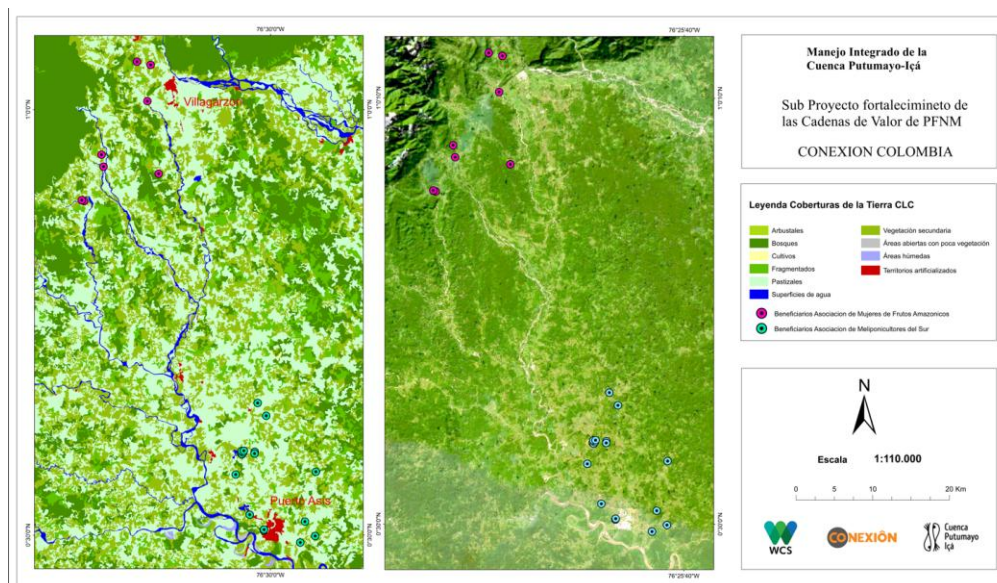

Fuente: Conexión Colombia, 2025

En el caso de la Asociación de Mujeres Frutos Amazónicos de Colombia (ASOMUJER), la información recopilada durante las visitas prediales permitió caracterizar la extensión de los predios, la cobertura boscosa, la presencia de fuentes hídricas y la distribución espacial de los individuos de inchi o cacay y canangucha.

Como resultado, se identificó que los predios presentan una alta dependencia del bosque natural, con coberturas que oscilan entre el 25 % y el 70 %, lo cual evidencia el potencial del aprovechamiento sostenible de PFM como estrategia compatible con la conservación del bosque y la conectividad ecológica.

De manera complementaria, se avanzó en la identificación preliminar de áreas de conservación, uso sostenible y zonas productivas, a partir de ejercicios de reconocimiento territorial y cartografía básica desarrollados en campo. Estos insumos constituyen la base para la zonificación predial participativa, que se profundizará en las siguientes fases del subproyecto.

Mapa 3. Zonificación predial con enfoque integral para familias campesinas participantes del subproyecto




Fuente: Conexión Colombia, 2025

Con la Asociación Meliponas del Sur (MELIPO), el levantamiento de información territorial permitió identificar la relación entre la localización de las unidades productivas de meliponicultura y la disponibilidad de hábitats favorables para las abejas nativas sin aguijón. Se evidenció que el 70 % de las familias se encuentra en áreas de bosque natural, donde la diversidad de especies vegetales cumple un rol clave en la provisión de alimento y refugio para las colonias, mientras que el 30 % restante se localiza en zonas suburbanas, lo que plantea retos y oportunidades diferenciadas para la planificación del manejo del entorno.

Estos avances permiten contar con una línea base territorial y ambiental y con acuerdos de trabajo formalizados, que orientarán la toma de decisiones en las siguientes fases del subproyecto. Estas acciones se desarrollarán de manera articulada con los planes de fortalecimiento organizativo y productivo, garantizando la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) y el enfoque de conectividad ecosistémica promovido por el subproyecto

Mapa 4. Unidades productivas identificadas en MELIPO

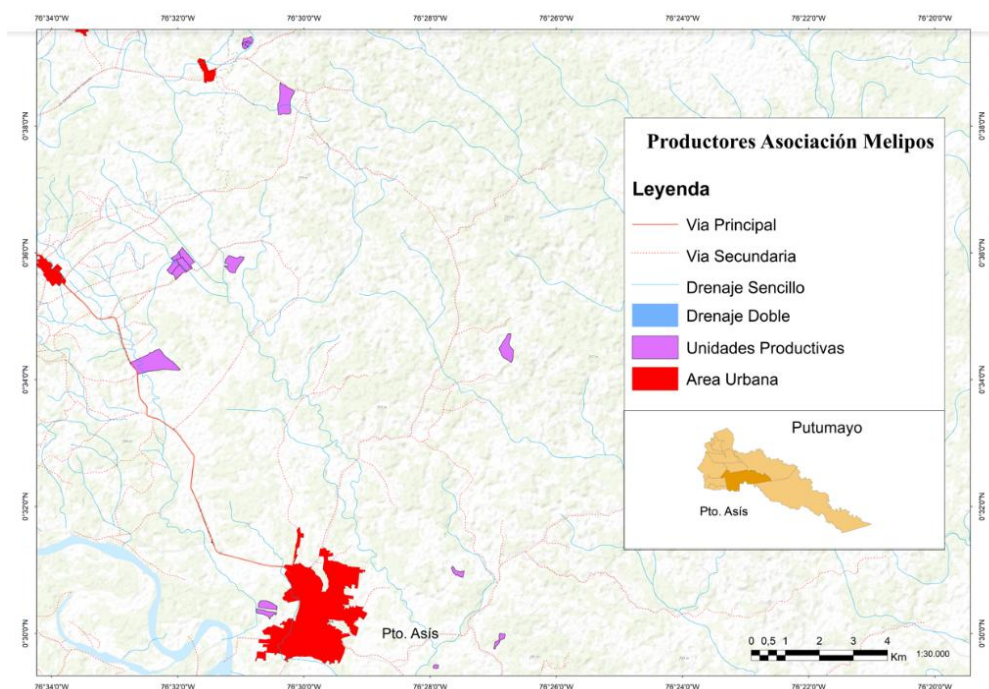

Fuente: Conexión Colombia, 2025

Objetivo 3. Fortalecer las cadenas de valor de los PFNM desde la innovación y el desarrollo de mercados

Las acciones asociadas al Objetivo 3, se desarrollaron en fase preparatoria, con base en los resultados del diagnóstico técnico, productivo, organizativo y comercial realizado con las organizaciones participantes en Colombia. Estos diagnósticos permitieron identificar de manera específica las brechas estructurales y operativas en las cadenas de valor de los PFNM priorizados, constituyéndose en el principal insumo para la formulación de los planes de fortalecimiento.

En el caso de la cadena de inchi/cacay y canangucha, trabajada con la Asociación de Mujeres Frutos Amazónicos de Colombia (ASOMUJER), el diagnóstico se identifica y cuantifican los principales temas priorizados para el fortalecimiento organizativo. Los resultados se agrupan en cinco componentes clave: asociatividad y sostenibilidad, aspectos contables y financieros, aspectos de mercado, aspectos administrativos y aspectos de operación. Esta caracterización permite visualizar de manera clara las áreas con mayor demanda de acompañamiento y aquellas que requieren menor intervención, sirviendo como insumo para la definición de estrategias de fortalecimiento acordes a las necesidades reales de la organización.

Gráfica 1. Estado organizacional actual para ASOMUJER



Fuente: Conexión Colombia, 2025

A partir de este diagnóstico, el componente con mayores necesidades de fortalecimiento en ASOMUJER es asociatividad y sostenibilidad, el cual presenta la menor calificación, evidenciando debilidades significativas relacionadas con la cohesión organizativa, los procesos de participación, fortalecimiento a la red de proveeduría, la gobernanza interna y la sostenibilidad de la asociación en el mediano y largo plazo.


Para los aspectos de mercado, con 4 puntos, refleja oportunidades y brechas relacionadas con el acceso a mercados, la comercialización de productos y el posicionamiento de la oferta. Aunque este componente presenta un menor peso relativo frente a la asociatividad, resulta clave para mejorar la generación de ingresos y la viabilidad económica de la organización, lo cual impacta la cadena completa.

Para el proceso del aprovechamiento del fruto Inchi o cacay, este se realiza en un 100 % en individuos silvestres, sin procesos sistematizados de trazabilidad en cosecha y poscosecha, ni registros que permitan verificar volúmenes, frecuencia de recolección o cumplimiento de criterios ambientales. Asimismo, se identificaron vacíos en el conocimiento y gestión de los permisos de aprovechamiento ante la autoridad ambiental, así como una dependencia de compradores intermediarios, lo que limita la captura de mayor valor por parte de la organización.

Adicionalmente, se identificó que, si bien existe disponibilidad del recurso canangucha en los predios, actualmente no se realiza su aprovechamiento, debido al desconocimiento de mercados, requerimientos técnicos y canales de comercialización, lo cual representa una oportunidad estratégica de diversificación productiva dentro del subproyecto.

Para el caso de la cadena de la miel de abejas nativas sin aguijón, trabajada con la Asociación Meliponas del Sur (MELIPO), el diagnóstico evidenció que, aunque las familias cuentan en promedio con 20 colmenas por unidad productiva, la comercialización se realiza principalmente a nivel local y de manera informal, sin estandarización de procesos de cosecha, control de calidad, ni desarrollo de presentaciones comerciales diferenciadas. Se identificaron brechas en los eslabones de transformación, valor agregado y acceso a mercados, así como limitaciones en capacidades organizativas para la negociación colectiva y el posicionamiento del producto.

Gráfica 2. Estado organizacional actual para MELIPO

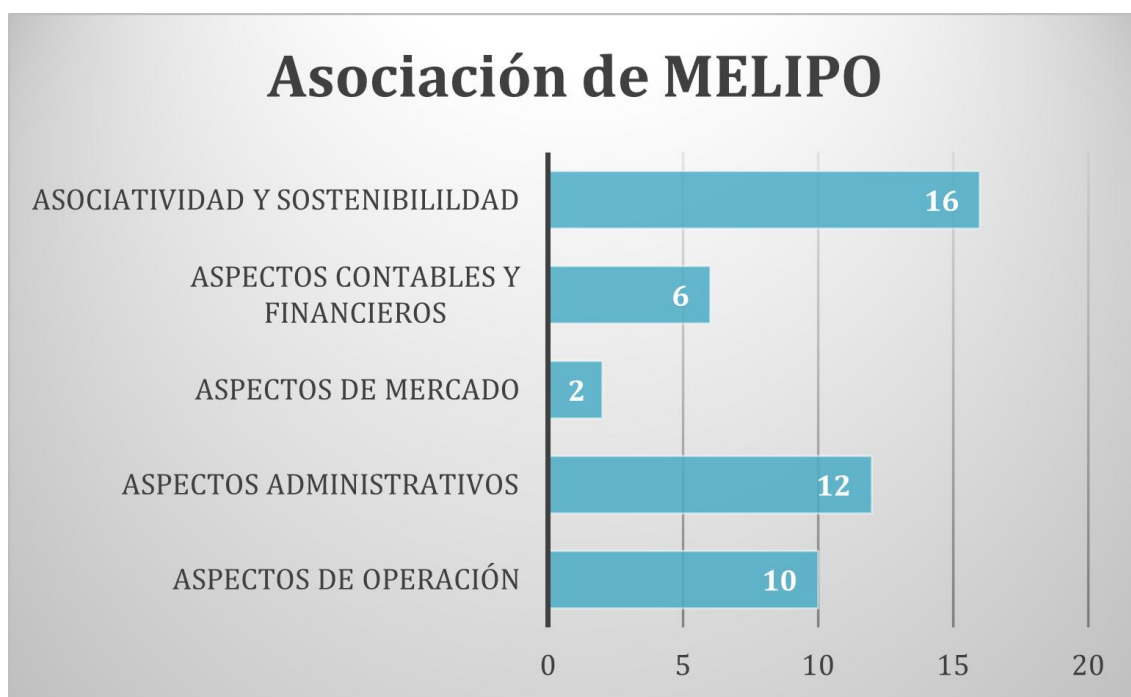

Fuente: Conexión Colombia, 2025

La asociación MELIPO evidencia que el componente identificado con mayores necesidades es aspectos de mercado, el cual presenta la calificación más baja. Esto indica debilidades significativas relacionadas con la comercialización, el acceso a mercados, el posicionamiento de productos y la articulación comercial, aspectos clave para mejorar los ingresos y la sostenibilidad económica de la asociación.

En segundo lugar, se ubican los aspectos contables y financieros, lo que refleja necesidades importantes en el manejo financiero, control contable, planificación económica y fortalecimiento de capacidades para una gestión financiera más eficiente y transparente.

De manera transversal, los diagnósticos permitieron identificar la ausencia de modelos de negocio consolidados, la necesidad de fortalecer capacidades en costos, precios, márgenes y logística, y la importancia de incorporar herramientas de trazabilidad social, ambiental y productiva como condición habilitante para el acceso a mercados de mayor valor.

En este contexto, durante el periodo de reporte se avanzó en la formulación preliminar de los planes de fortalecimiento productivo y comercial, integrando las brechas identificadas por eslabón y definiendo rutas de intervención diferenciadas para cada organización. La implementación de acciones específicas de fortalecimiento comercial, desarrollo de productos, validación de modelos de negocio y articulación con aliados estratégicos se desarrollará con mayor énfasis en los siguientes meses, una vez se cuente con la vinculación del consultor comercial, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el plan de adquisiciones y en articulación con Wildlife Conservation Society (WCS).

Todas las acciones previstas se implementarán garantizando de manera transversal la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) y, cuando aplique, del Plan de Pueblos Indígenas (PPI), asegurando la sostenibilidad social, ambiental y económica de las cadenas de valor de los PFM.

4.2. Dificultades presentadas en la ejecución del Subproyecto

Durante el periodo de ejecución se identificaron algunas dificultades que incidieron en el ritmo de avance de determinadas actividades del subproyecto, particularmente en su fase inicial de implementación.

La principal dificultad estuvo asociada a la no conformación total del equipo técnico de Conexión Colombia durante el periodo de reporte, conforme los procedimientos establecidos en el plan y manual de adquisiciones del proyecto. Esta situación incidió en el avance de actividades clave como la recolección de información diagnóstica, la zonificación predial participativa y la formulación de los planes de fortalecimiento organizativo y comercial, las cuales fueron priorizadas de manera gradual conforme se avanzó en la vinculación del equipo.

Adicionalmente, no fue posible avanzar en la implementación de actividades con las comunidades indígenas en Ecuador, correspondientes a los pueblos Cofán y Kichwa, debido a que el proceso de contratación directa definido en el manual de adquisiciones del proyecto limitó la vinculación oportuna del socio local Fundación Ecuatoriana Populorum Progressio (FEPP), de acuerdo con la propuesta presentada en la convocatoria. Esta situación fue conocida y coordinada con Wildlife Conservation Society (WCS), motivo por el cual las acciones del subproyecto se concentraron de manera prioritaria en territorio colombiano durante este periodo.

En el trabajo con la Asociación Meliponas del Sur (MELIPO) se presentaron particularidades relacionadas con la definición y validación de las familias participantes, lo que requirió procesos adicionales de revisión, ajuste y concertación interna, incluyendo la atención de un mecanismo de Petición, Queja o Reclamo (PQRS). Estos procesos, aunque necesarios para garantizar la transparencia y la correcta aplicación de los criterios del subproyecto, impactaron los tiempos inicialmente previstos para algunas actividades.

Por otra parte, en las veredas con limitado acceso y baja conectividad, especialmente aquellas vinculadas a la Asociación de Mujeres Frutos Amazónicos de Colombia (ASOMUJER), la comunicación con los actores del proyecto se vio restringida por la dependencia de

conectividad satelital, lo que dificulta la coordinación oportuna y eficiente de algunas actividades programadas.

4.2.1. Medidas adoptadas para superar las dificultades

Con el fin de mitigar las dificultades identificadas y asegurar la continuidad y coherencia del subproyecto, se adoptaron las siguientes medidas de carácter técnico, operativo y de coordinación:

En relación con la no conformación total del equipo técnico, se prioriza una implementación gradual de las actividades, enfocando los esfuerzos en aquellas que podían desarrollarse con el equipo disponible, particularmente los procesos de socialización, diagnóstico participativo y levantamiento de información predial. De manera paralela, se fortaleció la articulación con los equipos de adquisiciones, cadenas de valor, Estándares Ambientales y Sociales (EAS) y monitoreo y seguimiento de Wildlife Conservation Society (WCS), con el propósito de asegurar el cumplimiento de los procedimientos y preparar las condiciones para la ejecución de las siguientes fases del subproyecto.

Frente a la imposibilidad de avanzar temporalmente en Ecuador, se acordó, en coordinación con WCS, reorientar de manera prioritaria las acciones hacia el territorio colombiano, sin afectar el alcance general del subproyecto. De forma complementaria, se avanza de manera prioritaria en el proceso de contratación directa de manera articulada con el equipo de adquisiciones con el fin de que en enero de 2026 se formalice la contratación del socio local Fundación Ecuatoriana Populorum Progressio (FEPP).

En el caso de la Asociación Meliponas del Sur (MELIPO), ante las particularidades relacionadas con la definición de las familias participantes, se activaron los mecanismos de atención de Peticiones, Quejas o Reclamos (PQRS), promoviendo espacios de diálogo, revisión y verificación de información con la organización. Esta medida permitió clarificar los criterios de selección, validar el número de familias beneficiarias y fortalecer la gobernanza interna, garantizando la transparencia y la participación informada.

Para enfrentar las limitaciones de conectividad y acceso en algunas veredas vinculadas a la Asociación de Mujeres Frutos Amazónicos de Colombia (ASOMUJER), se ajustaron las estrategias de comunicación y coordinación, combinando encuentros presenciales, programación flexible de actividades y uso de canales alternativos, con el fin de asegurar la continuidad de los procesos comunitarios.

Estas medidas han permitido mantener la implementación del subproyecto dentro de un enfoque de gestión adaptativa, asegurando avances sustantivos durante la fase inicial y sentando bases sólidas para el desarrollo de las siguientes etapas.

4.3. Lecciones aprendidas

La implementación del subproyecto durante su fase inicial permitió identificar aprendizajes clave que aportan a la comprensión de las dinámicas territoriales, organizativas y operativas propias de las cadenas de valor de PFM en el contexto amazónico.

Una primera lección aprendida es la importancia de contar con el equipo técnico completo y oportunamente conformado. La experiencia evidenció que, cuando el equipo no se encuentra plenamente integrado, se ralentizan procesos críticos como el levantamiento de información en campo, la zonificación predial participativa y la formulación de los planes de fortalecimiento organizativo y comercial, lo que obliga a realizar ajustes y reprogramaciones en los cronogramas de trabajo.

Asimismo, se reafirmó la relevancia de mantener una articulación permanente con Wildlife Conservation Society (WCS) y con las organizaciones locales participantes. Esta coordinación ha sido fundamental para asegurar la coherencia técnica y programática del subproyecto, facilitar la toma de decisiones oportunas y garantizar la correcta aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) en todas las etapas del proceso.

El trabajo de campo permitió evidenciar que las dinámicas del territorio exigen una planificación flexible y adaptativa. Factores como las limitaciones de conectividad, las dificultades de acceso, la variabilidad climática y las condiciones socioeconómicas de las familias influyen directamente en la ejecución de las actividades, lo que requiere enfoques metodológicos ajustables y sensibles al contexto local.

Otra lección relevante se relaciona con la necesidad de abordar desde etapas tempranas las brechas estructurales de las cadenas de valor, tales como la ausencia de trazabilidad en los procesos productivos, el desconocimiento de las rutas institucionales para el aprovechamiento legal de los PFM y la falta de mercados claros y estables para productos como el inchi/cacay, la canangucha y la miel de abejas nativas sin aguijón. La identificación temprana de estas brechas resulta clave para asegurar la viabilidad técnica, ambiental y comercial de los procesos de fortalecimiento.

Finalmente, el proceso confirmó que los espacios de diagnóstico participativo y diálogo comunitario no solo cumplen una función técnica, sino que son determinantes para fortalecer la transparencia, la gobernanza interna y la apropiación del subproyecto por parte de las organizaciones.

5. Avances en el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales

Con respecto a los avances relacionados con las EAS, el equipo de Conexión Colombia con el apoyo de WCS ajustó la herramienta a las actividades priorizadas en el marco del subproyecto. Se estructuró de manera coherente, partiendo de los objetivos del subproyecto, seguidos por las actividades clave, a partir de las cuales se identifican los riesgos sociales potenciales. Para cada riesgo se analizan sus causas, los impactos esperados, la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto, lo que facilita la priorización de acciones preventivas y correctivas.

Un aspecto relevante del instrumento es la incorporación de planes de tratamiento, en los que se plantean estrategias concretas para prevenir, reducir o manejar los riesgos identificados. Estas medidas incluyen acciones como el fortalecimiento del diagnóstico

participativo, la programación de espacios de socialización, jornadas de sensibilización, acompañamiento técnico continuo y ajustes metodológicos durante la implementación.

Asimismo, la matriz contempla la asignación de responsables, el seguimiento periódico y la definición de una frecuencia de actualización, lo que contribuye a que el instrumento no sea estático, sino una herramienta viva que se ajusta a las dinámicas del territorio y a la evolución de los subproyectos.

Para otros instrumentos como el PPI y PPIP se ajustaron los instrumentos a las actividades priorizadas en el subproyecto y las dinámicas relacionadas con las asociaciones i) ASOMUJER y ii) MELIPO, buscando desarrollar con la mayor responsabilidad y trabajo conjunto estas actividades en territorio, cumplimiento con los estándares relacionados.

También, se realizó la socialización del contenido del PQRS ante los integrantes de la Asociación Melipo, con el propósito de garantizar su conocimiento y asegurar un manejo transparente y adecuado de la situación. Durante este espacio, algunos asociados manifestaron que la inconformidad presentada se encuentra relacionada con experiencias previas de personas que participaron en otros proyectos dentro de la organización y que no cumplieron de manera satisfactoria con los compromisos y actividades establecidos durante su ejecución.

En atención a lo anterior, el equipo técnico de Conexión Colombia brindó las claridades correspondientes, explicando que para el actual subproyecto se definieron criterios técnicos de selección, orientados al fortalecimiento de la línea productiva que la organización viene desarrollando. Asimismo, se precisó que el tipo de beneficio del proyecto es otorgado por familia, criterio que fue debidamente socializado y explicado durante la jornada.

Este espacio permitió aclarar los alcances del subproyecto, resolver inquietudes y fortalecer la transparencia del proceso, contribuyendo a un ambiente de diálogo constructivo y confianza entre los asociados.

Como resultado del trámite de PQRS, la asociación asumió el siguiente compromisos:

- Realizar una revisión interna a nivel organizativo, incluyendo sus estatutos, con el fin de adelantar la revisión y actualización de la base de datos de asociados, así como la definición clara del listado de familias beneficiarias del proyecto.

6. Recomendaciones para mejorar la ejecución

A partir de los avances alcanzados, las dificultades identificadas y las lecciones aprendidas durante la fase inicial de implementación, se reconoce la conveniencia de disponer de la información clave antes de iniciar el subproyecto, particularmente en lo relacionado con el plan y los procedimientos de adquisiciones, y su socialización con el equipo ejecutor (Conexión Colombia). Contar con esta información desde etapas previas al inicio de la ejecución facilita la anticipación de tiempos, secuencias y dependencias en la conformación

del equipo técnico y en la programación de las actividades en territorio, contribuyendo a una implementación más ordenada, previsible y eficiente.

7. Anexos.

Anexo 1. Diagnósticos de las organizaciones

Anexo 1.1. Documento del diagnóstico validado (Informe técnico del análisis de brechas)

Anexo 1.1.1. Lista de asistencia desagregadas por sexo

Anexo 1.1.2. Actas de reunión sobre PQR con la organización Melipo

Anexo 1.1.3. Fotografías de las actividades

Anexo 1.2 Planes de fortalecimiento en construcción

Anexo 1.2.1 Fotografías de construcción plan de fortalecimiento.

Anexo 1.3. Informes de seguimiento

Anexo 1.3.1 Registros de asistencia de actividades

Anexo 1.7. Agenda del intercambio del 3 al 6 de diciembre de 2025.

Anexo 2.1. Actas firmadas

Anexo 2.1.1. Plan Pueblos Indígenas y Plan de gestión Ambiental y Social.

Anexo 2.2. Mapa con familias georreferenciadas

Anexo 2.2.1. Mapas de Zonificación

Anexo 2.2.2. Listados de asistencia.

Anexo 2.3. Listado de asistencia.

Anexo 3. 1 base de datos de actores en construcción

MARCO DE RESULTADOS DEL SUBPROYECTO

<i>Objetivo principal</i>		<i>Fortalecimiento de las cadenas de valor sostenibles de los PFM para promover la gobernanza ambiental, cultural y social de las comunidades de la cuenca del Río Putumayo - Içá en Colombia y Ecuador.</i>	
Objetivo específico 1		<i>Fortalecer capacidades productivas, organizativas y comunitarias en el manejo sostenible de los PFM</i>	
Actividad <i>(Indicado en el Anexo 1)</i>	Indicador <i>(Establecidos en el Marco de resultados)</i>	Avance <i>(Indicar avance en el indicador hasta la fecha de entrega de este reporte)</i>	Medios de verificación <i>(Listar los medios de verificación que hace entrega. Ej: Listas de asistencias, base de datos, informes, actas, memorias, fotos, etc)</i>
Realizar un diagnóstico productivo y organizativo para reducir brechas de las comunidades	Número de diagnósticos productivos y organizativos elaborados con enfoque de género y participación juvenil en comunidades priorizadas.	Avance del 50% con la elaboración de 2 diagnósticos. 1 para MELIPO 1 para ASOMUJER, ambos en Colombia.	1.1. Documento del diagnóstico validado (Informe técnico del análisis de brechas) 1.1.1. Listas de asistencia desagregadas por sexo. 1.1.2. Actas de reunión sobre PQR con la organización Melipo 1.1.3. Fotografías de las actividades
Estructurar planes de fortalecimiento organizativo y socio empresarial con liderazgo de mujeres y jóvenes	Número de planes de fortalecimiento formulados con mujeres y jóvenes	Avance de un 25% con la estructuración de los planes de fortalecimiento a partir de las brechas identificadas. Se presenta el avance por eslabón de la cadena de valor. 1 para MELIPO 1 para ASOMUJER Terminado los planes se validarán y se firmarán con las organizaciones.	1.2. Planes de fortalecimiento en construcción 1.2.1. Fotografías de construcción plan de fortalecimiento.

Acompañamiento implementación de planes organizativo y socio empresarial para las organizaciones en Putumayo	% de organizaciones que implementan acciones priorizadas en sus planes	Avance en un 15% de acciones de fortalecimiento implementadas para las dos organizaciones de Colombia que incluyen la caracterización de los productores la línea base, alistamiento para el fortalecimiento de la red de proveeduría y la legalidad de la cadena de valor en el aprovechamiento de la fauna y flora silvestre	1.3. Informes de seguimiento 1.3.1. Registros de asistencia de actividades
Implementación planes asistencia técnica y buenas prácticas en manejo, recolección y poscosecha	Número de comunidades capacitadas e implementando buenas prácticas	0% avance Estás guías están en proceso de estructuración a partir del plan de fortalecimiento	
Acompañamiento en manejo sostenible de meliponas para comunidades étnicas y campesinas	Número de comunidades acompañadas en meliponicultura sostenible	0% avance	
Dotación de equipos y herramientas para el manejo, la recolección y poscosecha de PFNM	Número de organizaciones que reciben equipos y herramientas	0% avance	
Intercambios de experiencias y aprendizajes en prácticas de aprovechamiento de la biodiversidad	Número de intercambios realizados Número de participantes (h/m)	10% avance	1.7. Agenda del intercambio del 3 al 6 de diciembre de 2025.
Objetivo principal	<i>Fortalecimiento de las cadenas de valor sostenibles de los PFNM para promover la gobernanza ambiental, cultural y social de las comunidades de la cuenca del Río Putumayo - Içá en Colombia y Ecuador.</i>		

Objetivo específico 2		Gestionar la planificación del uso y aprovechamiento de los PFM para la conectividad ecosistémica	
Actividad	Indicador	Avance	Medios de verificación
Intercambios de experiencias y aprendizajes en prácticas de aprovechamiento de biodiversidad	Nº de acuerdos de planificación concertados entre comunidades y actores locales	Avance del 50%. Dos acuerdos de trabajo firmados con las organizaciones de base de Colombia 1 con MELIPO 1 con ASOMUJER	2.1. Actas firmadas 2.1.1. Plan Pueblos Indígenas y Plan de gestión Ambiental y Social.
Definición áreas de uso y aprovechamiento de los PFM mediante planificación participativa	Nº de mapas de zonificación elaborados y validados	Avance del 50%. Levantamiento de información para la zonificación predial de las familias que hacen parte de la red de proveeduría y de la cadena de valor para las organizaciones de Colombia. MELIPO: 15 familias caracterizadas ASOMUJER: 20 familias caracterizadas. Adicionalmente se cuenta con XX mapas de zonificación	2.2. Mapa con familias georeferenciadas 2.2.1. Mapas de Zonificación 2.2.2. Listados de asistencia.
Definición participativa de los protocolos de manejo de los PFM de Aguaje, Acai, Miel con las comunidades en Colombia, al igual que los planes de manejo ambiental de las comunidades indígenas en	Nº de protocolos y planes de manejo elaborados participativamente	Avance del 15% Se realizó reunión con líder de ASOMUJER y Corpoamazonia a fin de validar la ruta de adopción de los protocolos para Inchi y Canangucha.	2.3. Listado de asistencia.

Ecuador relacionados con Camu Camu y Azai.			
Acompañamiento al monitoreo comunitario para el uso sostenible de los PFNM	Nº de protocolos comunitarios de monitoreo implementados	0% avance	
Intercambio binacional de las comunidades en usos y aprovechamiento de los PFNM	Nº de intercambios binacionales realizados Nº de participantes	0% avance	
Implementación de un vivero comunitario en Ecuador para recuperación de semillas	Nº de viveros establecidos y operando con especies nativas de PFNM	0% avance	
Objetivo principal	<i>Fortalecimiento de las cadenas de valor sostenibles de los PFNM para promover la gobernanza ambiental, cultural y social de las comunidades de la cuenca del Río Putumayo - Içá en Colombia y Ecuador.</i>		
Objetivo específico 3	<i>Fortalecer las cadenas de valor de PFNM, desde la innovación y desarrollo</i>		
Actividad <i>(Indicado en el Anexo 1)</i>	Indicador <i>(Establecidos en el Marco de resultados)</i>	Avance <i>(Indicar avance en el indicador hasta la fecha de entrega de este reporte)</i>	Medios de verificación <i>(Listar los medios de verificación que hace entrega. Ej: Listas de asistencias, base de datos, informes, actas, memorias, fotos, etc)</i>
Identificación de actores estratégicos para potenciar las cadenas de valor de PFNM	Nº de actores identificados y clasificados por eslabón y territorio	Avance del 15%. Levantamiento de información en campo con las organizaciones de base para Colombia.	3.1. Base de datos de actores en construcción
Construcción de estrategias con los actores para consolidar las cadenas de valor de PFNM	Nº de estrategias concertadas con actores clave	0% avance	

Realizar estudio de oportunidades para la innovación y calidad en PFNM	Nº de productos mejorados o innovadores diseñados con actores locales	0% avance	
Desarrollar un sistema de trazabilidad para los PFNM Cacay, Aguaje y miel	Nº de guías de trazabilidad elaboradas y validadas para productos priorizados	0% avance	
Participación en feria para visibilizar el potencial de PFNM y generar alianzas comerciales	Nº de contactos comerciales y oportunidades registradas	0% avance	
Implementar plan de marketing digital para difusión, innovaciones y mejoras de calidad de PFNM	Plan de marketing digital implementado y publicaciones activas en canales digitales	0% avance	
