

## Tercer Informe Técnico de Avances de Subproyectos

|                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la organización:</b>             | Conexión Colombia                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nombre del subproyecto:</b>                | Fortalecimiento de las cadenas de valor sostenibles de los PFNM para promover la gobernanza ambiental, cultural y social de las comunidades de la cuenca del Río Putumayo - Içá en Colombia y Ecuador. |
| <b>Lugar de intervención:</b>                 | Colombia - Ecuador                                                                                                                                                                                     |
| <b>Código del acuerdo de asociación:</b>      | # 210464 (PRIMERA MODIFICACIÓN DEL SUBACUERDO)                                                                                                                                                         |
| <b>Coordinador del Proyecto:</b>              | Carlos Vinasco Sandoval                                                                                                                                                                                |
| <b>Periodo de Reporte y fecha de entrega:</b> | Mayo - junio de 2026 (Entrega 10 de julio de 2026)                                                                                                                                                     |
| <b>Persona/ email de contacto:</b>            | c.vinasco@conexioncol.org                                                                                                                                                                              |



## Contenido

|        |                                                                                                                                                         |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Presentación .....                                                                                                                                      | 4  |
| 2.     | Contexto del periodo reportado (Mayo – Junio) .....                                                                                                     | 5  |
| 3.     | Descripción del subproyecto y marco de resultados .....                                                                                                 | 6  |
| 4.     | Avances en la implementación del subproyecto .....                                                                                                      | 10 |
| 4.1.   | Objetivo 1. Fortalecer capacidades productivas, organizativas y comunitarias en el manejo sostenible de los PFNM .....                                  | 10 |
| 4.1.1. | Indicador 3. % de organizaciones que implementan acciones priorizadas en sus planes para las organizaciones Melipo y Asomujer más Bioingredientes. .... | 10 |
| 4.1.2. | Indicador 4. Número de comunidades capacitadas e implementando buenas prácticas. ....                                                                   | 11 |
| 4.1.3. | Indicador 5. Número de comunidades acompañadas en meliponicultura sostenible .....                                                                      | 15 |
| 4.1.4. | Indicador 6. Número de organizaciones que reciben equipos y herramientas.....                                                                           | 17 |
| 4.2.   | Objetivo específico 2 Gestionar la planificación del uso y aprovechamiento de los PFNM para la conectividad ecosistémica .....                          | 19 |
| 4.2.1. | Indicador 9. N° de mapas de zonificación elaborados y validados.....                                                                                    | 19 |
| 4.2.2. | Indicador 10. N° de protocolos y planes de manejo elaborados participativamente ....                                                                    | 20 |
| 4.2.3. | Indicador 11. N° de protocolos comunitarios de monitoreo implementados.....                                                                             | 22 |
| 4.2.4. | Indicador 13. N° de viveros establecidos y operando con especies nativas de PFNM ..                                                                     | 23 |
| 4.3.   | Objetivo específico 3 Fortalecer las cadenas de valor de PFNM, desde la innovación y desarrollo .....                                                   | 24 |
| 4.3.1. | Indicador 15. N° de estrategias concertadas con actores clave .....                                                                                     | 24 |
| 4.3.2. | Indicador 16. N° de productos mejorados o innovadores diseñados con actores locales                                                                     | 25 |
| 4.3.3. | Indicador 17. N° de guías de trazabilidad elaboradas y validadas para productos priorizados. ....                                                       | 25 |
| 4.3.4. | Indicador 18. N° de contactos comerciales y oportunidades registradas .....                                                                             | 26 |
| 4.3.5. | Indicador 19. Plan de marketing digital implementado y publicaciones activas en canales digitales. ....                                                 | 26 |
| 4.4.   | Enfoque de género y biodiversidad .....                                                                                                                 | 27 |

|      |                                           |    |
|------|-------------------------------------------|----|
| 5.   | Principales aprendizajes y desafíos ..... | 28 |
| 5.1. | Principales aprendizajes.....             | 28 |
| 5.2. | Principales desafíos.....                 | 28 |

## 1. Presentación

En el presente Informe Técnico No. 3, se presenta los principales avances alcanzados durante el período comprendido entre mayo y junio de 2026, en el marco del subproyecto "Fortalecimiento de las cadenas de valor sostenibles de los Productos Forestales No Maderables (PFNM) para promover la gobernanza ambiental, cultural y social de las comunidades de la cuenca del río Putumayo-Içá en Colombia y Ecuador", implementado por Conexión Colombia en alianza con Wildlife Conservation Society (WCS).

Durante este período, se avanzó en la implementación de las acciones priorizadas en los planes de fortalecimiento para las cadenas de valor de cacay, canangucha (aguaje), miel de abejas nativas sin aguijón, asaí y camu camu, alcanzando, entre otros, los siguientes resultados:

- 10 familias más de ASOMUJER recibieron asistencia técnica y fueron caracterizadas mediante recorridos prediales, georreferenciación e inventario de 74 árboles de cacay en 191 hectáreas, llegando a una cobertura de 50 familias.
- Se desarrollaron Escuelas de Campo (ECAS) y procesos de capacitación en Colombia y Ecuador, fortaleciendo las capacidades de comunidades y organizaciones en buenas prácticas de manejo, abonos orgánicos, cosecha, poscosecha, propagación de especies nativas y aprovechamiento sostenible de los PFNM.
- Se brindó asistencia técnica a 18 unidades productivas de MELIPO DEL SUR, actualizando el inventario de 437 colmenas y fortaleciendo el manejo técnico de la meliponicultura.
- Se entregaron 32 kits para la construcción de secadores de cacay, 30 descapsuladoras y 10 desjarretadoras para fortalecer las cadenas de valor de cacay y canangucha, beneficiando directamente a 42 familias, de las cuales 69 % son mujeres.
- En Ecuador se consolidó la operación del vivero comunitario de Upiritu Kankhe, avanzó la georreferenciación de áreas de aprovechamiento de asaí y camu camu y se fortalecieron los procesos participativos para la elaboración de los Planes de Manejo Ambiental.
- Se fortalecieron alianzas estratégicas con AGROSAVIA, CORPOAMAZONIA y el SENA, orientadas a consolidar el Nodo de Bioeconomía para Putumayo, avanzar en la gestión ambiental de la meliponicultura y promover la agregación de valor y comercialización de los PFNM.

Durante el período también se avanzó en la validación de guías de manejo y trazabilidad, la implementación de inversiones productivas, el fortalecimiento organizativo y la estructuración de consultorías especializadas en innovación, comercialización y marketing digital, orientadas a consolidar la sostenibilidad de las organizaciones durante la etapa final del subproyecto.

En Colombia, parte de las actividades de campo fueron reprogramadas debido al contexto asociado a la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, priorizando la seguridad de las comunidades y del equipo técnico. En Ecuador, la implementación enfrentó desafíos logísticos derivados del incremento en los costos del combustible para la movilidad fluvial; sin embargo, mediante la articulación con la Prefectura de Sucumbíos y las comunidades participantes fue posible mantener la ejecución de las actividades prioritarias.

Finalmente, mediante la Primera Modificación del Subacuerdo, WCS y Conexión Colombia acordaron ampliar el plazo de ejecución del subproyecto hasta el 30 de noviembre de 2026 y reorientar los recursos inicialmente previstos para el intercambio binacional hacia acciones de fortalecimiento organizativo, innovación, articulación institucional y acceso a mercados, con el propósito de consolidar la sostenibilidad de las cadenas de valor y garantizar el adecuado cierre técnico, administrativo y financiero del subproyecto.

## 2. Contexto del periodo reportado (Mayo – Junio)

Durante el período comprendido entre mayo y junio de 2026, el equipo de Conexión Colombia en alianza con el FEPP se continuó avanzando en la implementación de las acciones previstas para el fortalecimiento de las cadenas de valor de cacay, aguaje (canangucha), miel de abejas nativas sin aguijón, asaí y camu camu, priorizando la consolidación de los procesos organizativos, productivos, comerciales y de articulación institucional desarrollados con las organizaciones participantes en Colombia y Ecuador.

En Colombia, la ejecución de algunas actividades de campo se vio temporalmente afectada por el contexto asociado a la primera vuelta de las elecciones presidenciales (31 de mayo de 2026) y la segunda vuelta (21 de junio de 2026). En coordinación con WCS y como medida preventiva, se decidió reprogramar las visitas técnicas a las comunidades, considerando el incremento de los riesgos asociados a la movilidad en territorio, las restricciones logísticas, la concentración de la capacidad institucional en el proceso electoral y las recomendaciones de seguridad para evitar desplazamientos no esenciales durante este período.

Durante estas semanas se priorizaron actividades de coordinación técnica, gestión administrativa, procesos de adquisición, articulación con aliados estratégicos, preparación de procesos de contratación y planificación de las actividades de cierre del subproyecto, retomando progresivamente el trabajo en territorio una vez las condiciones permitieron el ingreso seguro a las comunidades.

Adicionalmente, durante este período culminó, de común acuerdo entre las partes, el contrato del consultor responsable del componente comercial, una vez finalizaron las actividades correspondientes a la fase de diagnóstico, caracterización y formulación de los planes de fortalecimiento organizativo. Considerando que el subproyecto entró en su etapa final de implementación y que las necesidades de acompañamiento de las organizaciones evolucionaron hacia acciones más especializadas, se inició un nuevo proceso de contratación, de conformidad con los procedimientos de adquisiciones del proyecto. En este sentido, la nueva consultoría estará orientada a responder a las necesidades actuales de las organizaciones, priorizando el fortalecimiento organizativo y socioempresarial de MELIPO DEL SUR, y el fortalecimiento comercial, incremento de ventas y acceso a nuevos mercados para las cadenas de valor de cacay y aguaje, desarrolladas por ASOMUJER en alianza con Bioingredientes Amazónicos S.A.S.

Así mismo, mediante la Primera Modificación del Subacuerdo No. 210464, WCS y Conexión Colombia acordamos ampliar el plazo de ejecución del subproyecto hasta el 30 de noviembre de 2026, manteniendo el presupuesto inicialmente aprobado y ajustando el cronograma de ejecución. Como parte de esta modificación, también se reorientaron los recursos inicialmente destinados al intercambio binacional hacia acciones de acompañamiento, articulación y consolidación de alianzas estratégicas con organizaciones beneficiarias, entidades públicas, centros de investigación y aliados comerciales.

Lo anterior responde a que, durante el período reportado, persistían condiciones de seguridad y gobernanza en la zona de frontera que no permitían garantizar el desarrollo del intercambio binacional en las condiciones inicialmente previstas. En consecuencia, se prioriza fortalecer la articulación entre actores y consolidar los procesos organizativos, productivos y comerciales impulsados por el subproyecto, buscando maximizar el impacto de los recursos y garantizar un adecuado cierre técnico, administrativo y financiero.

En Ecuador, la implementación de las actividades también enfrentó desafíos logísticos asociados al incremento del costo del combustible, situación que afectó la movilidad fluvial de las comunidades y del equipo técnico hacia los territorios de intervención. Para mitigar estos efectos, FEPP gestionó, en articulación con la Prefectura de Sucumbíos y las comunidades participantes, apoyo para el suministro de combustible y el acompañamiento de promotores comunitarios, lo que permitió mantener la ejecución de actividades prioritarias, como el establecimiento del vivero comunitario, las capacitaciones en producción de material vegetal, el fortalecimiento de capacidades para el aprovechamiento sostenible de los PFNM y el avance en la construcción participativa de los planes de manejo. Asimismo, se realizaron ajustes metodológicos y de cronograma para garantizar la calidad de los productos técnicos y la continuidad de la implementación del subproyecto.

### 3. Descripción del subproyecto y marco de resultados

El subproyecto tiene como propósito contribuir a la conservación de los bosques, mejorar la conectividad ecosistémica y fortalecer los medios de vida de las comunidades indígenas y campesinas de la cuenca del río Putumayo-Içá, mediante el desarrollo de cadenas de valor sostenibles de Productos Forestales No Maderables (PFNM), promoviendo su uso planificado, aprovechamiento sostenible, transformación y acceso a mercados de mayor valor.

Para alcanzar este propósito, la intervención se estructura alrededor de tres objetivos específicos complementarios:

**Objetivo específico 1.** Fortalecer las capacidades productivas, organizativas y comunitarias para el manejo sostenible de los Productos Forestales No Maderables.

**Objetivo específico 2.** Gestionar la planificación del uso y aprovechamiento de los Productos Forestales No Maderables para contribuir a la conectividad ecosistémica y la gobernanza territorial.

**Objetivo específico 3.** Fortalecer las cadenas de valor de los Productos Forestales No Maderables mediante procesos de innovación, agregación de valor y articulación con mercados.

Durante el período comprendido entre mayo y junio de 2026, el subproyecto avanzó principalmente en la implementación de los instrumentos técnicos y organizativos formulados durante la fase anterior, consolidando acciones de fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica, articulación institucional, fortalecimiento comercial, implementación de inversiones y acompañamiento a las organizaciones participantes en Colombia y Ecuador.

Asimismo, estas acciones se desarrollaron incorporando de manera transversal la metodología de género **EmpoderA** y la metodología de biodiversidad **BIOMAS** de Conexión Colombia, promoviendo la

participación equitativa de mujeres, hombres, jóvenes y autoridades comunitarias, el reconocimiento de los saberes tradicionales y la integración de la conservación de la biodiversidad como eje del fortalecimiento de las cadenas de valor de los Productos Forestales No Maderables (PFNM). De esta manera, los avances alcanzados permitieron continuar el cumplimiento progresivo del Marco de Resultados, orientando los esfuerzos hacia la consolidación de la sostenibilidad de las cadenas de valor priorizadas y la preparación del cierre técnico del subproyecto.

De conformidad con la Primera Modificación del Subacuerdo suscrita entre WCS y Conexión Colombia, el Marco de Resultados presentado a continuación incorpora los ajustes aprobados al subproyecto. En este sentido, se elimina el indicador correspondiente a la gira de intercambio binacional, en concordancia con la reorientación de los recursos y actividades aprobada mediante la adenda.

**Tabla 2.** Marco de resultados e indicadores del subproyecto.

| Objetivo                                                                                                                   | Indicador                                                                                                   | Meta total                        | Avance                               |                                  | Total, avance (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                             |                                   | Colombia                             | Ecuador                          |                   |
| <b>Objetivo 1.</b><br>Fortalecer capacidades productivas, organizativas y comunitarias en el manejo sostenible de los PFNM | Número de diagnósticos productivos y organizativos elaborados con enfoque de género y participación juvenil | 2 diagnósticos                    | Actividad cumplida.                  | Actividad cumplida.              | 100 %             |
|                                                                                                                            | Número de planes de fortalecimiento formulados con mujeres y jóvenes                                        | 2 planes en Colombia              | Actividad cumplida.                  | N/A                              | 100 %             |
|                                                                                                                            | % de organizaciones que implementan acciones priorizadas en sus planes                                      | 100 % (2 comunidades en Colombia) | En implementación (2 organizaciones) | N/A                              | 55 %              |
|                                                                                                                            | Número de comunidades capacitadas e implementando buenas prácticas                                          | 4 comunidades                     | 2 comunidades en implementación.     | 2 comunidades en implementación. | 80 %              |

|                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                   |                                                                   |                                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                       | Número de comunidades acompañadas en meliponicultura sostenible                 | 1 comunidad                                                       | 1 comunidad acompañada en (implementación)                        | N/A                                                                  | 90 %  |
|                                                                                                                                       | Número de organizaciones que reciben equipos y herramientas                     | 2 organizaciones                                                  | 2 organizaciones, se avanzó en adquisición y entregas.            | N/A                                                                  | 60 %  |
|                                                                                                                                       | Número de intercambios realizados / participantes                               | 1 intercambio                                                     | Actividad cumplida.                                               | N/A                                                                  | 100 % |
| <b>Objetivo específico 2</b><br><br>Gestionar la planificación del uso y aprovechamiento de los PFM para la conectividad ecosistémica | Nº de acuerdos de planificación concertados entre comunidades y actores locales | 2 acuerdos firmados con comunidades (1 en Colombia, 1 en Ecuador) | Actividad cumplida.                                               | Actividad cumplida.                                                  | 100 % |
|                                                                                                                                       | Nº de mapas de zonificación elaborados y validados                              | 2 mapas de zonificación validados por comunidades                 | Actividad cumplida.                                               | Procesos de georreferenciación y recorridos territoriales en avance. | 80 %  |
|                                                                                                                                       | Nº de protocolos y planes de manejo elaborados participativamente               | 5 protocolos (mínimo 2 en Ecuador y 3 en Colombia)                | Actividad cumplida.                                               | En construcción.                                                     | 80 %  |
|                                                                                                                                       | Nº de protocolos comunitarios de monitoreo implementados                        | 3 protocolos de monitoreo aplicados por comunidades campesinas    | En implementación de instrumentos de monitoreo con 2 comunidades. | N/A                                                                  | 80 %  |
|                                                                                                                                       | Nº de viveros establecidos y operando con especies nativas de PFM               | 1 vivero comunitario establecido con mínimo 5 especies nativas    | N/A                                                               | 1 vivero comunitario establecido.                                    | 100 % |

|                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                |                                                               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>Objetivo específico 3</b><br><br>Fortalecer las cadenas de valor de PFM, desde la innovación y desarrollo | N° de actores identificados y clasificados por eslabón y territorio                 | Mínimo 30 actores mapeados (productores, acopiadores, transformadores, aliados)        | 40 actores en proceso de articulación.                                                                         | 8 actores identificados en proceso de articulación            | 86 % |
|                                                                                                              | N° de estrategias concertadas con actores clave                                     | 1 estrategia por cadena priorizada (mínimo 3 estrategias)                              | Fortalecimiento de alianzas estratégicas con actores regionales para la sostenibilidad de las cadenas de valor | Fortalecimiento de alianzas estratégicas con actores locales. | 60 % |
|                                                                                                              | N° de productos mejorados o innovadores diseñados con actores locales               | 1 producto innovador desarrollado / 3 mejoras de calidad documentadas                  | En proceso de contratación de consultoría.                                                                     | N/A                                                           | 30 % |
|                                                                                                              | N° de guías de trazabilidad elaboradas y validadas para productos priorizados       | 1 guía de trazabilidad para cacay, aguaje y miel                                       | 1 guía de trazabilidad para cacay y Aguaje construida.                                                         | N/A                                                           | 70 % |
|                                                                                                              | N° de contactos comerciales y oportunidades registradas                             | Mínimo 2 oportunidades de alianzas o contactos documentados                            | En implementación.                                                                                             | N/A                                                           | 80 % |
|                                                                                                              | Plan de marketing digital implementado y publicaciones activas en canales digitales | 1 plan de marketing ejecutado / 2 publicaciones digitales en redes, web o marketplaces | En proceso de contratación de consultoría                                                                      | N/A                                                           | 30 % |

## 4. Avances en la implementación del subproyecto

En este capítulo se presentan los avances alcanzados durante el período mayo-junio de 2026 frente a los indicadores establecidos en el Marco de Resultados del subproyecto. Considerando que varios de los productos asociados a la fase de diagnóstico y planificación alcanzaron el 100 % de cumplimiento durante el período anterior (diciembre 2025 – abril 2026), el presente informe se concentra en reportar los avances relacionados con la implementación de los planes de fortalecimiento, el desarrollo de capacidades, la ejecución de inversiones y la consolidación de las acciones desarrolladas con las organizaciones participantes en Colombia y Ecuador.

### 4.1. Objetivo 1. Fortalecer capacidades productivas, organizativas y comunitarias en el manejo sostenible de los PFNM

En esta sección se presentan únicamente los indicadores que continuaban en ejecución durante el período mayo-junio de 2026

#### 4.1.1. Indicador 3. % de organizaciones que implementan acciones priorizadas en sus planes para las organizaciones Melipo y Asomujer más Bioingredintes.

Se alcanzó un avance del 55 %, correspondiente a la formulación de los diagnósticos organizativos, productivos y comerciales, la construcción de los planes de fortalecimiento y el inicio de la implementación de las acciones priorizadas con ASOMUJER y MELIPO DEL SUR.

Imagen 1. Taller con la organización ASOMUJER y la empresa Bioingredintes SAS



Fuente: Conexión Colombia

Durante este proceso se identificaron nuevas oportunidades para fortalecer el acompañamiento a las organizaciones en la etapa final del subproyecto. En ASOMUJER, se evidenció la necesidad de orientar el acompañamiento hacia el fortalecimiento comercial de las cadenas de valor de cacay y aguaje, con énfasis en el incremento de ventas, el acceso a nuevos mercados y la consolidación de la articulación comercial con Bioingredientes Amazónicos S.A.S.

Por su parte, en MELIPO DEL SUR se identificó la necesidad de profundizar el fortalecimiento organizativo y socioempresarial para consolidar su gobernanza, fortalecer sus capacidades de gestión y mejorar la sostenibilidad de la organización.

Imagen 2. Taller con la organización Melipo del Sur



Fuente: Conexión Colombia

En respuesta a estos hallazgos, y de común acuerdo entre las partes, se dio por terminado el contrato del consultor responsable de la fase de diagnóstico y formulación de los planes de fortalecimiento, iniciando un nuevo proceso de contratación, de conformidad con los procedimientos de adquisiciones del proyecto, con el propósito de brindar un acompañamiento más especializado y alineado con las necesidades identificadas para cada organización durante la etapa final del subproyecto, para lo cual se espera que en el mes de agosto se cuente con estos profesionales.

- **Medios de Verificación**

Anexo 3. Informes de acompañamiento organizativo y socio empresarial

- Anexo 3.1 Fortalecimiento Asomujer
- Anexo 3.2 Fortalecimiento Melipo
- Anexo 3.3 Agenda

#### 4.1.2. Indicador 4. Número de comunidades capacitadas e implementando buenas prácticas.

Durante el período reportado, el indicador alcanzó un **80 %** de avance, como resultado de la implementación de procesos de asistencia técnica, Escuelas de Campo (ECAS) y jornadas de capacitación dirigidas a las organizaciones y comunidades participantes en Colombia y Ecuador. Estas acciones fortalecieron las capacidades para el manejo sostenible de los Productos Forestales No Maderables (PFNM), promoviendo la adopción de buenas prácticas de producción, cosecha, poscosecha y transformación, e incorporando de manera transversal los enfoques de conservación de la biodiversidad, equidad de género y el cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del subproyecto.

## En Ecuador:

Se continuó fortaleciendo las capacidades de las comunidades indígenas Upiritu Kankhe (Cofán) y Tacé (Kichwa) mediante un proceso de formación y asistencia técnica orientado a la adopción de buenas prácticas para el manejo sostenible de las cadenas de valor de asaí y camu camu. En este período se desarrollaron tres talleres de capacitación sobre elaboración de abonos orgánicos (Biol y Bocashi), reproducción de material vegetal en el vivero comunitario y técnicas seguras de trepa para el aprovechamiento sostenible de palmas, complementados con diez visitas de asistencia técnica y mingas comunitarias para el establecimiento de parcelas demostrativas, recolección de semillas nativas y fortalecimiento del vivero comunitario.

Imagen 3. Taller en escalar para cosecha de PFNM



Fuente: FEPP Ecuador

Las metodologías implementadas privilegiaron el aprendizaje práctico ("aprender haciendo"), articulando el conocimiento técnico con los saberes ancestrales de las comunidades. En las jornadas participaron líderes comunitarios, jóvenes de la guardia indígena, docentes y sabedores tradicionales, quienes aportaron a la identificación de especies nativas, la recuperación de sus nombres en lengua Cofán (A'ingae) y el reconocimiento de sus usos tradicionales, fortaleciendo la apropiación comunitaria del proceso y la transmisión intergeneracional del conocimiento. Este enfoque contribuye al cumplimiento del Plan de Pueblos Indígenas (PPI) y de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS), promoviendo una participación culturalmente pertinente e incluyente.

Imagen 4. Taller en escalar para cosecha de PFNM



Fuente: FEPP Ecuador

Como resultado, las comunidades comenzaron a implementar buenas prácticas orientadas a reducir los impactos sobre el bosque, entre ellas el uso de técnicas seguras de trepa que permiten recolectar frutos sin derribar palmas y árboles, la producción de abonos orgánicos para disminuir el uso de insumos externos, el establecimiento de parcelas demostrativas para el monitoreo de especies priorizadas y el fortalecimiento del vivero comunitario con especies forestales y medicinales nativas recolectadas por las propias comunidades. La capacitación en técnicas de acceso al dosel constituye un avance relevante para la conservación de la biodiversidad, al ofrecer una alternativa que disminuye la tala durante el aprovechamiento de los PFNM y fortalece el manejo sostenible de especies como el asaí y el aguaje.

Imagen 5. Prácticas de escalamiento de palmas de PFNM



Fuente: FEPP Ecuador

En Colombia:

- Asistencia técnica y caracterización de las unidades productivas de Asomujer

Se continuó con el proceso de asistencia técnica y caracterización de las familias vinculadas a las cadenas priorizadas por el subproyecto en Colombia, con énfasis inicial en la cadena de cacay liderada por ASOMUJER en el municipio de Villagarzón. Se realizaron 10 visitas de asistencia técnica a igual número de familias productoras, ubicadas en cinco veredas (La Pradera, La Betulia, Villa Lucero, Miravalle y Santa Teresa), mediante la aplicación de fichas de caracterización socioproductiva, organizacional y comercial, recorridos prediales, georreferenciación e inventario de árboles de cacay. Como resultado, se caracterizaron 10 predios con una extensión total de 191 hectáreas, identificando 74 árboles de cacay y estableciendo la línea base para orientar el acompañamiento técnico durante la ejecución del subproyecto.

Las visitas permitieron identificar las principales brechas técnicas relacionadas con la producción y el aprovechamiento sostenible del cacay, entre ellas la ausencia de fertilización orgánica, la inexistencia de registros productivos, la falta de protocolos para la recolección y postcosecha, limitaciones en el almacenamiento y deficiencias en el manejo agronómico de los árboles. Paralelamente, se formularon recomendaciones específicas para cada familia orientadas al manejo de la nutrición vegetal, poda sanitaria, regulación de sombra, reducción de pérdidas en cosecha y fortalecimiento de la trazabilidad. Asimismo, se evidenció un alto potencial organizativo, dado que el 80 % de las personas caracterizadas

son mujeres y el 90 % comercializa su producción a través de ASOMUJER, lo que constituye una base importante para fortalecer procesos de comercialización colectiva y adopción de buenas prácticas.

Imagen 6. Acompañamiento técnico a las familias de ASOMUJER



Fuente: Conexión Colombia

- Desarrollo de Escuelas de Campo - ECAS

Se fortaleció las capacidades técnicas de las familias de ASOMUJER mediante el desarrollo de Escuelas de Campo para Agricultores (ECAS), orientadas a responder a las principales brechas identificadas durante las asistencias técnicas y la caracterización. Bajo una metodología de “aprender haciendo”, las jornadas combinaron demostraciones prácticas, intercambio de experiencias entre productores y productoras y el acompañamiento de expertos locales para promover la adopción de buenas prácticas en las cadenas de valor de cacay y canangucha, incorporando de manera transversal los enfoques de conservación de la biodiversidad, equidad de género y fortalecimiento organizativo.

En la cadena de valor del cacay, se desarrolló una ECA sobre injertación y fortalecimiento productivo, donde las familias fortalecieron sus capacidades en selección de material vegetal, técnicas de injertación, manejo agronómico y monitoreo del cultivo. Paralelamente, se realizó una jornada de nivelación de conocimientos sobre las ECAS desarrolladas durante el proyecto, consolidando aprendizajes relacionados con viveros, fertilización, cosecha, poscosecha, trazabilidad y uso de tecnologías apropiadas. Como parte de este proceso se entregaron 30 descapsuladoras a las familias recolectoras, fortaleciendo la calidad de la almendra, la eficiencia del proceso de poscosecha y la construcción participativa del calendario anual de manejo del cultivo, como base para el sistema de trazabilidad impulsado por ASOMUJER en articulación con Bioingredientes Amazónicos S.A.S.. Estas actividades promovieron el liderazgo de las mujeres asociadas en el monitoreo, la trazabilidad y el manejo del cultivo, al tiempo que fortalecieron prácticas productivas compatibles con la conservación de los bosques amazónicos.

En la cadena de valor de la canangucha (aguaje) se desarrolló una ECA con la participación de 10 familias recolectoras, orientada al fortalecimiento de capacidades para el manejo sostenible de la especie, las técnicas de cosecha, despulpado y manejo poscosecha. El espacio promovió el intercambio entre conocimientos tradicionales y técnicos, reconociendo el papel de las mujeres en el despulpado y transformación del fruto, y de los hombres y jóvenes en las labores de cosecha y transporte, fortaleciendo la participación complementaria de los integrantes de las familias en la cadena de valor. Asimismo, se

compartieron experiencias sobre el aprovechamiento integral de la canangucha y el uso de sus subproductos, contribuyendo a reducir desperdicios, generar nuevas oportunidades de aprovechamiento y promover la conservación de esta especie estratégica para los ecosistemas de humedales amazónicos. Como complemento, el subproyecto entregó desjarretadoras a las familias participantes para mejorar la eficiencia de la cosecha, reducir el esfuerzo físico de los recolectores y disminuir las pérdidas de fruto durante el aprovechamiento.

Imagen 7. Desarrollo de ECAS con familias de ASOMUJER



Fuente: Conexión Colombia

En conjunto, las ECAS fortalecieron capacidades técnicas, organizativas y comunitarias, promoviendo el intercambio de conocimientos entre productores, la participación activa de mujeres y jóvenes, la valoración de los saberes locales y la adopción de buenas prácticas que contribuyen al manejo sostenible de los Productos Forestales No Maderables, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de cadenas de valor más inclusivas, resilientes y sostenibles.

#### Medios de Verificación:

#### Anexo 4. Implementación de planes de Asistencia Técnica PFNM

- Anexo 4.1 Fortalecimiento Ecuador Mayo - junio
- Anexo 4.2 Fortalecimiento Colombia Mayo - junio

#### 4.1.3. Indicador 5. Número de comunidades acompañadas en meliponicultura sostenible

Durante el período reportado se continuó el acompañamiento técnico a las comunidades vinculadas a MELIPO DEL SUR en los municipios de Puerto Asís y Puerto Caicedo, alcanzando un avance del **90 %** en este indicador. Se realizaron visitas de asistencia técnica a 18 unidades productivas de meliponicultura, orientadas a fortalecer las capacidades de las familias en el manejo sostenible de las abejas nativas sin aguijón, promoviendo la implementación de buenas prácticas productivas y la conservación de los servicios ecosistémicos asociados a la polinización.

Las jornadas de acompañamiento incluyeron la evaluación sanitaria y productiva de las colonias, el seguimiento al estado de los meliponarios, la preparación de colonias para producción de miel y multiplicación de nuevos núcleos, así como recomendaciones para el manejo durante la temporada de lluvias, enfocadas en el control de humedad, la prevención del ataque de hormigas y el uso adecuado de

alimentación suplementaria únicamente en colonias vulnerables. Estas acciones permitieron fortalecer la adopción de buenas prácticas y mejorar la planificación del manejo de las colmenas según su propósito productivo.

Imagen 8. Acompañamiento técnico con familias de MELIPO DEL SUR



Fuente: Conexión Colombia

Como resultado del proceso de seguimiento se actualizó el inventario de la organización, registrando 437 colmenas, conformadas principalmente por 358 colonias de *Melipona eburnea* y 79 de *Tetragonisca angustula*. En términos generales, las colonias presentaron condiciones sanitarias favorables y un adecuado manejo técnico, evidenciando la apropiación progresiva de las prácticas promovidas por el subproyecto. Aunque las fuertes precipitaciones registradas durante el período ocasionaron la pérdida aproximada de 17 colonias por ataque de hormigas, el acompañamiento permitió implementar medidas preventivas y correctivas para fortalecer la resiliencia de los meliponarios y preparar las colonias para la siguiente temporada de floración.

Desde el enfoque de biodiversidad, el acompañamiento reforzó la importancia de conservar y establecer especies melíferas y vegetación nativa que garantizan alimento para las abejas y fortalecen los servicios de polinización en los ecosistemas amazónicos. Asimismo, las familias reafirmaron su compromiso con la conservación de corredores de vegetación, el mantenimiento de sistemas agroecológicos libres de agroquímicos y el manejo sostenible del paisaje. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del subproyecto, promoviendo medios de vida sostenibles y la conservación de la biodiversidad amazónica.

Así mismo, se continuó fortaleciendo la articulación con el SENA, mediante un proceso de formación dirigido a las familias de MELIPO DEL SUR para la elaboración de productos con valor agregado a partir de la miel de abejas nativas sin aguijón y otros ingredientes amazónicos. Como resultado, los participantes elaboraron productos como jabones, bálsamos, labiales y barras energéticas, los cuales comenzaron a ser promocionados y comercializados en ferias locales realizadas en el municipio de Puerto Asís, contribuyendo a la diversificación de ingresos y al fortalecimiento de la cadena de valor de la meliponicultura.

Imagen 9. Productos elaborados por las familias de MELIPO del SUR



Fuente: Conexión Colombia

## Medios de Verificación:

### Anexo 5. Acompañamiento en manejo meliponas


#### 5.1 Acompañamiento Meliponicultura Mayo - junio (informe de acompañamiento, soportes)

##### 4.1.4. Indicador 6. Número de organizaciones que reciben equipos y herramientas

En este indicador se alcanzó un 60 % de avance, correspondiente a la entrega de equipos, herramientas e insumos a la organización ASOMUJER, como parte de la implementación de las inversiones priorizadas para fortalecer las cadenas de valor de cacay y canangucha (aguaje). Mediante las inversiones se dieron continuidad a los procesos de planificación, adquisición y contratación desarrollados durante el período anterior, orientándose a mejorar las actividades de cosecha, poscosecha y transformación de los Productos Forestales No Maderables (PFNM).

Como resultado, el subproyecto entregó 32 kits de materiales para la construcción de secadores de cacay, 30 descapsuladoras de acero inoxidable para el procesamiento de almendra y 10 desjarretadoras telescópicas para la cosecha de canangucha, beneficiando de manera directa a 42 familias, de las cuales el 69 % corresponden a mujeres y el 31 % a hombres, fortaleciendo el liderazgo de las mujeres en las actividades de producción y transformación de los PFNM. Asimismo, al cierre del período se registró un avance del 65 % en la construcción de los secadores, evidenciando el inicio de la implementación de la infraestructura de poscosecha en las unidades productivas.

Imagen 10: Entrega de elementos y secadores construidos para procesos de cosecha y poscosecha de PFNM

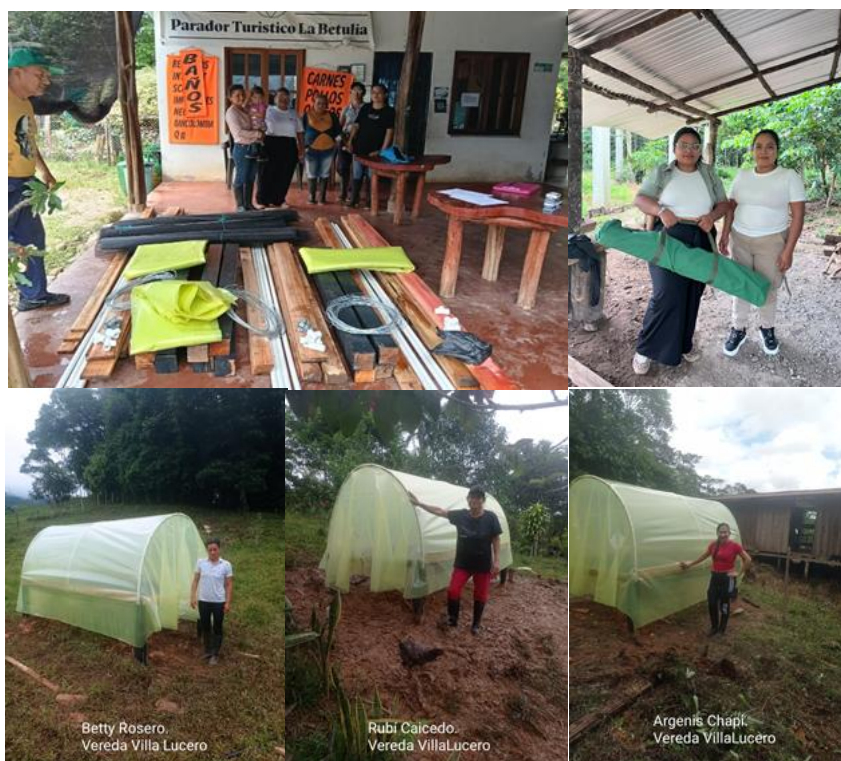

Fuente: Conexión Colombia

Las herramientas entregadas permitirán mejorar la eficiencia de los procesos productivos, reducir pérdidas durante la cosecha y la poscosecha, disminuir el esfuerzo físico de las familias recolectoras y fortalecer la calidad de la materia prima destinada a los procesos de transformación y comercialización. Particularmente, las desjarretadoras contribuyen a un aprovechamiento más seguro y sostenible de la canangucha, al facilitar la cosecha de los racimos sin afectar las palmas, mientras que los secadores y descapsuladoras mejoran las condiciones de procesamiento del cacay, reduciendo pérdidas asociadas a la humedad y al descapsulado manual.

De manera complementaria, durante las jornadas de entrega se desarrollaron procesos de capacitación para el uso seguro, mantenimiento y operación de los equipos, en cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del subproyecto. Estas capacitaciones fortalecieron las capacidades de las familias beneficiarias para el manejo responsable de las herramientas, promoviendo condiciones de trabajo más seguras, la prevención de riesgos y el uso sostenible de los activos entregados. Asimismo, el proyecto suministró materiales para fortalecer un vivero comunitario de propagación de material vegetal de cacay, contribuyendo a la disponibilidad futura de plántulas y a la sostenibilidad de esta cadena de valor.

Para el caso de MELIPO DEL SUR, durante el período reportado se avanzó en el proceso de adquisición de los equipos, materiales e insumos priorizados para fortalecer la cadena de valor de la meliponicultura. En este sentido, se publicó la Solicitud de Cotización Simplificada para el suministro de equipos destinados a fortalecer los procesos de cosecha, poscosecha, extracción, manejo, almacenamiento y conservación

de la miel de abejas nativas sin aguijón producida por las familias de la organización. El proceso de recepción de cotizaciones se encuentra abierto hasta el 9 de julio de 2026, una vez surtido este procedimiento se adelantará la evaluación, adjudicación y posterior entrega de los equipos a la organización, conforme a los procedimientos de adquisiciones del proyecto.

- **Medios de Verificación**

## **Anexo 6. Dotación de equipos y herramientas**

- 6.1 Entregas Mayo - Junio (actas de entrega, Informe de entregas)

### **4.2. Objetivo específico 2 Gestionar la planificación del uso y aprovechamiento de los PFNM para la conectividad ecosistémica**

#### **4.2.1. Indicador 9. N° de mapas de zonificación elaborados y validados**

Durante el período reportado, el indicador alcanzó un avance general del **80 %** entre Colombia y Ecuador, como resultado de la consolidación de los procesos de caracterización, georreferenciación y levantamiento de información de las áreas de uso y aprovechamiento de los Productos Forestales No Maderables (PFNM). En Colombia se avanza en completar la información requerida para las cadenas priorizadas, mientras que en Ecuador se continuó con el inventario forestal y la georreferenciación de las comunidades indígenas Upiritu Kankhe y Tacé, información que servirá de base para la elaboración y validación de los mapas de zonificación.

En Ecuador el proceso se ha concentrado en la identificación, caracterización y georreferenciación de las áreas de aprovechamiento de asái, mediante el registro de individuos, toma de coordenadas geográficas, inventario forestal y recopilación de información biofísica y comunitaria. Al cierre del período, el levantamiento de información registró un avance significativo en la comunidad de Upiritu Kankhe y de Tacé, continuando las actividades de campo para consolidar la base de datos geográfica que servirá de soporte para la elaboración de la cartografía de zonificación, el análisis espacial y la formulación de los Planes de Manejo Ambiental de las especies priorizadas.

El proceso se ha desarrollado mediante una metodología participativa, involucrando activamente a autoridades comunitarias, líderes, mujeres, jóvenes y sabedores locales, quienes han aportado información sobre las áreas tradicionales de recolección, la distribución de las especies, los usos ancestrales del territorio y los criterios comunitarios para el aprovechamiento sostenible de los PFNM. Este ejercicio fortalece la gobernanza territorial, facilita la planificación comunitaria del uso de los recursos naturales y promueve la articulación entre el conocimiento técnico y los saberes tradicionales.

Imagen 11. Georeferenciación de especies con las comunidades



Fuente: equipo FEPP

De manera complementaria, el subproyecto inició la contratación de la consultoría especializada para el desarrollo de los Planes de Manejo Ambiental y del Sistema de Información Geográfica (SIG), cuyos resultados permitirán integrar la información biofísica, social y espacial generada durante el proceso de georeferenciación, consolidando los mapas de zonificación y fortaleciendo la planificación territorial de las cadenas de valor de asaí y camu camu. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) y del Plan para Pueblos Indígenas (PPI), al promover procesos participativos, respetar los sistemas de gobernanza de las comunidades y fortalecer la conservación de la biodiversidad amazónica.

Medios de Verificación:

### Anexo 9. Mapas de zonificación

➤ Anexo 9.1 Georeferenciación Mayo- junio.

#### 4.2.2. Indicador 10. N° de protocolos y planes de manejo elaborados participativamente

Se alcanzó un **80 %** de avance. En Colombia se consolidó la implementación de las tres guías de manejo sostenible para las cadenas de valor de cacay, canangucha y meliponicultura, las cuales continúan orientando los procesos de asistencia técnica, las Escuelas de Campo y la adopción de buenas prácticas por parte de las organizaciones ASOMUJER y MELIPO DEL SUR. En ese sentido, las herramientas, construidas participativamente con productores, lideresas y equipos técnicos, fortalecen el manejo sostenible de los PFNM, la trazabilidad, la conservación de la biodiversidad y el cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos para el subproyecto.

Imagen 12. ECA en apropiación de las guías y protocolos construidos con ASOMUJER.



Fuente: Conexión Colombia

En Ecuador, durante el período reportado se avanzó en la fase preparatoria para la construcción participativa de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y del Manual de Buenas Prácticas de Uso y Aprovechamiento para las cadenas de valor de asaí y camu camu. Como parte de este proceso se realizaron tres recorridos adicionales de campo para el levantamiento de información e identificación de áreas de aprovechamiento, complementando los recorridos efectuados durante el período anterior. Asimismo, se contrató el consultor ambiental responsable de liderar la formulación de estos instrumentos y se aprobó el Plan de Trabajo, la guía metodológica y el cronograma de reuniones y talleres participativos que orientarán su construcción con las comunidades durante los meses de julio y agosto de 2026.

Imagen 13. Recorridos con las comunidades



Fuente: equipo FEPP

El proceso ha permitido identificar aspectos técnicos, ambientales y culturales que requieren un abordaje diferenciado para cada territorio. En Upiritu Kankhe, el Plan de Manejo deberá construirse de manera concertada debido a que la comunidad comparte el territorio ancestral Kofán-Dureno y no cuenta con

una delimitación interna formal de las áreas de aprovechamiento. En Tacé, el proceso deberá integrar el territorio comunitario con los predios de las familias beneficiarias ubicadas en diferentes comunidades ribereñas del río Putumayo. Estos análisis han permitido definir como temas prioritarios la producción agroecológica, la reducción de la tala de árboles mediante técnicas seguras de trepa, la cosecha equilibrada para conservar la biodiversidad y la construcción participativa de criterios de manejo sostenible que serán incorporados tanto en los Planes de Manejo Ambiental como en el Manual de Buenas Prácticas. Con ello se fortalecen la gobernanza territorial, la participación comunitaria y el cumplimiento del Plan para Pueblos Indígenas (PPI) y de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del subproyecto.

### Medios de verificación:

#### Anexo 10. Planes y protocolos de manejo

- 10.1 Implementación de planes y protocolos Mayo - junio (soporte de talleres, plan de manejo y guía metodológica para implementación en Ecuador)

#### 4.2.3. Indicador 11. N° de protocolos comunitarios de monitoreo implementados

Se cuenta con un **80 %** de avance, como resultado de la implementación progresiva de mecanismos comunitarios de monitoreo en las cadenas de valor priorizadas en Colombia y Ecuador. Estos procesos han permitido fortalecer la generación de información para el seguimiento del estado de las especies, las áreas de aprovechamiento y las prácticas de manejo sostenible implementadas por las comunidades.

##### Colombia

En las organizaciones ASOMUJER y MELIPO DEL SUR se continuó aplicando instrumentos de monitoreo durante las visitas de asistencia técnica, mediante el registro de información sobre las unidades productivas, inventario de árboles y colmenas, estado sanitario, producción, prácticas de cosecha y poscosecha, así como el seguimiento a la implementación de las recomendaciones técnicas formuladas durante el acompañamiento. Esta información constituye la base para fortalecer la trazabilidad, el seguimiento a las buenas prácticas y la toma de decisiones por parte de las organizaciones.

##### Ecuador

En las comunidades Upiritu Kankhe y Tacé, el proceso de georreferenciación e inventario forestal se complementa con el levantamiento participativo de información sobre las áreas de uso y aprovechamiento de asái y camu camu, incorporando registros de ubicación, abundancia de individuos, estado de las especies y características de los sitios de aprovechamiento. Estos ejercicios constituyen la base para implementar el sistema comunitario de monitoreo que acompañará los Planes de Manejo Ambiental y permitirá realizar seguimiento a la conservación de las especies, las prácticas de aprovechamiento sostenible y la planificación territorial.

De manera transversal, el monitoreo se desarrolló con la participación de líderes comunitarios, mujeres, jóvenes y sabedores locales, fortaleciendo la apropiación comunitaria de la información y articulando el conocimiento tradicional con herramientas técnicas para la gestión sostenible de los Productos

Forestales No Maderables. Estos procesos contribuyen al cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) y fortalecen la gobernanza sobre los recursos naturales en los territorios de intervención.

## Anexo 11. Protocolos comunitarios de monitoreo

### ➤ Anexo 11.1 Monitoreo mayo - junio

#### 4.2.4. Indicador 13. N° de viveros establecidos y operando con especies nativas de PFNM

Se consolidó el establecimiento y puesta en operación del vivero comunitario de Upiritu Kankhe, alcanzando el **100 %** de avance del indicador. El vivero fue construido con una estructura metálica y materiales resistentes a las condiciones climáticas de la Amazonía, garantizando una mayor durabilidad y sostenibilidad para la producción de material vegetal de especies nativas priorizadas por el subproyecto.

Imagen 14. Vivero comunitario de Upiritu Kankhe



Fuente: FEPP Ecuador

Como parte de su implementación, se realizaron mingas comunitarias para la adecuación del área, instalación de polisombra, construcción de camas de germinación, preparación de sustratos y organización de los espacios de producción. Asimismo, se efectuó la recolección comunitaria de semillas de asaí, camu camu y otras especies forestales, frutales, medicinales y de uso artesanal, las cuales fueron

identificadas y señalizadas en español y en lengua A'ingae, fortaleciendo el reconocimiento y la valoración del conocimiento ancestral.

El vivero inició la producción de las primeras plántulas de asaí y camu camu y constituye un espacio permanente para el fortalecimiento de capacidades comunitarias mediante procesos de formación en reproducción de especies nativas, elaboración de abonos orgánicos y restauración ecológica. Su funcionamiento contribuirá al suministro de material vegetal para las parcelas demostrativas, las acciones de recuperación de áreas priorizadas y el fortalecimiento de las cadenas de valor de los Productos Forestales No Maderables en ambas comunidades.

El proceso fue desarrollado mediante una metodología participativa, con la participación activa de mujeres, jóvenes, líderes y autoridades comunitarias, promoviendo el intercambio de conocimientos entre saberes ancestrales y conocimientos técnicos. De esta manera, el vivero se consolida como una herramienta para fortalecer la gobernanza comunitaria, la conservación de la biodiversidad amazónica y el cumplimiento de los principios establecidos en el Plan para Pueblos Indígenas (PPI) y los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del subproyecto.

## Anexo 12. Medios de Verificación

- 12.1 Soportes implementación de vivero Mayo - junio

### 4.3. Objetivo específico 3 Fortalecer las cadenas de valor de PFM, desde la innovación y desarrollo

#### 4.3.1. Indicador 15. N° de estrategias concertadas con actores clave

Se presenta un avance del 60%. Durante el período reportado se continuó fortaleciendo la articulación con actores estratégicos del orden regional para consolidar la sostenibilidad de las cadenas de valor priorizadas y ampliar las oportunidades de cooperación técnica, investigación, innovación y acceso a mercados.

En este contexto, se avanzó en la articulación con AGROSAVIA, entidad que manifestó su interés en vincular las experiencias desarrolladas por el subproyecto a la consolidación del Nodo de Bioeconomía para Putumayo, como parte de la estrategia que actualmente lidera para el fortalecimiento de la bioeconomía en la Amazonia colombiana. Esta articulación permitirá identificar oportunidades de cooperación en investigación, innovación, fortalecimiento de capacidades y desarrollo de iniciativas relacionadas con los Productos Forestales No Maderables (PFNM), integrando las cadenas de valor de cacay, aguaje y meliponicultura dentro de una agenda regional de bioeconomía.

De igual manera, se fortaleció la articulación con CORPOAMAZONIA para acompañar a MELIPO DEL SUR en la gestión del trámite de la Fase Ambiental Experimental para la meliponicultura. Como parte de este proceso se desarrolló una reunión técnica con funcionarios de la autoridad ambiental para revisar la ruta de radicación del permiso mediante la plataforma VITAL, aclarar los requisitos técnicos, ambientales y administrativos del trámite y definir la hoja de ruta para la recopilación de los soportes requeridos. Como

resultado, la organización recibió el instructivo para el uso de la plataforma, el formato para la formulación del presupuesto del proyecto y el acompañamiento técnico de la autoridad ambiental para avanzar en la estructuración de la solicitud.

Imagen 15. Reunión con Corpoamazonia y Melipo



Fuente: Conexión Colombia

Con estas articulaciones se fortalece la gobernanza de las cadenas de valor priorizadas, facilitan el acceso de las organizaciones a servicios de investigación, innovación y gestión ambiental, y contribuyen a la sostenibilidad del subproyecto mediante la construcción de alianzas estratégicas con entidades públicas y actores del Sistema Nacional Ambiental, incorporando de manera transversal criterios de conservación de la biodiversidad y fortalecimiento institucional.

#### Anexo 14. Medios de Verificación

- 14.14 Soportes de reuniones con Agrosavia y Corpoamazonia, Mayo – junio.

##### 4.3.2. Indicador 16. N° de productos mejorados o innovadores diseñados con actores locales

Estado de avance: **30 %**. Durante el período reportado se estructuraron los Términos de Referencia para la contratación de una consultoría especializada en innovación, orientada al diseño y fortalecimiento de productos con valor agregado derivados de las cadenas de cacay, canangucha (aguaje) y miel de abejas nativas. La consultoría buscará fortalecer los ingredientes amazónicos desarrollados por ASOMUJER en alianza con Bioingredientes Amazónicos S.A.S., mediante la validación de atributos funcionales, análisis especializados, procesos de maquila y producción piloto de bioproductos cosméticos, así como impulsar el desarrollo y validación de productos derivados de la miel de abejas nativas con MELIPO DEL SUR, incorporando procesos de innovación, fichas técnicas, narrativas de valor y estrategias de posicionamiento comercial. Como resultado, se espera consolidar un portafolio de innovación y una hoja de ruta para el escalamiento productivo, tecnológico y comercial de estos productos, fortaleciendo la bioeconomía amazónica y el acceso a mercados de mayor valor.

##### 4.3.3. Indicador 17. N° de guías de trazabilidad elaboradas y validadas para productos priorizados.

Se alcanzó un avance del **70 %** en el proceso de validación de las guías de trazabilidad para las cadenas de valor priorizadas. Durante el período reportado, y a través de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAS), se desarrolló un proceso participativo de revisión y ajuste de las guías de trazabilidad para las cadenas de cacay y canangucha (aguaje) con ASOMUJER, permitiendo validar los procedimientos de registro, manejo, cosecha, poscosecha y trazabilidad de la materia prima de acuerdo con las condiciones reales de las familias productoras y los requerimientos de la articulación comercial con Bioingredientes Amazónicos S.A.S. Asimismo, durante el mes de julio se tiene prevista la validación participativa de la guía de trazabilidad para la cadena de miel de abejas nativas sin aguijón con MELIPO DEL SUR, con lo cual se espera consolidar este producto para las tres cadenas priorizadas del subproyecto.

#### Medios de verificación:

- Anexo 4. Implementación de planes de Asistencia Técnica PFNM
- Anexo 4.2 Fortalecimiento Colombia Mayo - Junio
- Anexo 5. Acompañamiento en manejo meliponas
- Anexo 5.1 Acompañamiento Meliponicultura Mayo - junio

#### 4.3.4. Indicador 18. N° de contactos comerciales y oportunidades registradas

Si bien se avanzó con las ferias previstas, durante este periodo se revisó y replanteó la estrategia de fortalecimiento comercial del subproyecto a partir de los resultados de los diagnósticos organizativos, productivos y comerciales realizados con las organizaciones participantes. Como resultado, se identificó la necesidad de diferenciar el acompañamiento según las prioridades de cada organización, orientando a ASOMUJER, en alianza con Bioingredientes Amazónicos S.A.S., hacia la consolidación de contactos comerciales, el incremento de ventas y el acceso a nuevos mercados para las cadenas de valor de cacay y canangucha. Por su parte, con MELIPO DEL SUR se prioriza el fortalecimiento organizativo y socioempresarial como condición para consolidar futuras oportunidades comerciales. En este contexto, se avanza en ajustar los Términos de Referencia y se da inicio un nuevo proceso de contratación de consultorías, con el propósito de responder de manera más efectiva a las necesidades identificadas y potenciar la generación de oportunidades comerciales durante la etapa final del subproyecto.

#### 4.3.5. Indicador 19. Plan de marketing digital implementado y publicaciones activas en canales digitales.

Se presenta un avance acumulado del **30 %, se avanzó** en la estructuración del proceso para la implementación del plan de marketing digital, mediante la elaboración del estudio de mercado y de los Términos de Referencia para la contratación de la consultoría especializada. Conforme a los procedimientos de adquisiciones del proyecto, la documentación fue revisada por el equipo de adquisiciones de Wildlife Conservation Society (WCS), el cual emitió las recomendaciones técnicas y administrativas para fortalecer el proceso de contratación. Una vez incorporadas dichas observaciones, se dio continuidad al proceso con la publicación de la convocatoria durante el mes de julio de 2026, la cual busca contratar una consultoría orientada al diseño e implementación del plan de marketing digital, el fortalecimiento de la comunicación estratégica y el posicionamiento comercial de las cadenas de valor de cacay, canangucha (aguaje) y miel de abejas nativas sin aguijón, contribuyendo a mejorar su visibilidad y acceso a mercados diferenciados.

#### 4.4. Enfoque de género y biodiversidad

Durante el período mayo-junio de 2026, el subproyecto continuó incorporando de manera transversal los enfoques de equidad de género, conservación de la biodiversidad y cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) en las acciones implementadas en Colombia y Ecuador. Las actividades de asistencia técnica, Escuelas de Campo (ECAS), procesos de georreferenciación, implementación de viveros, monitoreo comunitario y fortalecimiento organizativo promovieron una participación activa e incluyente de mujeres, hombres, jóvenes, autoridades comunitarias y sabedores tradicionales, fortaleciendo las capacidades locales para el manejo sostenible de los Productos Forestales No Maderables (PFNM).

En materia de género, se fortaleció el liderazgo de las mujeres en las cadenas de valor de cacay, canangucha y meliponicultura, promoviendo su participación en procesos de formación, trazabilidad, transformación, comercialización y toma de decisiones organizativas. De manera complementaria, el subproyecto impulsó el desarrollo de capacidades para la generación de productos con valor agregado derivados de la miel de abejas nativas, fortaleciendo alternativas de emprendimiento e ingresos para las familias participantes.

Desde el enfoque de biodiversidad, las acciones priorizaron la adopción de buenas prácticas de manejo que contribuyen a la conservación de los ecosistemas amazónicos, entre ellas el uso de técnicas seguras de trepa para evitar la tala de palmas durante la cosecha, el fortalecimiento de viveros con especies nativas, la producción de abonos orgánicos, el establecimiento de parcelas demostrativas, el monitoreo participativo de las áreas de aprovechamiento y el fortalecimiento de la meliponicultura como estrategia para conservar los servicios ecosistémicos asociados a la polinización. Estas acciones fortalecen la conectividad ecosistémica y promueven el aprovechamiento sostenible de los PFNM.

#### 4.5. Implementación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) y mecanismo de quejas y reclamos

En relación con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS), el subproyecto continuó implementando metodologías participativas acordes con el Plan para Pueblos Indígenas (PPI), integrando los conocimientos tradicionales y los sistemas propios de gobernanza de las comunidades indígenas de Ecuador, así como fortaleciendo las capacidades para el uso seguro de equipos, la prevención de riesgos y la gestión ambiental de las inversiones realizadas.

## 5. Principales aprendizajes y desafíos

### 5.1. Principales aprendizajes

- La implementación de las asistencias técnicas y las Escuelas de Campo confirmó que las metodologías de "aprender haciendo" facilitan la apropiación de buenas prácticas productivas y fortalecen el intercambio entre conocimientos técnicos y saberes tradicionales.
- Los diagnósticos organizativos y comerciales permitieron identificar la necesidad de diferenciar el acompañamiento de acuerdo con la realidad de cada organización, orientando a ASOMUJER hacia el fortalecimiento comercial y el acceso a mercados, y a MELIPO DEL SUR hacia el fortalecimiento organizativo y socioempresarial.
- La articulación con entidades como AGROSAVIA, CORPOAMAZONIA, SENA y otros aliados regionales fortalece las posibilidades de sostenibilidad del subproyecto, ampliando oportunidades de investigación, innovación, formalización y acceso a mercados.
- La participación activa de mujeres, jóvenes, autoridades comunitarias y sabedores tradicionales fortaleció la apropiación comunitaria de los procesos, favoreciendo la continuidad de las acciones más allá de la ejecución del subproyecto.

### 5.2. Principales desafíos

- Consolidar durante la etapa final del subproyecto la implementación de las estrategias comerciales y de innovación, garantizando que las nuevas consultorías respondan de manera efectiva a las necesidades específicas de cada organización.
- Finalizar los procesos participativos de construcción de los Planes de Manejo Ambiental, la cartografía de zonificación y los sistemas comunitarios de monitoreo en Ecuador, asegurando su apropiación por parte de las comunidades.
- Culminar los procesos de adquisición y entrega de equipos para MELIPO DEL SUR, así como la implementación del plan de marketing digital y las estrategias de comunicación para fortalecer el posicionamiento de las cadenas de valor.
- Consolidar las alianzas estratégicas con instituciones públicas, centros de investigación y aliados comerciales para garantizar la sostenibilidad técnica, organizativa y comercial de las cadenas de valor una vez finalice el subproyecto.
