

SEGUNDO INFORME TÉCNICO DE AVANCES DEL SUBPROYECTO

Periodo de reporte: Abril a julio de 2026

Nombre de la organización:	Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (FECONAFROPU) – ORPIO.
Nombre del proyecto:	Chacras Integrales y Producción Comunitaria para la Seguridad Alimentaria de las Comunidades Indígenas del Medio Putumayo.
Lugar de intervención:	Diez comunidades indígenas del Medio Putumayo, provincia del Putumayo, departamento de Loreto, Perú.
Coordinador del Proyecto:	Arlen Ribeira Calderón
Periodo de reporte:	Abril a Julio 2026
Persona/ email de contacto:	arianasusan05@gmail.com

1. Introducción

El proyecto marco «Manejo Integrado de la Cuenca Putumayo-Içá» (P172893) es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) mediante la Donación N.º TF0B8254-6L, canalizada a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF/Banco Mundial). En este marco, Wildlife Conservation Society (WCS) y FECONAFROPU-ORPIO suscribieron el subacuerdo para implementar el subproyecto «Chacras Integrales y Producción Comunitaria para la Seguridad Alimentaria de las Comunidades Indígenas del Medio Putumayo».

El subproyecto busca responder a la inseguridad alimentaria y a la degradación ecosistémica mediante un modelo integral que articula saberes ancestrales, agroforestería, diversificación de cultivos y piscicultura comunitaria. Su ámbito comprende diez comunidades: Puerto Milagros, Nuevo Porvenir, Nuevo Horizonte, Mairidicai, Puerto Aurora, Puerto Elvira, Siete de Mayo, Roca Fuerte, Flor de Agosto y Santa Lucía.

El presente informe consolida el periodo comprendido entre abril y julio de 2026. Entre el 26 de abril y el 5 de mayo se realizaron asambleas de socialización, presentación y aprobación del Plan de Participación Indígena (PPI), evaluación de áreas y adopción de acuerdos en las diez comunidades. En junio no se ejecutaron actividades. En julio se retomó el trabajo mediante la presentación de los planes, el seguimiento de las chacras, la preparación inicial de terrenos y las acciones preparatorias del componente piscícola. Solo se incorporan actividades con respaldo documental.

2. Objetivos

2.1 Objetivo principal

- ✓ Promover la seguridad alimentaria mediante el desarrollo e implementación de un modelo integral participativo que combine la producción sostenible de alimentos con una estrategia comunicacional basada en un enfoque intercultural, garantice el abastecimiento continuo de alimentos y revalorice los saberes ancestrales.

2.2 Objetivos específicos

- ✓ Fortalecer los sistemas de producción de alimentos mediante la integración de técnicas modernas y tradicionales para asegurar el acceso y el abastecimiento continuo de alimentos saludables.
- ✓ Desarrollar capacidades técnicas y organizacionales con enfoque de seguridad alimentaria sostenible.
- ✓ Desarrollar e implementar campañas de comunicación y programas educativos que difundan información sobre nutrición, beneficios de la producción sostenible y prácticas alimentarias saludables.

3. Metodología

La implementación se desarrolla con enfoque territorial, participativo e intercultural. Durante el periodo reportado se emplearon asambleas comunales, acuerdos, visitas de campo, identificación y medición de áreas, seguimiento productivo y sistematización mensual. El avance se verificó mediante informes, actas, listas de asistencia y registros fotográficos.

3.1 Distribución territorial de las promotorías

Responsable	Componente	Comunidades asignadas
Disney Cady Espinoza Mera	Promotoría agroforestal	Mairidicai, Nuevo Horizonte, Nuevo Porvenir y Puerto Milagros
Luz Marina Rojas Canayo	Promotoría agroforestal	Puerto Aurora, Puerto Elvira y Siete de Mayo
Perceo Giovanni Inuma Mozombite	Promotoría agroforestal	Roca Fuerte, Flor de Agosto y Santa Lucía
Juber Ríos Buinaijima	Promotoría piscícola	Mairidicai, Puerto Aurora y Flor de Agosto

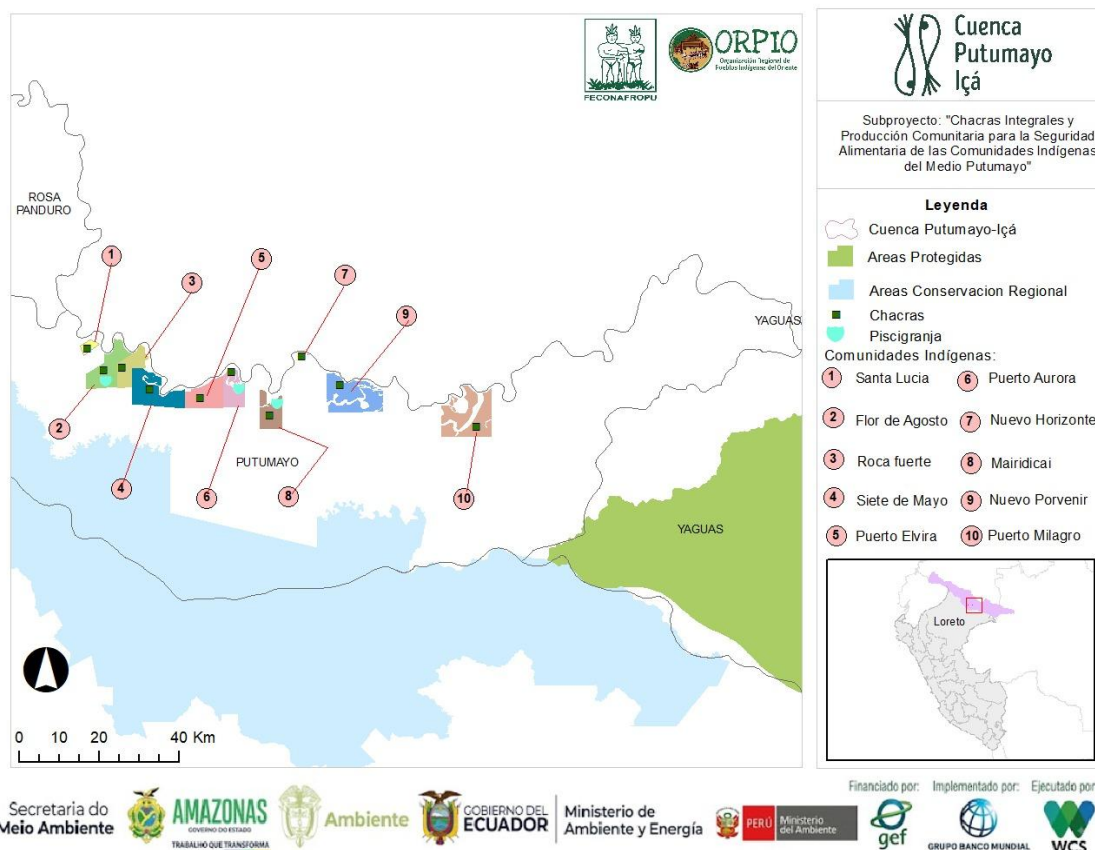


Figura 1. Ubicación de las diez comunidades indígenas priorizadas por el subproyecto.

3.2 Mecanismos de trabajo y seguimiento

- ✓ Planificación mensual y elaboración de rutas de visita por comunidad.
- ✓ Coordinación con autoridades comunales, familias beneficiarias y equipo técnico.
- ✓ Recorridos de campo para identificar, medir y preparar las áreas productivas.
- ✓ Registro mediante actas, listas de asistencia, fotografías e informes mensuales.

4. Desarrollo y operación de los arreglos de gobernanza del subproyecto

La gobernanza operativa articula a FECONAFROPU-ORPIO, WCS, las autoridades comunales, las familias beneficiarias y las promotorías territoriales. Los planes asignan a los promotores funciones de enlace, organización de la participación comunitaria, acompañamiento técnico básico, registro de avances y comunicación con el equipo del subproyecto.

Actor	Función documentada	Situación en el periodo abril-julio
FECONAFROPU-ORPIO	Organización implementadora y articulación del subproyecto.	Condujo la socialización inicial, articuló los acuerdos comunales y organizó el seguimiento y los reportes del subproyecto.
WCS	Contraparte del subacuerdo y entidad ejecutora del proyecto marco.	Realizó seguimiento y acompañamiento técnico a la implementación del subproyecto.
Autoridades comunales	Coordinación, convocatoria, validación y organización local.	Participaron en la validación de las áreas, la aprobación de las chacras y los acuerdos del PPI en las diez comunidades.
Promotorías	Acompañamiento territorial agroforestal y piscícola, seguimiento y reporte.	En julio efectuaron la presentación de planes, visitas de campo, monitoreo agroforestal y seguimiento piscícola, con reportes y evidencias.

5. Avances, resultados y discusión de la implementación del subproyecto

5.1 Avances en las actividades e indicadores

La evidencia disponible permite confirmar los siguientes avances ejecutados entre abril y julio de 2026. Las actividades se presentan en orden cronológico y se diferencia expresamente entre acuerdos, acciones realizadas y procesos aún en curso.

Periodo	Actividad ejecutada	Comunidades / ámbito	Principales resultados y estado	Medios de verificación
26-30 abr.	Socialización del subproyecto; presentación y aprobación del PPI; evaluación de chacras y piscigranjas.	Siete de mayo, Roca Fuerte, Flor de Agosto, Santa Lucía, Puerto Elvira y Nuevo Porvenir.	Se aprobaron las chacras en las seis comunidades. Flor de Agosto aprobó el componente piscícola; en las demás se registraron decisiones según la viabilidad del terreno. Se acordó un jornal de S/ 60 donde consta en acta.	ANEXO 1. Informe mensual del coordinador de campo. ANEXO 2. Actas comunales; acuerdos. ANEXO 3. fotografías.
1-5 may.	Continuación de la socialización, PPI, reconocimiento y georreferenciación de áreas por medio de fotos.	Puerto Milagros, Nuevo Horizonte, Puerto Aurora y Mairidicai.	Se completó la aprobación de las chacras en las diez comunidades. Se confirmó la viabilidad piscícola en Puerto Aurora y Mairidicai; junto con Flor de Agosto, quedaron tres comunidades priorizadas.	ANEXO 1. Informe mensual del coordinador de campo. ANEXO 2. Actas de socialización. ANEXO 3. Fotografías referenciadas.
Abr.-may.	Modificación del plan de insumos del componente piscícola.	Flor de Agosto, Puerto Aurora y Mairidicai.	Las asambleas aprobaron solicitar el cambio de gamitana y boquichico por alevinos de paco.	ANEXO 2. Actas de asamblea y actas de acuerdo comunal.
Junio	Sin actividades ejecutadas.	Ámbito del subproyecto.	No se registraron actividades de campo ni productos del mes; por ello no se atribuyen avances a junio.	No se cuenta con actas ni informes de actividades de junio.
15-23 jul.	Presentación del equipo y planes de trabajo; validación del diseño; monitoreo y preparación inicial de chacras.	Nueve comunidades con acciones presenciales documentadas; Puerto Milagros con seguimiento a distancia por inundación.	Se reportó seguimiento de las diez chacras y labores iniciales de rozo, tumba y picacheo. El informe del coordinador consigna 114 participaciones en las reuniones de julio.	ANEXO 1. Informe mensual del coordinador de campo; informes de promotoría. ANEXO 2. Actas y listas ANEXO 3. Fotografías.
Julio	Seguimiento y preparación del componente piscícola.	Flor de Agosto, Puerto Aurora y Mairidicai.	Se reportó la preparación de dos áreas para construcción de estanques, de aproximadamente 2 000 m ² cada una, y un estanque para rehabilitación en Mairidicai. No se confirma infraestructura terminada.	ANEXO 1. Informe mensual del coordinador de campo. ANEXO 2. Actas de seguimiento. ANEXO 3. Fotografías.
Julio	Sistematización, reporte mensual y preparación del diagnóstico de saberes ancestrales.	Seguimiento general del subproyecto.	Se ordenaron las actividades de los promotores, se consolidó el reporte mensual y se elaboró la guía de entrevista. El diagnóstico se encuentra en proceso.	Documento de actividades ordenadas; reporte mensual; guía de entrevista.

5.2 Avance del PPI y modificación del plan de insumos

- ✓ Implementación del PPI. Entre abril y mayo el PPI fue presentado y aprobado en las diez comunidades como parte de las asambleas y acuerdos comunales. Esto evidencia el inicio de su implementación mediante mecanismos de participación y validación. En junio no hubo actividades y, con la documentación disponible.
- ✓ Modificación del plan de insumos. En Flor de Agosto, Puerto Aurora y Maridicai, se aprobó solicitar el reemplazo de gamitana y boquichico por alevinos de paco.

5.3 Dificultades presentadas en la ejecución

Dificultad	Efecto en la ejecución o el reporte
En junio no se ejecutaron actividades.	Se generó una interrupción entre la socialización inicial y el seguimiento de julio.
Inundación y ausencia de comuneros en Puerto Milagros durante julio.	No se realizó una jornada presencial; el avance fue comunicado al equipo de promotores.

5.4 Lecciones aprendidas

- ✓ La validación comunal temprana permitió acordar las áreas, el PPI y la viabilidad de las actividades productivas antes del trabajo de campo.
- ✓ La programación debe conservar flexibilidad frente a inundaciones, transporte y disponibilidad comunal, dejando constancia de las acciones presenciales y a distancia.

6. Avances en el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales

Actividad de la matriz de riesgos	Medida o control previsto	Actividad relacionada (abril-julio 2026)
Implementación de chacras integrales y piscigranjas (10 comunidades)	Planificación y validación comunitaria, acuerdos comunales, comités.	Asambleas de socialización, presentación y aprobación del PPI, acuerdos comunales y validación de áreas en las diez comunidades; seguimiento productivo en julio.
Diseño de chacras integrales amazónicas	Diseño participativo, selección del sitio y evaluación de suelos e inundación.	Reconocimiento y georreferenciación inicial de las áreas entre abril y mayo; presentación y validación del diseño y monitoreo en julio.
Instalación de chacras integrales	Buenas prácticas agroecológicas, manejo del suelo, no quema, PMA y supervisión.	Acompañamiento en labores iniciales de rozo, tumba y picacheo.
Capacitación en manejo agroforestal	Aprender haciendo, prácticas orgánicas, asistencia y evaluación del aprendizaje.	Ocho jornadas agroforestales de orientación y asistencia en campo durante julio.
Construcción de piscigranjas	SST, drenaje, control de sedimentación, supervisión, lista de control y residuos.	Evaluación de viabilidad en tres comunidades y preparación inicial de dos áreas de construcción y una de rehabilitación.

7. Avances en el plan de fortalecimiento de la entidad (si aplica)

No se ejecutó un Plan de Fortalecimiento Institucional formal. Como apoyo técnico y de sistematización, se ordenaron las actividades de los promotores de abril a julio, se consolidó el reporte mensual, se organizaron actas, listas y registros fotográficos, y se elaboró la guía de entrevista para el diagnóstico de saberes ancestrales, el cual se encuentra en proceso.

8. Recomendaciones para mejorar la ejecución

- ✓ Reprogramar la reunión de Puerto Milagros y documentar la coordinación previa con la autoridad comunal.

Sugerencias operativas formuladas por uno de los promotores:

- ✓ Proveer a cada promotor materiales básicos de primeros auxilios, como pastillas, gasas, algodón, alcohol y vendas.
- ✓ Proveer materiales y equipos de campo, especialmente botas y machetes, por ser necesarios para las intervenciones en campo.
- ✓ Agilizar, con la debida anticipación, el traslado de los plantones para desarrollar la siembra de acuerdo con los planes de trabajo y los cronogramas de actividades de cada promotor.

9. Anexos

- ✓ Anexo 1. Planes de trabajo y primeros productos de las promotorías.
- ✓ Anexo 2. Actas, listas de asistencias y registro fotográfico.
- ✓ Anexo 3. Base consolidada de participantes y familias beneficiarias.

10. Fuentes documentales

N.º	Documento
1	COQUINCHE SANDA, Mario. Informe N.º 001-2026-MCS, actividades realizadas entre abril y mayo de 2026. FECONAFROPU-ORPIO.
2	COQUINCHE SANDA, Mario. Informe N.º 002-2026-PROYECTO., actividades realizadas en julio de 2026. FECONAFROPU-ORPIO.
3	Actas de asamblea, actas de acuerdo, listas de asistencia y registros fotográficos de abril, mayo y julio de 2026.
4	Actividades de promotores abril-julio ordenadas; reporte mensual de julio; guía de entrevista para el diagnóstico de saberes ancestrales.

MARCO DE RESULTADOS DEL SUBPROYECTO - AVANCE DOCUMENTADO DE ABRIL A JULIO DE 2026

Objetivo principal	Implementar chacras integrales amazónicas en 10 comunidades indígenas del medio Putumayo para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, recuperar conocimientos ancestrales y consolidar sistemas productivos sostenibles que protejan la biodiversidad y fortalezcan la resiliencia comunitaria.		
Objetivo específico 1	1. Diversificar la producción alimentaria recuperando saberes ancestrales y prácticas agroforestales.		
Actividad	Indicador y meta original	Actividad ejecutada y aporte al indicador (abril-julio 2026)	Medios de verificación
Diseño de chacras integrales amazónicas	Plan técnico aprobado; planes de chacras con especies nativas. Meta: 1 plan técnico aprobado y 10 planes de chacras.	Entre abril y mayo se socializó el subproyecto, se aprobaron las chacras y se ubicaron o georreferenciaron las áreas en las 10 comunidades. En julio se presentó el plan de trabajo, se validó el diseño y se efectuó el seguimiento.	Informe mensual del coordinador de campo; actas comunales; planes de trabajo; registros fotográficos.
Instalación de chacras integrales	Cantidad de chacras operativas; cantidad de personas con acceso a alimentos diversificados. Meta: 10 chacras operativas.	En julio se monitorearon las 10 chacras y se registraron acciones iniciales de preparación del terreno, como rozo, tumba y picacheo. En Puerto Milagros el seguimiento fue a distancia por la inundación. Aporte: fase inicial de instalación; no se confirma que las 10 chacras estuvieran operativas al 31 de julio.	Informe mensual del coordinador de campo; actas de seguimiento; listas de asistencia; fotografías de las labores de campo.
Capacitación en manejo agroforestal	Cantidad de personas certificadas; porcentaje de técnicas sostenibles aplicadas. Meta: 100 personas certificadas y 70 % aplica técnicas sostenibles.	En julio se documentaron 8 jornadas agroforestales de presentación, orientación y acompañamiento de campo. Aporte: fortalecimiento inicial de capacidades. La evidencia disponible no confirma certificación ni el porcentaje de aplicación de técnicas sostenibles.	Actas, listas e informes de promotoría correspondientes a las jornadas agroforestales de julio.
Objetivo específico 2	2. Implementar piscigranjas comunitarias con especies nativas que fortalezcan la seguridad alimentaria local.		
Actividad	Indicador y meta original	Actividad ejecutada y aporte al indicador (abril-julio 2026)	Medios de verificación
Construcción y rehabilitación de piscigranjas	Infraestructuras equipadas. Meta: 10 infraestructuras equipadas y 100 % con sistemas anti-sedimentación.	Entre abril y mayo se determinó la viabilidad en Flor de Agosto, Puerto Aurora y Mairidicai. En julio se reportó la preparación de dos áreas para construcción, de aproximadamente 2 000 m² cada una, y un estanque para rehabilitación en Mairidicai. Aporte: preparación de sitios.	Informe mensual del coordinador de campo; actas comunales; fotografías de las áreas piscícolas.
Diagnóstico participativo de saberes ancestrales	Diagnóstico participativo realizado, conforme al plan de trabajo técnico.	Se elaboró la guía de entrevista y se inició la organización de la información. El diagnóstico se encuentra en proceso.	Guía de entrevista.
