Informe Técnico de Avances de Subproyectos

Nombre de la organización:	**Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos (GADPS)**
Nombre del proyecto:	**Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las Comunidades: Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en.**
Lugar de intervención:	**Cantones Putumayo y Cascales, provincia de Sucumbíos – Ecuador.**
Código del acuerdo de asociación:	**#210456**
Coordinador del Proyecto:	**Ing. Christian Fernández**
Periodo de Reporte y fecha de entrega:	**Agosto 2025 – febrero de 2026**
Persona/ email de contacto:	**christian.fernandez@sucumbios.gob.ec**

1. Introducción

El presente informe técnico consolida los avances alcanzados durante el periodo comprendido entre agosto de 2025 al 25 de febrero de 2026, en el marco del subproyecto ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, en articulación con la organización cooperante **Wildlife Conservation Society (WCS)**, como parte de la implementación del **Proyecto GEF Putumayo-Içá**.

El subproyecto inició su fase preparatoria en agosto de 2025, desarrollándose durante septiembre el proceso de socialización, validación comunitaria y coordinación interinstitucional en las cuatro comunidades beneficiarias.

La incorporación del consultor responsable del acompañamiento técnico se efectuó el 15 de octubre de 2025, por lo que los avances técnicos operativos detallados en el presente informe corresponden principalmente al periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2025 y febrero de 2026, incorporando de manera referencial las acciones preparatorias desarrolladas en la fase inicial.

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades de planificación técnica y coordinación interinstitucional, georreferenciación y actualización cartográfica de chacras agroforestales mediante sistemas SIG (QGIS), fortalecimiento organizativo comunitario, talleres de identificación y perfilamiento de bioemprendimientos, capacitaciones en Buenas Prácticas Ambientales y Buenas Prácticas Agrícolas,

capacitación especializada en recolección y toma de muestras de suelo, consolidación de requerimientos técnicos de material vegetativo, estructuración técnica para la construcción de viveros comunitarios, apoyo en estudios de mercado para adquisición de kits de herramientas, acompañamiento en procesos administrativos de contratación y adquisición, y recepción técnica de equipos electrónicos (cámara fotográfica, proyector multimedia, GPS y estación de energía portátil) destinados al fortalecimiento operativo del subproyecto.

2. Objetivos

Objetivo principal

Conservar la cultura de las nacionalidades y pueblo afroecuatoriano, cuidando los ecosistemas frágiles, garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades e incrementar los ingresos económicos familiares en las Comunidades: Lorenzo, San José de Wisuya, Sandiyacu, Chandia Na'en.

Objetivos específicos

1. Desarrollar los conocimientos, habilidades técnicas y actitudes de los participantes del proyecto, en la implementación de 60 chacras de una hectárea por familia de productos de la charca ancestral.
2. Mejorar la infraestructura productiva de la chacra a través de mingas y trabajo comunitario.
3. Brindar el fortalecimiento a las comunidades que forman parte del proyecto con la dotación de equipos y herramientas de acuerdo a las necesidades.

3. Metodología

La metodología del subproyecto se basa en un enfoque territorial, participativo e intercultural que permite planificar e implementar acciones adaptadas al contexto de las comunidades indígenas como los son: Siona, Kichwa, Cofán y pueblo Afroecuatoriano. La estrategia metodológica articula la participación comunitaria, el fortalecimiento de capacidades, la validación cultural y la aplicación de estándares ambientales y sociales, garantizando la sostenibilidad técnica y social del modelo. Su diseño responde a los principios del consentimiento libre e informado, la corresponsabilidad comunal y la pertinencia cultural definidos en el Plan para Pueblos Indígenas (PPPI).

Durante la fase inicial (agosto – septiembre 2025) se desarrolló un proceso de socialización comunitaria y validación participativa del subproyecto.

A partir del 15 de octubre de 2025 se consolidó la implementación técnica operativa, mediante:

- Georreferenciación de chacras agroforestales con dispositivos GPS.
- Sistematización y procesamiento cartográfico en QGIS.
- Socialización comunitaria previa a cada intervención técnica.
- Talleres participativos para identificación de bioemprendimientos.
- Capacitaciones en Buenas Prácticas Ambientales y Agrícolas.
- Capacitación técnica en recolección y toma de muestras de suelo (en coordinación con el Instituto Superior Tecnológico – ISTEC).
- Consolidación participativa de requerimientos de especies vegetales.
- Análisis técnico para estructuración de viveros comunitarios.
- Coordinación interinstitucional con GADPS, WCS, ISTEC e INABIO.
- Seguimiento administrativo de adquisiciones y contrataciones.

La implementación respetó los principios de consentimiento libre e informado, gobernanza comunitaria y pertinencia cultural.

4. Desarrollo y operación de los arreglos de gobernanza del subproyecto

La ejecución del subproyecto se realizó en coordinación con:

- Presidentes y autoridades comunitarias.
- Promotores comunitarios contratados.
- Dirección de Nacionalidades y Pueblo Afroecuatoriano del GADPS.
- Equipo técnico de WCS.

Las actividades fueron previamente socializadas y validadas en territorio, garantizando la participación activa de beneficiarios y autoridades locales (Anexo 4).

Se promueve el trabajo mediante mingas comunitarias y espacios participativos de toma de decisiones.

En la comunidad San José de Wisuya, durante el proceso de socialización inicial (septiembre 2025) fue electa como promotora comunitaria la señora Rociris Piaguaje. Posteriormente, por motivos personales, presentó su renuncia voluntaria al encargo. En coordinación con la directiva comunitaria se procedió a la designación del señor Hans Daril Piaguaje como nuevo promotor comunitario, garantizando la continuidad del proceso técnico en territorio (Anexo 4.3)

5. Avances, resultados y discusión de la implementación del Subproyecto (Narrativo).

5.1. Avances en los actividades e indicadores del Subproyecto.

- **Georreferenciación y actualización cartográfica (Anexo 6).**

Tabla 1. Resultados de las actividades de georreferenciación de chacras.

Actividad / Indicador / Actores	Lugar	Fecha	Planificadas	Ejecutadas	% de ejecución
Georreferenciación de chacras / Consultor subproyecto	Sandy Yaku y Lorenzó	Noviembre 2025	30	30	100%
Georreferenciación de chacras / Consultor subproyecto	San José de Wisuya y Chandia Na´en	Diciembre 2025	30	30	100%
Actualización y reubicación de registros geoespaciales de chacras / Consultor subproyecto	Chandia Na´en	Febrero 2026	0	5	Actividad no planificada
TOTAL			**60**	**60**	**100%**

30 chacras georreferenciadas (noviembre 2025).

- 15 chacras comunidad Sandy Yaku (Anexo 6.5).
- 15 chacras comunidad Lorenzó (Anexo 6.6).

30 chacras georreferenciadas (diciembre 2025).

- 15 chacras comunidad San José de Wisuya (Anexo 6.7).
- 15 chacras comunidad Chandia Na´en (Anexo 6.8).

Actualización de 5 nuevas ubicaciones (febrero 2026).

Total acumulado: 60 chacras con registro geoespacial sistematizado en QGIS

La actualización de cinco registros geoespaciales no corresponde a nuevas chacras georreferenciadas. Durante la jornada de trabajo, cinco beneficiarios solicitaron cambiar la ubicación previamente registrada de sus chacras, por lo que se procedió a actualizar estos registros a solicitud de los beneficiarios.

- **Fortalecimiento de capacidades**

Tabla 2. Resultados del fortalecimiento de capacidades (Anexo 5).

Actividad / Indicador / Actores	Lugar	Fecha	Planificadas	Ejecutadas	% de ejecución
Socializaciones comunitarias sobre manejo responsable de chacras y uso adecuado de herramientas	Comunidades beneficiarias	Noviembre 2025	Continuas	Realizadas en cada visita técnica	Actividad continua
Capacitación técnica en toma de muestras de suelo dirigida a promotores comunitarios	Comunidades beneficiarias	Enero 2026	1	1	100%
Jornadas para la identificación y perfilamiento de bioemprendimientos comunitarios / ISTEC	Comunidades beneficiarias	Enero – febrero 2026	4	4	100%
Talleres de capacitación en Buenas Prácticas Ambientales (BPA)	Comunidades beneficiarias	Febrero 2026	4	4	100%
Talleres de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)	Comunidades beneficiarias	Febrero 2026	4	4	100%

Se desarrollaron:

- Socializaciones sobre manejo responsable de chacras y uso de herramientas (Foto 1; Foto 2; Foto 3).
- 1 capacitación técnica en toma de muestras de suelo dirigida a promotores comunitarios (Anexo 5.13 y Anexo 3)
- 4 jornadas de identificación y perfilamiento de bioemprendimientos dirigidos por el ISTEC (Anexo 5.5 y Anexo 3.1.).
- 4 talleres de Buenas Prácticas Ambientales (Anexo 5.9 y Anexo 3.2.)
- 4 talleres de Buenas Prácticas Agrícolas (Anexo 5.9 y Anexo 3.2.)

- **Fortalecimiento técnico-operativo**

Tabla 3. Resultados de las actividades de gestión técnica y operativa.

Actividad / Indicador / Actores	Lugar	Fecha	Planificadas	Ejecutadas	% de ejecución
Apoyo técnico en el estudio de mercado para la adquisición de kits de herramientas	Oficina del proyecto	Enero 2026	1	En Proceso	50%
Coordinación técnica para el estudio de microbioma del suelo con INABIO (revisión de requerimientos técnicos y condiciones de colaboración)	Instituciones vinculadas al proyecto	Enero 2026	1	En proceso	50%
Recepción y verificación técnica de equipos electrónicos (cámara fotográfica, proyector multimedia, GPS y estación de energía portátil)	Oficina del proyecto / Comunidades beneficiarias	Febrero 2026	1	1	100%
Elaboración del requerimiento técnico para la construcción e instalación de cuatro viveros comunitarios	Comunidades beneficiarias	Febrero 2026	1	En Proceso	50%
Consolidación técnica de especies vegetales priorizadas por comunidad	Comunidades beneficiarias	Febrero 2026	1	En Proceso	50%

- Apoyo en estudio de mercado para adquisición de kits de herramientas (Anexo 7.4.)
- Coordinación técnica para estudio de microbioma con INABIO (Anexo 7.5.)
- Recepción y verificación técnica de equipos electrónicos: cámara fotográfica, proyector multimedia, GPS y estación de energía portátil (Anexo 5.14 y Anexo 8).
- Elaboración del requerimiento técnico para construcción e instalación de cuatro viveros comunitarios (Anexo 7.1.).
- Consolidación técnica de especies vegetales priorizadas por comunidad (Anexo 7.2.).

5.2. Dificultades presentadas en la ejecución del Subproyecto

- Retrasos en la ejecución de actividades durante octubre debido al paro nacional convocado por organizaciones indígenas, que restringió la movilidad y el acceso a las comunidades beneficiarias.
- Retrasos administrativos en algunos procesos de adquisición de insumos y equipos.
- Reubicación de algunas chacras en la comunidad Chandia Na'en, lo que implicó ajustes en su registro geoespacial.
- Condiciones climáticas estacionales propias de la Amazonía, especialmente el periodo de inundaciones recurrentes durante los meses de junio y julio, que generan afectaciones en accesibilidad, movilidad fluvial y estabilidad de áreas productivas cercanas a riberas.

5.3. Lecciones aprendidas

- La planificación logística anticipada mejora la eficiencia operativa y reduce impactos por factores externos.
- La participación activa de promotores comunitarios fortalece la implementación y facilita la comunicación territorial.
- La sistematización geoespacial temprana facilita la planificación técnica y la identificación de zonas de riesgo.
- Es fundamental alinear los procesos administrativos y de entrega de insumos con los calendarios agroecológicos amazónicos.
- La identificación temprana de chacras en zonas susceptibles a inundación permite planificar medidas preventivas y priorizar intervenciones en áreas con menor vulnerabilidad estacional.

6. Avances en el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales

Se participó en capacitación sobre:

- Matriz de Riesgos.
- Informe de Cumplimiento MGAS.
- Plan para Pueblos Indígenas (PPI).

Se brindó apoyo técnico en la revisión y ajuste del PPI, fortaleciendo su alineación con los lineamientos del proyecto.

Se realizó seguimiento a la ubicación de chacras cercanas a riberas, identificando niveles diferenciados de exposición a riesgos de inundación.

7. Avances en el plan de fortalecimiento de la entidad (si aplica)

- Capacitación técnica a promotores comunitarios.
- Implementación y manejo de herramientas SIG (QGIS).
- Fortalecimiento de capacidades en gestión logística y administrativa.
- Coordinación interinstitucional para optimización de procesos de adquisición.

8. Recomendaciones para mejorar la ejecución

- Agilizar procesos administrativos para adquisición de insumos y construcción de viveros.
- Alinear la entrega de material vegetativo con el calendario agrícola amazónico y las condiciones estacionales del territorio, especialmente en zonas con mayor riesgo de inundación.
- Mantener monitoreo técnico de chacras ubicadas cerca de riberas ante posibles inundaciones estacionales.
- Mantener la coordinación técnica con el ISTEC para el seguimiento del proceso de identificación y análisis de bioemprendimientos comunitarios.
- Fortalecer la articulación interinstitucional para reducir tiempos de validación.

9. Resumen informe Técnico

El siguiente cuadro resume el nivel de ejecución de las principales actividades planificadas del subproyecto durante el periodo agosto 2025 – febrero 2026.

Tabla 4. Resumen de actividades

Componente	Actividades planificadas	Ejecutadas equivalentes	% cumplimiento
Georreferenciación y actualización cartográfica	2	2	100%
Fortalecimiento de capacidades	13	13	100%
Fortalecimiento técnico-operativo	5	3	60%
Total general	20	**18**	**87%**

10. Firmas de Responsabilidad

Elaborado por:	Aprobado por:
Firmado electrónicamente por: FREDDY EULOGIO SARANGO LAPO. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: CHRISTIAN ALEXANDER FERNANDEZ YEPEZ. Validar únicamente con FirmaEC
Ing. Freddy Sarango **CONSULTOR INDIVIDUAL**	Ing. Christian Fernández **COORDINADOR DEL SUBPROYECTO**

11.Anexos.

ANEXO 1: EQUIPO DELEGADO PARA TRABAJAR EN EL PROYECTO GADPS -WCS

SUCUMBÍOS PREFECTURA

PREFECTURA

MEMORANDO N.°: 1491 P-YPH-GADPS-2025

FECHA: Nueva Loja, 11 de septiembre de 2025.

DE: Ing. Yofre Poma Herrera, **PREFECTO DE SUCUMBÍOS.**

PARA: Ing. Christian Fernández, COORDINADOR GENERAL CORPOSUCUMBIOS
Ing. Juanita Medina, CONTADORA GENERAL DEL GADPS
Ing. Ismael Silva, SERVIDOR PUBLICO 8
Ing. Maribel Castro, ESPECIALISTA 3
Ing. María Loaiza, ANALISTA 3
Tlgo. Armando Yumbo, ANALISTA 4
Tlga. Genis Mera, ANALISTA 4
Sr. Ernesto Maniguaje, ANALISTA 4
Sr. Wilson Aguinda, ANALISTA 1

ASUNTO: Reestructuración del equipo técnico para el Proyecto WCS y GADPS

Como alcance al memorando No. 1228 P-YPH-GADPS-2025, de fecha 05 de agosto de 2025, referente al proyecto "**FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN DE LA CHACRA AGRICOLA ANCESTRAL DE LAS NACIONALIDADES Y EL PUEBLO AFROECUATORIANO MEDIANTE EL SISTEMA AGROFORESTAL EN LAS COMUNIDADES: LORENZO, SAN JOSE DE WISUYA, SANDIYACU, CHANDIA NA´EN**", se procede a reestructurar el equipo técnico para el Proyecto WCS y GADPS.

CARGO GADPS	CARGO PROYECTO WCS-GADPS
Ing. Christian Fernández, COORDINADOR GENERAL CORPOSUCUMBIOS	COORDINADOR
Ing. Juanita Medina, CONTADORA GENERAL GADPS	CONTADORA
Ing. María Loaiza, ANALISTA 3	SECRETARIA
Ing. Ismael Silva, SERVIDOR PUBLICO 8	PERSONAL DE APOYO TECNICO
Ing. Maribel Castro, ESPECIALISTA 3	
Tlgo. Armando Yumbo, ANALISTA 4	
Tlga. Genis Mera, ANALISTA 4	
Sr. Ernesto Maniguaje, ANALISTA 4	
Sr. Wilson Aguinda, ANALISTA 1	

Atentamente,

Firmado electrónicamente por: YOFRE MARTIN POMA HERRERA
Validar únicamente con FirmaEC

Yofre Poma Herrera
PREFECTO DE SUCUMBÍOS

CC. Coordinador General Administrativo y Talento Humano
Directora General de Cooperación Internacional
Director General de Nacionalidades y Pueblo Afroecuatoriano

- **Cambio de Contador para el Proyecto WCS - GADPS**

SUCUMBÍOS PREFECTURA

PREFECTURA

MEMORANDO N.°: 1703 P-YPH-GADPS-2025

FECHA: Nueva Loja, 21 de octubre de 2025.

DE: Ing. Yofre Poma Herrera, **PREFECTO DE SUCUMBÍOS.**

PARA: Tnlgo. Edison Ricardo Coronel Jiménez-**CONTADOR GENERAL DEL GADPS**

ASUNTO: Designación de Contador para el Proyecto WCS-GADPS

En atención al oficio No. 20-CP-CF-GADPS-WCS-2025, de fecha 14 de septiembre del 2025, suscrito por el Ing. Christian Fernández, Coordinador del Proyecto de Chacras Ancestrales, DESIGNO a usted como Contador del Proyecto "**FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN DE LA CHACRA AGRICOLA ANCESTRAL DE LAS NACIONALIDADES Y EL PUEBLO AFROECUATORIANO MEDIANTE EL SISTEMA AGROFORESTAL EN LAS COMUNIDADES: LORENZO, SAN JOSE DE WISUYA, SANDIYACU, CHANDIA NA´EN**", mismo que es financiado por WCS para ejecutar en los cantones de Putumayo y Cascales, bajo los parámetros y normativas establecidas en el Subacuerdo firmado entre WCS y GADPS.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
YOFRE MARTIN POMA HERRERA
Validez únicamente con FirmaEC

Ing. Yofre Poma Herrera
PREFECTO DE SUCUMBÍOS

Adjunto convenio y subacuerdo suscrito entre WCS-GADPS.

CC. Ing. Christian Fernández, Coordinador del Proyecto WCS-GADPS
Mgtr. Andrea Girón, Directora de Cooperación Internacional


ANEXO 2: LISTA DE BENEFICIARIOS DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES.

COMUNIDAD KICHWA SANDY YAKU


FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN DE LA CHACRA AGRÍCOLA ANCESTRAL DE LAS NACIONALIDADES.

# Familia	Nombres y Apellidos	Fecha de nacimiento	Edad	Cédula
Familia 1	Wilmer Camilo Aguinda Andi	15/07/1986	39	2100662168
	Adelia Bella Siquigua	20/11/1975	49	41125559
Familia 2	Ivan Gerardo Quinteros Bella	02/10/2001	24	2101125421
	Teresa Neida Zerda Shiguango	17/07/2007	18	1122338667
	Eliana Yanely Quinteros Zerda	02/11/2022	2	2150801666
Familia 3	Estiven Norbey Quinteros Bella	24/02/2003	22	2101125439
	Oscar Orlando Quinteros Bella	08/24/2004	15	2101326615
	Jairo Oswaldo Quinteros Bella	01/20/2012	13	2101326623
	Argeni Quinteros Bella	06/14/2013	12	2101326632
	Maritza Quinteros Bella	01/26/2015	10	2101326649
Familia 4	Clemente Tapuy Aguinda	20/01/1959	66	1500126137
	Blanca Luzmila Coquinche Alvarado	20/10/1964	59	1500214893
Familia 5	José Vladimir Tapuy Coquinche	07/13/1988	37	2100621735
	Briggethe Yileini Pugachi Muñoz	06/06/2000	25	2100993979
	Said Vladimir Tapuy Pugachi	23/05/2021	4	2150688428
Familia 6	Margot Judith Coquinche Alvarado	04/06/1987	38	2100609888
	Walter Jorge Galindo Achanga	22/11/1985	40	1130864167
	Walter David Galindo Coquinche	24/12/2010	15	2101270672
	Cristian Jhonathan Galindo Coquinche	28/08/2015	10	2150424923
Familia 7	Segundo Clemente Tapuy Coquinche	03/06/1995	30	2100778642
	Paola Dalila Censeguaje Moreno	07/07/1988	27	2101224489
	Mayerly Yeriyeis Tapuy Moreno	07/24/2016	9	2150480412
	Maykel Lian Tapuy Moreno	11/12/2018	7	2250513559
Familia 8	Silvia Gabriela Yori Monanga	27/5/1967	58	2100141775
	Gentil Papa Ponce	4/3/1965	60	2100376157
Familia 9	Lucy Mayerly Abigail Coquinche	05/14/1990	35	2101138945
	Miguel Angel Tangoy Mucushigua	04/07/1987	38	2100564588
	Angel Yofre Tangoy Abigail	17/05/2009	16	2150359517
	Wilmar Estalin Tangoy Abigail	17/04/2012	13	2150424089
	Aison Yondrey Tangoy Abigail	24/12/2013	11	2150424047
	Maily Natalya Tangoy Abigail	20/05/2018	7	Q151888963
Familia 10	Maria Gabriela Abigail Coquinche	12/11/1993	32	2100897848
	Karina Lissed Abigail Coquinche	20/04/2012	13	2160446532
Familia 11	Anyely Yariana Abigail Coquinche	16/11/2027	8	2150587562
	Rene Alonso Galindo Noa	22/04/1995	30	2100460349

Familia 12	Elvis Inis Proaño Achanga	15/05/1983	42	2100354455
	Eleucadio Achanga Noa	24/09/1971	54	8170723319
	Anderson David Achanga Proaño	30/03/2004	21	2100960724
	Esneider Joel Achanga Proaño	11/08/2008	17	2101325881
	Ana Mayeli Achanga Proaño	11/06/2011	14	2101325881
	Jema Yanely Achanga Proaño	19/12/2015	10	2150214475
Familia 13	Yeimi Selena Achanga Proaño	07/08/2001	23	2100460745
	Ezequiel David Achanga Proaño	05/11/2019	6	2150632517
Familia 14	Adrian Jair Tapuy Coquinche	12/03/2003	22	2100460224
Familia 15	Walter Estaniey Tangoy Papa	23/01/2007	18	2101045187
	Merly Rosailvira Quintero Bella	19/01/1992	33	112272466
	Navi Merly Yara Quintero	17/05/2012	13	1122724910
	Keider Nicolas Yara Quintero	24/07/2013	12	1122630466
	Yariana Scarlett Quintero Bella	27/07/2021	5	2150700843



José V. Tapuy Coquinche
Presidente de la Comunidad
2100621735



Iván Quintero
Secretario de la Comunidad
2101125421

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE CHACRAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDADES Y PUEBLOS AFROECUATORIANOS – GADPS - WCS

La comunidad Lorenzo certifica que las siguientes personas son beneficiarias del presente proyecto.

1. Guillermina Agredo
2. John Estupiñán
3. Nilson Mancilla
4. Crucilda Cisneros
5. Deisy Mina
6. Esteban Pianda
7. María Pianda
8. José Pianda
9. Hediberto Pianda
10. Alexander Valencia
11. Noe Mina
12. Alexandra Payaguaje
13. Emilio Castillo
14. Raúl Guevara
15. Laudriano Agredo

En señal de conformidad, firma la presidenta de la Comunidad Lorenzó

Guillermina Agredo García
Presidenta de la Comunidad Lorenzó

REPUBLICA DE ECUADOR
PROVINCIA DE SUCUMBIOS, CANTON PUTUMAYO
PARROQUIA SANTA HELENA
COMUNIDAD SIONA KICHWA SAN JOSE DE WISUYA
RESOLUCION N° SNGP-SPI-DFTS-2019-0153

BENEFICIARIOS DE PROYECTO DE CHAGRAS ANCESTRALES

No.	NOMBRES	APELLIDOS	No. DE CEDULA
1	Darwin Ruben	Rodriguez Gonzales	170806910-7
2	Yesis Felinto	Piaguaje Otavalo	210016239-1
3	Dago	Aguinda Otavalo	150040594-7
4	Marcelo Edgar	Solano Parreno	091998601-8
5	Ramiro	Arboleda	2704050
6	Alvaro	Tandioy	18195349
7	Abelino	Jipa Otavalo	150021942-1
8	Hugo Francisco	Cabrera Iles	97435341
9	Sandro Federman	Piaguaje Cabrera	210016230-0
10	Daril Hans	Piaguaje Chindoy	210083883-4
11	Cecilia	Chindoy Chindoy	175728300-5
12	Sandra Milena	Jipa Otavalo	210064789-3
13	Alonso Eduardo	Aguinda Otavalo	210077153-0
14	Kevin Orlando	Piaguaje	11124864841
15	Gustavo Orlando	Aguinda Otavalo	210024690-5

CENTRO COFAN CHANDIA NA'EN
ACUERDO MINISTERIAL 06277
chandianaen@gmail.com / 0991146152
SUCUMBIOS – CASCALES – TARUKA – ETSA – CHANDIA NA'EN

Familias Beneficiadas

N°	Apellidos y Nombres	Número de Cédulas
1	Descanse Queta Albertino	210000003-9
2	Descanse Queta Silverio	210000003-9
3	Descanse Umenda Atanacio	210004744-4
4	Descanse Umenda Reynaldo	210001848-6
5	Queta Alvarado Wilmer Francisco	210083430-4
6	Descanse Queta Cristian Efren	210109716-6
7	Descanse Quieta Bayron Claunido	210109963-4
8	Descanse Quieta Carlos Alexander	210087199-1
9	Lucitante Descanse Roberto Bolivar	215037047-2
10	Quenama Lucitante Tobias Heriberto	210115888-5
11	Lucitante Descanse Carlos Armando	210129124-9
12	Alvardo Descanse Alicia	210000041-9
13	Alvarado Descanse Heriberto	210000008-8
14	Queta Alvarado Nelso pedro	210087212-2
15	Descanse Umenda Luis Hernando	210058913-0


CERTIFICACION: Certifico que el presente listado es fiel copia de su original que reposa en los archivo de la comunidad. Centro Cofan Chandia Na'en a los 30 días del mes de septiembre de 2025..- Lo Certifico.

Carlos Alexander Descanse Quieta

PRESIDENTE DEL CENTRO COFAN CHANDIA NA'EN

ANEXO 3: REGISTROS DE ASISTENCIA

- **Anexo 3.1. Taller de capacitación en RECOLECCIÓN Y ETIQUETADO DE MUESTRAS DE SUELO dirigidos a los Promotores Comunitarios.**

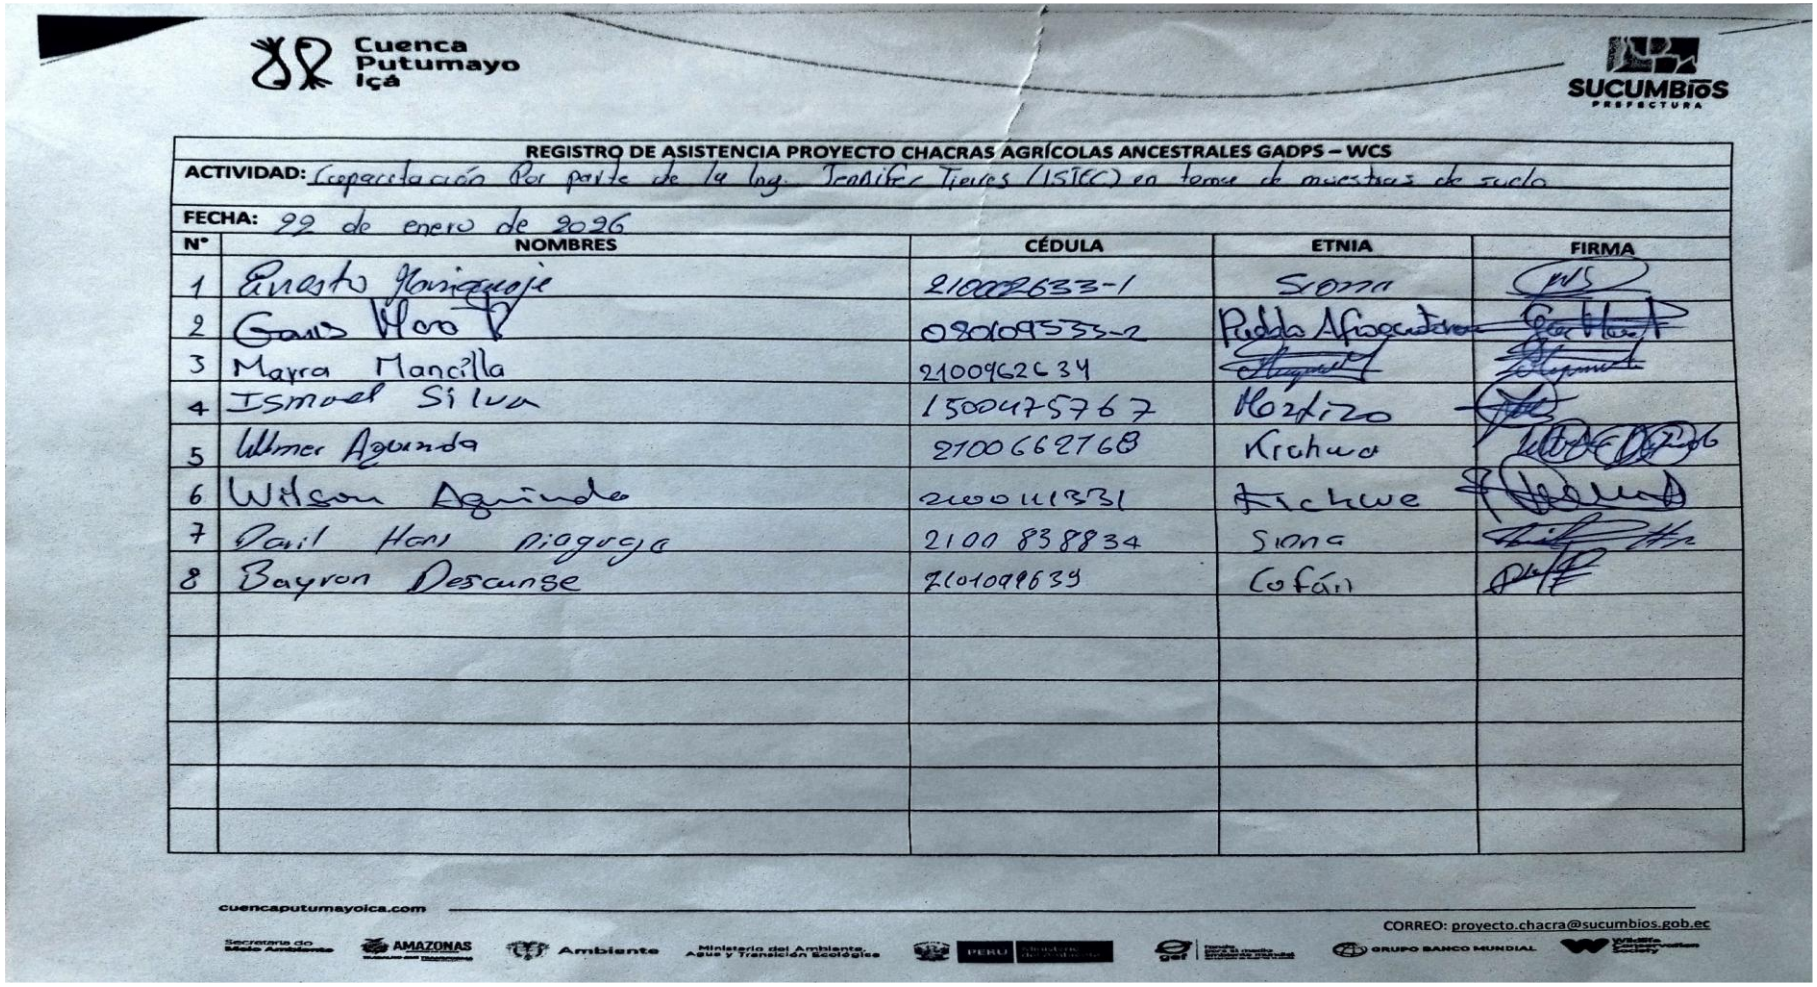

Cuenca Putumayo Içá

SUCUMBÍOS PREFECTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO CHACRAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES GADPS – WCS

ACTIVIDAD: Capacitación Por parte de la Ing. Jennifer Tierra (ISTEC) en toma de muestras de suelo

FECHA: 22 de enero de 2026

N°	NOMBRES	CÉDULA	ETNIA	FIRMA
1	Ernesto Yasiguaje	2100022633-1	Siona	
2	Gaus Moro	0801095332	Pueblo Afroecuatoriano	
3	Mayra Mancilla	2100962634		
4	Ismael Silva	1500475767	Mestizo	
5	Ulmer Aguinda	2100662768	Kichwa	
6	Wilson Aguinda	2100111331	Kichwa	
7	Dail Hani Piaguaje	2100 838834	Siona	
8	Bayron Descanse	2101099639	Cofán	

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

- **Anexo 3.2. Jornadas de identificación y PERFILAMIENTO DE BIOEMPRENDIMIENTOS dirigidos por el ISTEC (Comunidad: Chandia Na´en).**

Cuenca Putumayo Içá

SUCUMBIOS PREFECTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO CHACRAS ANCESTRALES

FECHA: 09/02/2026 **COMUNIDAD: CHANDI NAEN**


ACTIVIDAD: **TALLER Socialización de talleres de Bio-emprendimientos productivos**

N°	NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA	ETNIA	EDAD	FIRMA
	Reynaldo	Descanse	210018486	Cofan A'I	48	
	Lisbeth Greb	De la Cruz	220030088-5	Cofán	23	
	Yolanda	Descanse	210019103 6	cofan A'I	42	Yolanda
	Nataly	Descanse	210087797-8	Cofán A'I	24	Nataly
	Luis	Descanse	210058913-0	cofán	37	
	Francisco	Queta	210085430-4	cofán	32	Wilmer Queta
	Cristian	Descanse	210069776-6	cofán	27	
	Nelson	Queta	210087812.2	cofán	27	Nelson Queta
	Heiberto	Alvarado	210000008-8	cofán	60	
	Moises	Alvarado	210087810-6	cofan	24	
	Silverio	Descanse	210000069-0	cofan	50	
	Daniela	Lucitante	2101228191	Cofán	121	Angela L.
	Angelica	Queta	2100792265	cofan	44	

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

- **Anexo 3.3. Jornadas de identificación y PERFILAMIENTO DE BIOEMPRENDIMIENTOS dirigidos por el ISTEC (Comunidad: Lorenzó).**

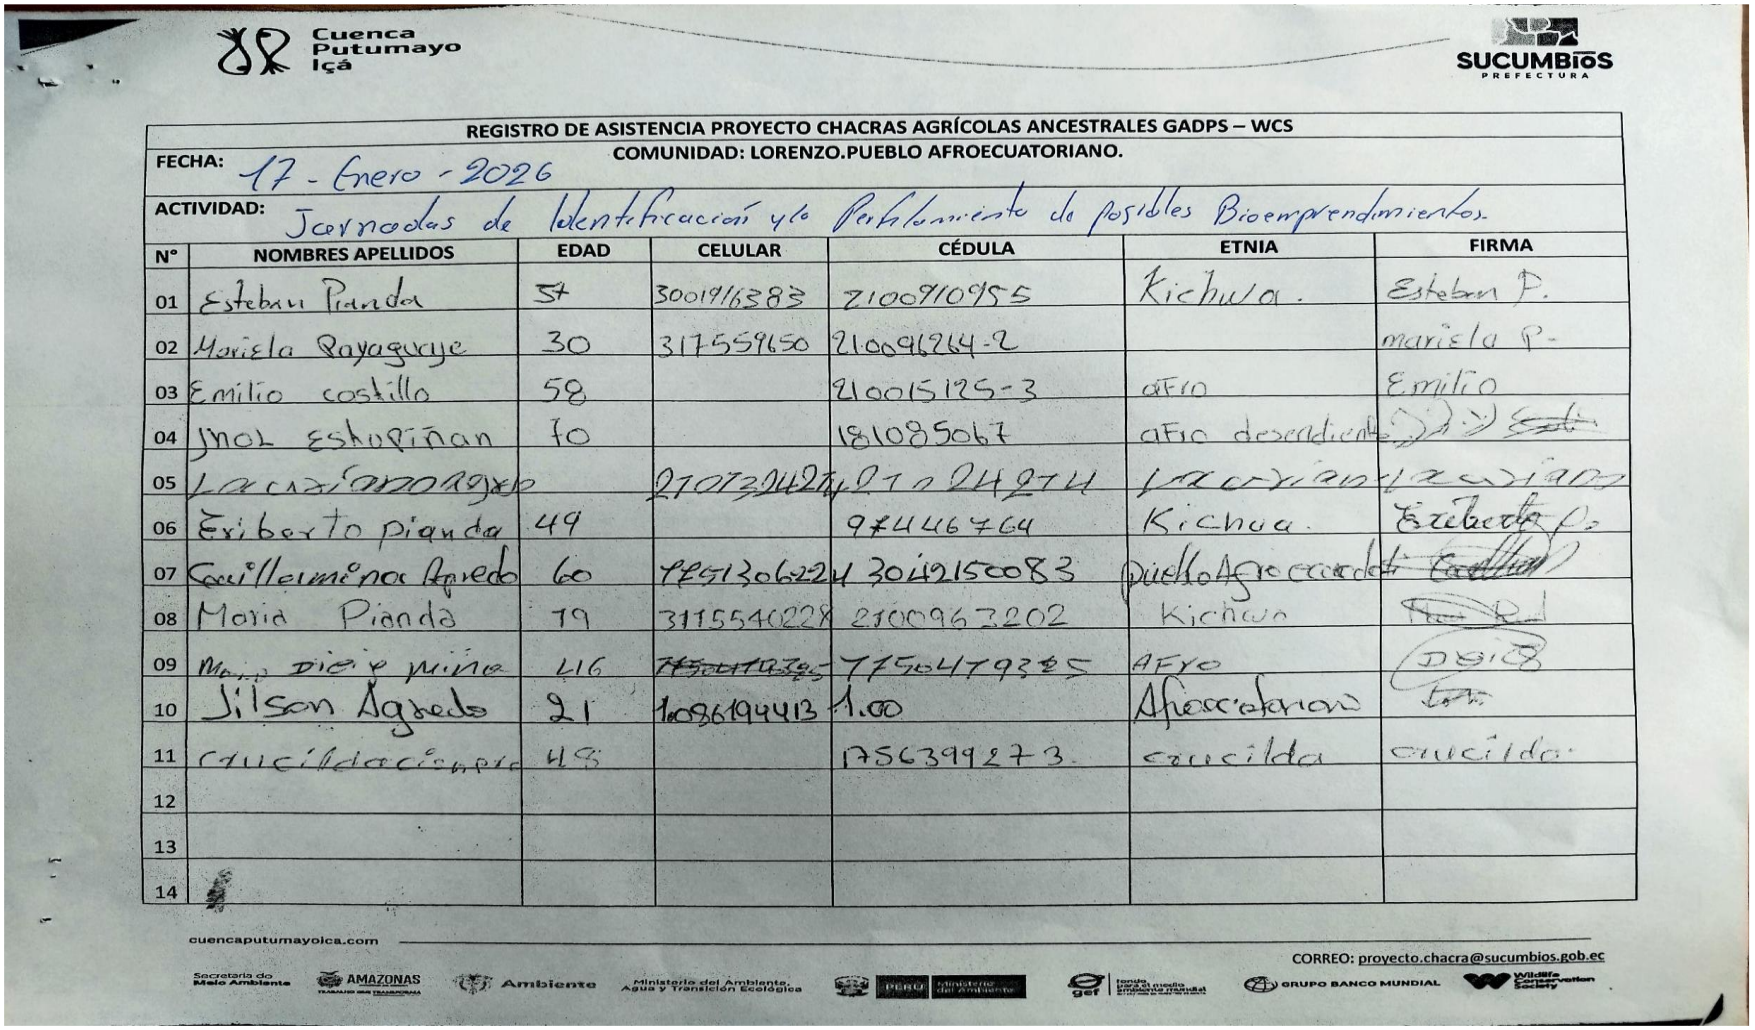

Cuenca Putumayo Içá

SUCUMBIOS PREFECTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO CHACRAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES GADPS – WCS

COMUNIDAD: LORENZO.PUEBLO AFROECUATORIANO.

FECHA: 17 - Enero - 2026

ACTIVIDAD: Jornadas de Identificación y/o Perfilamiento de posibles Bioemprendimientos.


N°	NOMBRES APELLIDOS	EDAD	CELULAR	CÉDULA	ETNIA	FIRMA
01	Esteban Pianda	54	3001916383	2100910955	Kichwa.	Esteban P.
02	Mariela Payaguaye	30	317559650	2100961642		mariela P.
03	Emilio castillo	58		2100151253	afro	Emilio
04	jhol Estupiñan	10		181085067	afro descendiente	
05						
06	Eriberto pianda	49		9*446764	Kichua.	Eriberto P.
07	Guillermina Agredo	60	[illegible]	3042150083	pueblo Afroecuatoriano	
08	Maria Pianda	79	3115540228	2100963202	Kichwa	
09	[illegible]	46	[illegible]	1750479325	AFro	
10	Jilson Agredo	21	1096194413	1.00	Afroecuatoriano	
11	crucildaccampo	49		175639273.	crucilda	crucilda.
12						
13						
14						

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaría do Meio Ambiente · AMAZONAS TRABALHO QUE TRANSFORMA · Ambiente · Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica · PERÚ Ministerio del Ambiente · gef fondo para el medio ambiente mundial · GRUPO BANCO MUNDIAL · Wildlife Conservation Society

- **Anexo 3.4. Jornadas de identificación y PERFILAMIENTO DE BIOEMPRENDIMIENTOS dirigidos por el ISTEC (Comunidad: Sandy Yaku).**

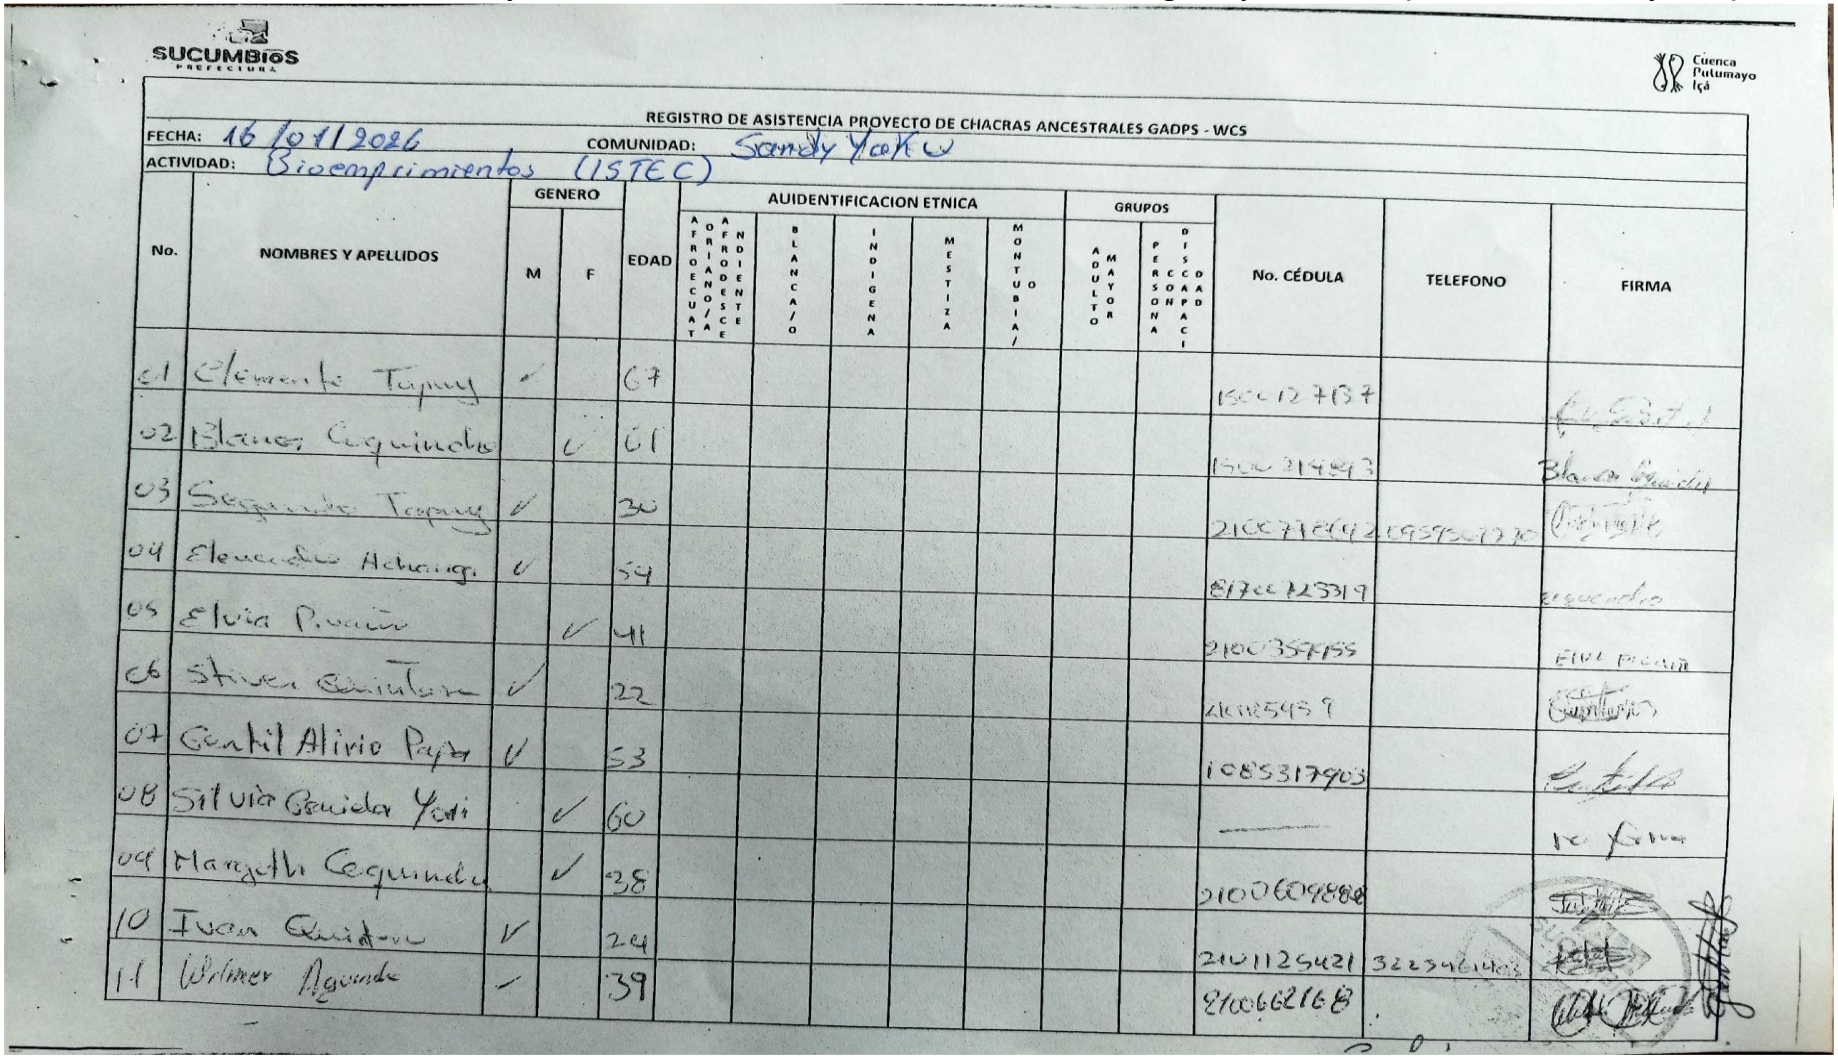


SUCUMBIOS PREFECTURA — Cuenca Putumayo Içá

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: 16/01/2026 COMUNIDAD: Sandy Yaku

ACTIVIDAD: Bioemprimientos (ISTEC)

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO M	GENERO F	EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA: AFROECUATORIANO/A	AFRODESCENDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	GRUPOS: ADULTO MAYOR	PERSONA CON DISCAPACIDAD	No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
01	Clemente Tapuy	✓		67									15cc127137		
02	Blanca Cequinda		✓	61									15cc214593		
03	Segundo Tapuy	✓		30									21cc7[illegible]	[illegible]	
04	Eleuterio Achunga	✓		54									21cc123319		
05	Elvia Piaguaje		✓	41									2100[illegible]		
06	Steven Cerda	✓		22									2[illegible]		
07	Genkil Alivio Paya	✓		53									1085317903		
08	Silvia Cerda Yaki		✓	60									———		
09	Margoth Cequinda		✓	38									2100[illegible]		
10	Juan Cerda	✓		24									2[illegible]	[illegible]	
11	Wilmer Aguinda	—		39									2100[illegible]		

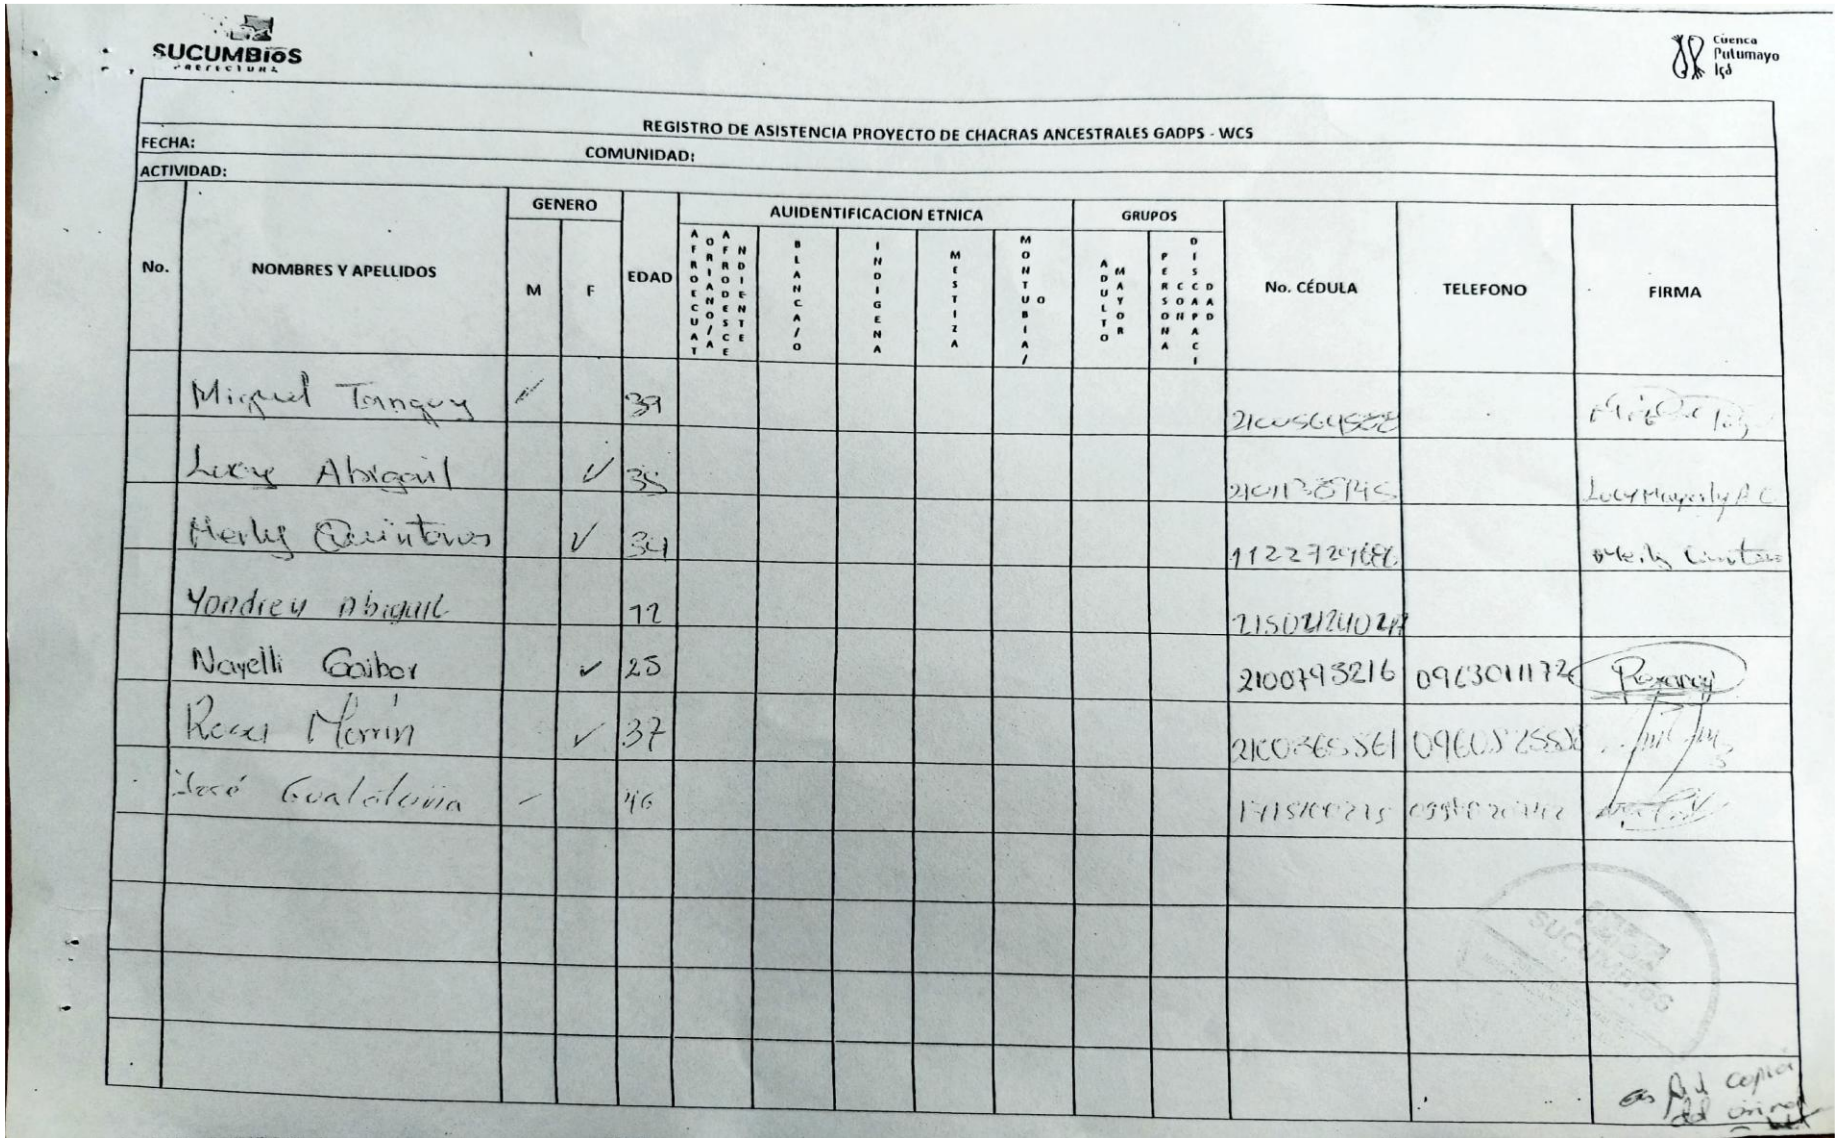

SUCUMBIOS PREFECTURA

Cuenca Putumayo Içá


REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: COMUNIDAD:

ACTIVIDAD:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA					GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO/A	AFRODESCENDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA CON DISCAPACIDAD			
	Miguel Tanguy	✓		39								21[illegible]		
	Lucy Abigail		✓	35								2101[illegible]		
	Merly Quintero		✓	34								1122[illegible]		
	Yondrey Abigail			12								2150[illegible]		
	Nayelli Gaibor		✓	25								2100793216	0973011726	
	Rosa Morin		✓	37								2100[illegible]	0960[illegible]	
	José Gualotuña	✓		46								1715[illegible]	0996[illegible]	

- **Anexo 3.5. Taller de capacitación de BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS (BPA) (Comunidad: Sandy Yaku).**

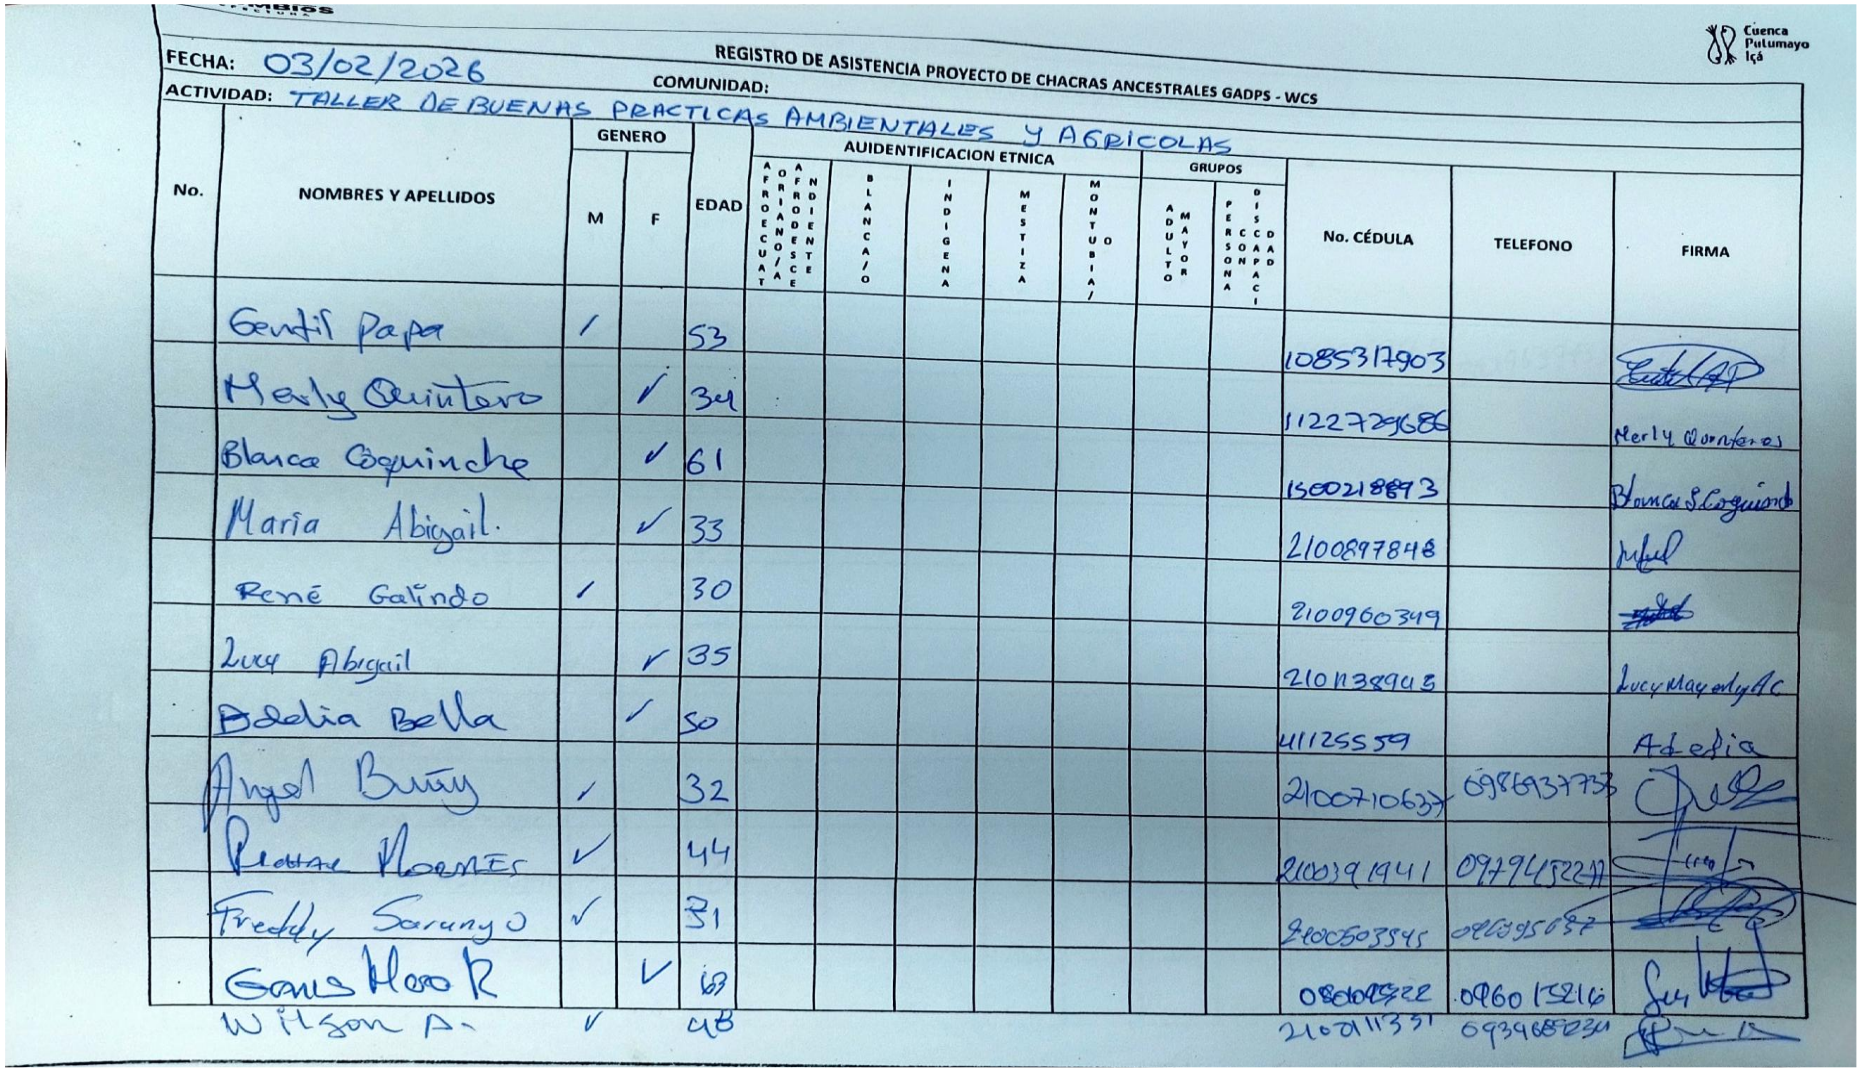

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: 03/02/2026 COMUNIDAD:

ACTIVIDAD: TALLER DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y AGRICOLAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA					GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO/A AFRODESCENDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA DISCAPACIDAD			
	Gentil Papa	/		53								1085317903		
	Merly Quintero		/	34								1122729686		Merly Quinteros
	Blanca Coquinche		/	61								1500218893		Blanca S. Coquinch
	María Abigail.		/	33								2100897848		
	René Galindo	/		30								2100960349		
	Lucy Abigail		/	35								2100388405		Lucy Mayorly AC
	Adelia Bella		/	50								41125559		Adelia
	Angel Bunay	/		32								2100710637	0986937733	
	[illegible]	/		44								2100391941	0979452211	
	Freddy Saruyo	/		31								2100503545	0962995087	
	[illegible]		/	69								[illegible]	0960152116	
	Wilson A.	/		48								2100211351	0939685234	

- **Taller de capacitación de BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS (BPA) (Comunidad: San José de Wisuya).**

SUCUMBIOS PREFECTURA — Cuenca Putumayo Içá

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: 05/02/2026 COMUNIDAD: San José de Wisuya

ACTIVIDAD: Taller de Buenas Prácticas Ambientales y Buenas Prácticas Agricolas.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA					GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO/A AFRODESCE NDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA DISCAPACIDAD			
1	Cecilia Chinchay		X	54			X					1757283005	3125315434	Cecilia chinchay
	Dayo Wuffa Hierida	X		55			X					1504465447		
	Abelino Jipa	X		62			X					1500219428	1)3227317735	
	Gustavo Aguinda	X		45			X					2400246905	0208770826	
	Jose Santos	X		41			X					97448339	3133157159	
	Rocirs Piagoaje		X	41			X					2100604405		Rocirs Piagoaje
	Alvaro Tandroy	X		43			X					18.195.394	3138195909	Alvaro Tandroy
	Kevin Piagoaje	X		28			X					1.784.864.847	3278996675	
	Olga Garrica		X	43			X					27191228		
	Yosid Piaguaje	X		44			X					18185629	3114676478	
	Hani Piaguaje	X		29			X					2100838854	3102436772	

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Financiado por: gef fondo para el medio ambiente mundial — Implementado por: GRUPO BANCO MUNDIAL — Ejecutado por: Wildlife Conservation Society

Secretaria do Meio Ambiente · AMAZONAS TRABALHO QUE TRANSFORMA · Ambiente · Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica · PERÚ Ministerio del Ambiente

- **Taller de capacitación de BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS (BPA) (Comunidad: Chandia Na´en).**

SUCUMBÍOS PREFECTURA — CORPO SUCUMBÍOS

RESPONSABLE: Angel Buñay

REGISTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN FINCA DE LOS AGRICULTORES N°_____

Nº	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN/SECTOR	CÉDULA	TELÉFONO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FIRMA	COORDENADAS (UTM-WGS84)
1	09-02-26	Wilmer Queta	ChandiaNa'en	2100834304			Wilmer queta	X: Y: Z:
2	09-02-26	Norelda Criollo	chandianaen	2101264468			Norelda	X: Y: Z:
3	09-02-26	Nelson Queta	ChandiaNa'en	2100877212-2			Nelson	X: Y: Z:
4	09-02-26	camila Alvarado	Chandia Na'en	2150308771-5			camila	X: Y: Z:
5	09-02-26	María Alvarado	chandia Na'en	2100731-2				X: Y: Z:
6	09-02-26	Heriberta Alvarado	Chandianaen	2100000088				X: Y: Z:
7	09-02-26	Moises Alvarado	chandiaNa'en	2100872406				X: Y: Z:
8	09-02-26	Silverio Descanse	chandiana en	2100000690			Silverio	X: Y: Z:
9	09-02-26	Cristian Descanse	chandiaNa'en	2101097166				X: Y: Z:
10	09-02-26	Luis Descanse	ChandiaNa'en	2100559150				X: Y: Z:

FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA SUPERVISOR DE LA UNIDAD AGRÍCOLA FORESTAL

SUCUMBÍOS PREFECTURA — CORPO SUCUMBÍOS

RESPONSABLE: Angel Bañay

REGISTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN FINCA DE LOS AGRICULTORES N°_____

Nº	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN/SECTOR	CÉDULA	TELÉFONO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FIRMA	COORDENADAS (UTM-WGS84)
1	09-02-26	Lisbeth Grefa	Chandia Naen	220030088-3				X: Y: Z:
2	09-02-26	Nataly Descanse	Chandia Naen	2100847948			Nataly	X: Y: Z:
3	09-02-26	Descanse Reynaldo	Chandia Naen	2100018486				X: Y: Z:
4	09-02-26	Lucitante Daniela	Chandia Na'en	210127819-1			Angela L.	X: Y: Z:
5	09-02-26	Quieta Angelica	Chandia Na'en	2100492265				X: Y: Z:
6	09-02-26	Descanse Yolanda	Chandia Na'en	210019103-6			Yolanda	X: Y: Z:
7	09-02-26	Bayron Descanse	Chandia Na'en	2100096034				X: Y: Z:
8	09-02-26	Maria Alvarado	Chandia Naen	2100447312				X: Y: Z:
9								X: Y: Z:
10								X: Y: Z:

FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA SUPERVISOR DE LA UNIDAD AGRÍCOLA FORESTAL

- **Taller de capacitación de BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS (BPA) (Comunidad: Lorenzó).**

SUCUMBÍOS PREFECTURA — CORPO SUCUMBÍOS

FECHA: 04 - Febrero - 2026 REGISTRO N°.

LUGAR: Comunidad o Pueblo Afroecuatoriano "Lorenzó"

RESPONSABLE: Ángel Boñay

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Taller de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓ/SECTOR	NUMERO DE CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Wilson Aguinda	GADPS	2100111331	0939689234	
2	eriberto pianda.	Lorenzo	97446764		Eriberto P.
3	Esteban Pianda	Lorenzo	2100910955	3001986383	Esteban P.
4	Emilio Castillo	Lorenzo	2100151253		Emilio C.
5	Jony Estupiñan	Lorenzo	1810856 7		Jony Estupiñan
6	Freddy Saranga	Consultor	2100503545	0968956371	
7	Goes Hoo R	GADPS	080109333-2	0960162162	
8	Doctora Morales	GADPS	2100391941	0979452241	
9	Guillermina Agredo	Lorenzo	1751306224	3044215083	
10					

FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA DEL SUPERVISOR DE LA UNIDAD

ANEXO 4: ACTAS DE SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN COMUNITARIA (SEPTIEMBRE 2025)

En septiembre de 2025 se desarrolló el proceso de socialización y validación comunitaria del subproyecto en las cuatro comunidades beneficiarias. Durante estos espacios se presentó el alcance técnico del proyecto, se validó su implementación en territorio y se procedió a la elección participativa de los promotores comunitarios.

Se adjuntan las actas y registros de asistencia correspondientes.

- **Comunidad Kichwa: Sandy Yaku**

SANDIYACU

ACTA No 01

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL PROYECTO DE CHACRAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES WCS – GADPS – COMUNIDAD SANDIYACU

A los tres días del mes de septiembre del año dos mil veinte y cinco, se reúnen los moradores de la comunidad Sandiyacu con la presencia del equipo técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos en sesión ordinaria, en la sede de la comunidad casa comunal ubicado en la parroquia puerto el Carmen del cantón Putumayo.

La presente asamblea tiene la finalidad de realizar la socialización del proyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agricola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el sistema agroforestal en las Comunidades: Lórenzo, San Josè de Wisuya, Sandiyacu, Chandia Na'en" y al mismo tiempo nombrar un promotor comunitario para que sea quien apoye en coordinar todas las actividades que realizará el proyecto en la comunidad Sandiyacu.

Se elabora el orden del día y queda de la siguiente manera:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la asamblea a cargo del presidente
3. Participación del equipo técnico de la Prefectura de Sucumbíos y socialización del proyecto a desarrollar en la comunidad
4. Elección y posesión del promotor comunitario para la coordinación de las actividades del proyecto.
5. Asuntos varios
6. Clausura

Desarrollo de la asamblea:

1. **Constatación del quórum.-** Se constata la asistencia de los socios a través de un registro de firmas y habiendo 14 asistentes de 15 se prosigue a dar inicio a la asamblea general ordinaria.

2. **Instalación de la asamblea a cargo del presidente** José Tapuy .- Siendo las 09:30 AM del día miércoles 3 de septiembre del año 2025, después de haber el quórum reglamentario, da por instalado la asamblea y solicita al secretario continuar con el siguiente punto del orden del día.

3. **Participación del equipo técnico de la Prefectura de Sucumbíos y socialización del proyecto a desarrollar en la comunidad.** – En este punto se presenta la delegación del GADPS y el Ing. Ismael Silva delegado del coordinador del Proyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el sistema agroforestal en las Comunidades: Lórenzo, San Josè de Wisuya, Sandiyacu, Chandia Na'en" hace la socialización de como se va a trabajar en esta comunidad en la instalación de 15

SANDIYACU

chacras ancestrales considerando las costumbres de la nacionalidad Kichwa los miembros de las comunidad hacen preguntas las mismas que son contestadas a satisfacción.

4. **Elección y posesión del promotor comunitario para la coordinación de las actividades del proyecto**. – Después que el equipo técnico del GADPS realizó una explicación la comunidad elige una terna, para designar al promotor comunitario.

Sr. Wilmer Aguinda
Sr. Segundo Tapuy
Sr. Lucy Abigail

Por votación unánime queda designado el SR. Wilmer Aguinda Como **promotor comunitario**

5. **Asuntos varios: en** entes punto no hay temas a tratar: se a proceder a continuar al siguiente punto

6. **Clausura.** El Sr. presidente de la comunidad Sandiyacu José Tapuy Siendo las 11:23AM da por clausurada la asamblea

Firman:

Sr.
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD SANDIYACU
Cédula: 210062173-5

Sr,
SECRETARIO
Cédula: 210112542-1

SUCUMBIOS PREFECTURA

Cuenca Putumayo Içá

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: 03/09/2025 COMUNIDAD: Sandi yaku

ACTIVIDAD: Socialización del Proyecto de chacras Agrícolas Ancestrales y elección del promotor Comunitario

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA					GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO/A AFRODESCENDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA CON DISCAPACIDAD			
01	Carmen Tapuy		x	38			✓					2100376157	0988259414	Carmen
02	Segund Tapuy	✓		30			✓					2100778642	0969507710	
03	Rene Galindo	✓		30			✓					2100960349	—	
04	Eleucadio Achapa	✓		54			✓					0170723319	—	Eleucadio
05	Dalila Sanjuan		✓	42			✓					6907.033	—	No Firma
06	Leonel Papa	✓		56			✓					97446771	—	Leonel Papa
07	Clemente Tapuy	✓		66			✓					1500127137	—	
08	Stiven Quinteros	✓		22			✓					2101125439	—	
09	Wilmer Aguinda	✓		39			✓					2100668768	—	
* 10	Jose tapuy	✓		38			✓					2100621735	0961452106	
11	Florinda Noa		✓	63			✓					2736078	—	Florinda Noa

cuel

SUCUMBÍOS PREFECTURA

Cuenca Putumayo Içá

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: 03/09/2025 COMUNIDAD: Sandia Yaku

ACTIVIDAD: Socialización del proyecto de chacras Agrícolas Ancestrales y eleccion del promotor Comunitario

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA					GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO/A	AFRODESCENDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA CON DISCAPACIDAD			
12	Luis Galindo	✓		66				✓				97448500	—	
13	Maria Abigail.		✓	31				✓				2100897848	—	
14	Gentil Alirio Paya	✓		52				✓				1085317903	—	
15	Silvia Yori		✓	58				✓				No tiene	—	No Firma
16	Jadith Coquinche		✓	38				✓				2100609688	—	
17	Lucia Abigail		✓	35				✓				2101138945	—	
18	Adelia Bella		✓	49				✓				41125559	—	Adelia
19	Merly Quinteros		✓	33				✓				1129729686	—	Merly Quinteros
20	Stiven Quinteros	✓		22				✓				2101185439	—	
21	Ivan Quinteros	✓		24				-				2101129421	3223461465	
22	Miguel Tangoy	-		38				-				2100801588	—	

SUCUMBIOS PREFECTURA

Cuenca Putumayo Içá

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: 03/09/2025 COMUNIDAD: Sandi Yaku

ACTIVIDAD: Socialización del Proyecto de chacras Agrícolas Ancestrales y elección del promotor Comunitario

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA					GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO/A	AFRODESCENDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA CON DISCAPACIDAD			
23	Blanca Coquinche		✓	60				✓					150021489-3	———	Blanca Coquinche

- **Comunidad o Pueblo Afroecuatoriano: Lorenzó**

LORENZÓ

ACTA No 02

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL PROYECTO DE CHACRAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES WCS – GADPS – COMUNIDAD LORENZÓ

A los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil veinte y cinco, se reúnen los moradores de la comunidad Lorenzó con la presencia del equipo técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos en sesión ordinaria, en la sede de la comunidad casa comunal ubicado en la parroquia puerto el Carmen del cantón Putumayo.

La presente asamblea tiene la finalidad de realizar la socialización del proyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agricola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el sistema agroforestal en las Comunidades: Lorenzó, San Josè de Wisuya, Sandiyacu, Chandia Na'en" y al mismo tiempo nombrar un promotor comunitario para que sea quien apoye en coordinar todas las actividades que realizará el proyecto en la comunidad Lorenzó

Se elabora el orden del día y queda de la siguiente manera:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la asamblea a cargo del presidente
3. Participación del equipo técnico de la Prefectura de Sucumbíos y socialización del proyecto a desarrollar en la comunidad
4. Elección y posesión del promotor comunitario para la coordinación de las actividades del proyecto.
5. Asuntos varios
6. Clausura

Desarrollo de la asamblea:

1. **Constatación del quórum.** - Se constata la asistencia de los socios a través de un registro de firmas y habiendo 14 asistentes de 15 se prosigue a dar inicio a la asamblea general ordinaria.

2. **Instalación de la asamblea a cargo del presidente** Guillermina Ayala. - Siendo las 09:00AM del día jueves 4 de septiembre del año 2025, después de haber el quórum reglamentario, da por instalado la asamblea y solicita al secretario continuar con el siguiente punto del orden del día.

3. **Participación del equipo técnico de la Prefectura de Sucumbíos y socialización del proyecto a desarrollar en la comunidad.** – En este punto se presenta la delegación del GADPS y el Ing. Ismael Silva, delegado del coordinador del Proyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agricola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el sistema agroforestal en las Comunidades: Lórenzo, San Josè de Wisuya, Sandiyacu, Chandia Na'en" hace la socialización de como se va a trabajar en esta comunidad en la instalación de 15 chacras ancestrales considerando las costumbres de la nacionalidad Afro

LORENZÓ

Ecuatorianos los miembros de las comunidad hacen preguntas las mismas que son contestadas a satisfacción.

4. **Elección y posesión del promotor comunitario para la coordinación de las actividades del proyecto**. – Después que el equipo técnico del GADPS realizó una explicación la comunidad elige una terna:

Sr. Mayra Mancilla

Sr. Raul Guevara

Sr. _____

Por decisión de votación unánime, se designa al SR. Mayra Mancilla
Como **promotor comunitario**

5. **Asuntos varios:** En este punto no hay temas a tratar, salvo que se desee incluir uno, caso contrario se procede a continuar al siguiente punto.

6. **Clausura.** Siendo las 12:00 PM el presidente da por terminada la asamblea.

Firman:

Sr.
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD LORENZÓ
Cédula: 1715130622 4.

Sr.
SECRETARIO
Cédula:
1750479325

SUCUMBÍOS PREFECTURA

Cuenca Putumayo Içá

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: 04/09/2025 COMUNIDAD: Lorenzo

ACTIVIDAD: Socializacion del proyecto de chacras Ancestrales y eleccion del Promotor Comunitario

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA					GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO/A	AFRODESCENDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA CON DISCAPACIDAD			
01	yair garcia valencia	✓		16	✓							———	3017096061	yair
02	Mayra Manilla Cisneros		✓	23	✓							2100922634	0961548586	
03	Noe Mina Cuero	✓		66	✓							98367274	———	No firma.
04	Carlos Minda	✓		28	✓							2101043202	30 ———	Carlos
05	DAVIZON VALENCIA	✓		39	✓							21010 4937	———	DAVIZON VALENCIA
06	mariela Rayaguaje		✓	29	✓							2100976264-2	3017559650	mariela R V
07	Lacrisario. Dejio X			175	✓							2101324214	———	Lacrisario
08	Raul Guevara	✓		56					✓			2100333465 2100333465	0962283048	
09	Esteban Pianda	✓		37				✓				2100910955	3001916383	Esteban P.
10	Eliberto Pianda	✓		49				✓				974446784	———	Elibertop.
11	Emilio Castillo	✓		58	✓							2100151253	———	Emilio

SUCUMBÍOS PREFECTURA

Cuenca Putumayo Içá

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: 04/09/2025 COMUNIDAD: Lorenzo

ACTIVIDAD: Socialización del proyecto de Chacras Agrícolas Ancestrales y eleccion del Promotor Comunitario

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA					GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO / AFRODESCENDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA CON DISCAPACIDAD			
12	Guillermina Agredo		✓	60	✓							1751306224	3042150083	
13	Yeiber García	✓						✓				—	—	No firma
14	María Deysi M.		✓	47	✓							1750419325	0980703875	
15	Flor Angela Pianda		✓					✓				2101142095	—	
16	Nilson Mancilla.	✓		48	✓							1756398622	3246134352	Nilson Mancilla.
17	Crucilda Cisneros.		✓	46	✓							1756399273	3246134352	Crucilda Cisneros

- **Comunidad Siona: San José de Wisuya**

SAN JOSÉ DE WISUYA

ACTA No 03

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL PROYECTO DE CHACRAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES WCS – GADPS – COMUNIDAD SAN JOSÉ DE WISUYA

A los cinco días del mes de septiembre del año dos mil veinte y cinco, se reúnen los moradores de la comunidad San José de Wisuya con la presencia del equipo técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos en sesión ordinaria, en la sede de la comunidad casa comunal ubicado en la parroquia Santa Elena del cantón Putumayo.

La presente asamblea tiene la finalidad de realizar la socialización del proyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agricola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el sistema agroforestal en las Comunidades: Lórenzo, San José de Wisuya, Sandiyacu, Chandia Na'en" y al mismo tiempo nombrar un promotor comunitario para que sea quien apoye en coordinar todas las actividades que realizará el proyecto en la comunidad San José de Wisuya.

Se elabora el orden del día y queda de la siguiente manera:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la asamblea a cargo del presidente
3. Participación del equipo técnico de la Prefectura de Sucumbíos y socialización del proyecto a desarrollar en la comunidad
4. Elección y posesión del promotor comunitario para la coordinación de las actividades del proyecto.
5. Asuntos varios
6. Clausura

Desarrollo de la asamblea:

1. **Constatación del quórum.** - Se constata la asistencia de los socios a través de un registro de firmas y habiendo 20 asistentes de 35, se prosigue a dar inicio a la asamblea general ordinaria.

2. **Instalación de la asamblea a cargo del presidente** Jorge Jiménez. - Siendo las 10:30 del día viernes 5 de septiembre del año 2025, después de haber el quórum reglamentario, da por instalado la asamblea y solicita al secretario continuar con el siguiente punto del orden del día.

3. **Participación del equipo técnico de la Prefectura de Sucumbíos y socialización del proyecto a desarrollar en la comunidad.** – En este punto se presenta la delegación del GADPS y el Ing. Ismael Silva, delegado del coordinador del Proyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agricola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el sistema agroforestal en las Comunidades: Lórenzo, San Josè de Wisuya, Sandiyacu, Chandia Na'en" hace la socialización de cómo se va a trabajar en esta comunidad en la instalación de 15

SAN JOSÉ DE WISUYA

chacras ancestrales considerando las costumbres de la nacionalidad Siona, los miembros de las comunidades hacen preguntas las mismas que son contestadas a satisfacción.

4. **Elección y posesión del promotor comunitario para la coordinación de las actividades del proyecto.** – Después que el equipo técnico del GADPS realizó una explicación la comunidad elige una terna:

Sr. Rocirs Piaguaje

Sr. Marcelo Solano

Sr. Jorge Jiménez

Sr. Osman Piaguaje

Sr. Hans Piaguaje

Por decisión de votación unánime, se designa al SR/A. Rocirs Piaguaje Como **promotor comunitario**

5. **Asuntos varios:** En este punto no hay temas a tratar, salvo que se desee incluir uno, caso contrario se procede a continuar al siguiente punto.

6. **Clausura.** Siendo las 12:30 el presidente da por terminada la asamblea.

Firman:

Sr. Jorge Jimenez
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD SAN JOSÉ DE WISUYA
Cedula: 2100932478-5

Davil Hons P.
Sr.
SECRETARIO
Cédula: 2100 83 3834

- **Anexo 4.3. Renuncia de la Promotora de la Comunidad Siona: San José de Wisuya.**

San José de Wisuyá, 29 de octubre del 2025

Señor:

DARWIN RUBEN RODRIGUEZ

Presidente y demás Integrantes de la Directiva de Gobierno Comunidad Siona Kichwa - San José de Wisuyá

Parroquia de Santa Helena, Provincia de Sucumbíos, Cantón Putumayo.

Asunto: **RENUNCIA**

Reciban un cordial saludo, con el objetivo de la referencia, **Miraida Rosiris Piaguaje Otavalo**, Identificada con cedula No.2100440-0 Por intermedio de la presente comunico a ustedes mi renuncia voluntaria, al cargo que la comunidad me designo como promotora dentro del Proyecto de Chagras Ancestrales a ejecutarse en la comunidad San José de Wisuyá, presento la renuncia a mi comunidad, comunicándoles que aún no he firmado contrato legalmente con la entidad de gobierno contratante, por lo tanto es pertinente y urgente que la comunidad designe a otra persona que pueda atender la vacante con disponibilidad total para ejercer el cargo.

Agradeciendo el haber depositado la confianza en mí, le comunico que los motivos de mi renuncia se deben a la falta de disponibilidad de tiempo completo para ejercer el cargo en el periodo de tiempo que se requiere.

Atentamente

Rosiris Piaguaje

MIRAIDA ROSIRIS PIAGUAJE OTAVALO

Cedula No. 210060440-0

- **Eleccion del nuevo Promotor Comunitario para la comunidad San José de Wosuya.**

REPUBLICA DEL ECUADOR
PROVINCIA DE SUCUMBIOS CANTO PUTUMAYO
PARROQUIA SANTA ELENA
COMUNIDAD SIONA KICHWA SAN JOSE DE WISUYA
RESOLUCION N° SNGP-SPI-DFTS-2019-0153

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	
COMUNIDADR SIONA KICHWA SAN JOSE DE WISUYA	Acta No 4
CITADA POR: CONSEJO DE GOBIERNO	**Fecha:** 30-10-2025
PRESIDENTE: DARWIN RODRIGUEZ	**Hora inicio:** 9 AM Fin**:** 10:30 AM
Secretario: DARIL HANS PIAGUAJE	**Lugar:** SAN JOSE DE WISUYA

AGENDA	
1	Constatación del quórum
2	Puesta en marcha de la asamblea
3	Elección y posesión del promotor comunitario para coordinación de las actividades del proyecto.
4	clausura
5	
6	

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Se lleva a cabo la asamblea general con la presencia de moradores de la comunidad y consejo de gobierno. con el objetivo de elegir y nombrar por la comunidad un nuevo promotor comunitario que nos ayude a continuar con el proyecto "fortalecimiento a la conservación de las chagras agrícolas ancestrales WCS-GADPS- comunidad san José de Wisuya".

1. Constatación del quórum. Se constata la asistencia de los socios a través de un registro de firmas y habiendo 20 asistencias de 35 se prosigue a dar inicio a la asamblea general ordinaria.
2. Puesta en marcha de la asamblea a cargo del presidente DARWIN RODRIGUEZ. Siendo las 9:00 am del día jueves 30 de octubre 2025, después de haber quorum reglamentario da por instalada la asamblea y solicita al secretario continuar con el orden del día.
3. Elección y posesión del nuevo promotor comunitario para coordinación de las actividades del proyecto. Después que la comunidad y el consejo de gobierno asentaran puntos de responsabilidad y compromisos para el nuevo promotor comunitario. evalúan positivamente al secretario de la comunidad por el buen orden y trabajo que ha venido desarrollando, se toma la decisión para que el SR. DARIL HANS PIAGUAJE CON CEDULA. 2100838834 queda como **promotor comunitario.**
4. Clausura. Siendo las 10 y 30 am el presidente da por terminada la asamblea.

Consejo de Gobierno

Darwin Rodriguez
CC: 1708069107
Presidente

Daril Piaguaje
CC: 210083883-4
secretario

Cuenca Putumayo Içá

SUCUMBÍOS PREFECTURA

SUCUMBÍOS PREFECTURA

Cuenca Putumayo Içá

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: 05/09/2025 COMUNIDAD: San José de Wisuya

ACTIVIDAD: Socialización del proyecto "Fortalecimiento a la conservación de Chacras Agricolas Ancestrales y Silvestres Tra...

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA						GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO/A	AFRODESCENDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA CON DISCAPACIDAD			
01	Dandelo Peña	X		58									17641086	3124614	
02	Enei Piaguaje	X		57				X	X				2100178274	5144327037	
03	Roberto Maniguaje	X		67				X					2100176912		
04	Mayra Mancera		X	26					X				2008938?	0997106824	
05	María Elvira		X	50									———	690287?? Elvira	
06	Maria Colva			42					X				1900464924	———	
07	Jorge Jimenez	X		40					X				2?00?3?78-5	———	Jorge Jimenez
08	Daril Hans Piaguaje	X		28				X					2100838834	3?0?036???	
09	Rocirs Piaguaje		F	40				X					2100604400	———	Rocirs Piaguaje
10	Cecilia Chindoy		X	53				X					175728300-5	3125315434	Cecilia Ch.
11	Nelson Cotacachi			61					X				1500219751	———	
12	Marcelo Trujillo			46					X				0919986??	———	

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

SUCUMBIOS PREFECTURA

Cuenca Putumayo Içá

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: 05/09/2025 COMUNIDAD: San José de Wisuyá

ACTIVIDAD: Socializacion del Proyecto de chacras Ancestrales y elección del promotor comunitario

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA					GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO/A AFRODESCE	NDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA CON DISCAPACIDAD			
13	Blanca Yaiguaje		X	55								1256307779	—	Blanca Yaiguaje
14	Sandra Milena Jipa		X	40				X				2100347893	—	Sandra Milena Jipa
15	Avelino Jipa	X		61				X				1500279822	—	Avelino Jipa
16	Susana Otavalo		X	75				X				2100158548	—	Susana Otavalo
17	Martina E Machado			56								1756347029	—	Martina Machado
18	Osman Piaguaje O.			36				X				2100188555-5	—	Osman Piaguaje
19	Luis Silva	X		26								2150356182	—	Luis Silva
20	Elvia Piaguaje		X	66				X				26637523	—	Elvia Piaguaje
21	Rosaura Piaguaje			58				X				69.015-627	—	Rosaura Piaguaje
22	Karina Vanesa			26				X				—	—	Karina Vanesa
23	ASTRID JULIANA PIAGUAJE.G		X	30				X				2100838859	—	ASTRID JULIANA P. G
24	Darwin Rodriguez	X		57				X				1708069107	—	

- **Comunidad Cofán: Chandia Naen**

COMUNIDAD COFAN CHANDIA NA'EN
ACUERDO MINISTERIAL 06277
chandianaen@gmail.com / 0991146152
SUCUMBIOS - CASCALES - TARUKA - ETSA - CHANDIA NA'EN

ACTA N. 001

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL PROYECTO DE CHACRAS AGRICOLAS ANCESTRALES WCS-GADPS-COMUNIDAD COFAN CHANDIA NA'EN.

A los cinco días del mes de septiembre del año dos mil veinte cinco, se reúnen los moradores de la comunidad Cofán Chandia Na'en con la presencia del equipo técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, en sesión ordinaria, en la sede de la comunidad casa comunal ubicado en la parroquia El Dorado de Cascales del cantón Cascales.

La presente asamblea tiene como finalidad de realizar la socialización del proyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano, mediante el sistema agroforestal en las comunidades; Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu, Chandia Na'en y al mismo tiempo nombrar un promotor comunitario para que sea quien apoye en coordinar todas las actividades que realizará el proyecto en la comunidad Cofán Chandia Na'en.

Se elabora el orden del día y queda de la siguiente manera:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la asamblea a cargo del presidente Lic. Carlos Descanse
3. Palabras del Lic. Juan Cerda-Director de Nacionalidades y Pueblo Afro-ecuatoriano, en representación del sr. Prefecto de Sucumbíos
4. Socialización del proyecto a desarrollar en la comunidad, a cargo de la Ing. Maribel Castro y Tec. Armando Yumbo – Técnico de GADPS.
5. Elección y posesión del promotor comunitario para la coordinación de las actividades del proyecto.
6. Asuntos varios
7. Clausura

Desarrollo de la asamblea:

1. **Constatación del quórum.**
   Se constata la asistencia de los socios a través de un registro de firmas y habiendo 26 asistentes se prosigue a dar inicio a la asamblea general ordinaria.

COMUNIDAD COFAN CHANDIA NA'EN
ACUERDO MINISTERIAL 06277
chandianaen@gmail.com / 0991146152
SUCUMBIOS - CASCALES - TARUKA - ETSA - CHANDIA NA'EN

2. **Instalación de la asamblea a cargo del presidente.**
   El Lic. Carlos Descanse presidente de la Comunidad Cofán Chandia Na'en, siendo las 09:30 am del día viernes 5 de septiembre del año 2025, después de haber constatado el quórum reglamentario, se da por instalado la asamblea y solicita al secretario continuar con el siguiente punto de orden del día.

3. **Palabras del Lic. Juan Cerda-Director de Nacionalidades y Pueblo Afro-ecuatoriano, en representación del sr. Prefecto de Sucumbíos**
   En este punto se presenta la delegación del GADPS y el Lic Juan Cerda-Director de la Direccion de Nacionalidades y el Pueblo Afro-ecuatoriano, agradece la presencia de los habitantes del sector, y manifiesta el compromiso del señor Prefecto en apoyar y mejorar la calidad de vida de las Nacionalidades y Pueblo Afro-ecuatroriano, y menciona la importancia de cumplir con el proyecto y pide que se comprometa la comunidad en el cumplimiento del Proyecto de implementación de 15 chacras ancestrales, considerando las costumbres de la Nacionalidad Cofán.

4. **Socialización del proyecto a desarrollar en la comunidad, a cargo de la Ing. Maribel Castro y Tec. Armando Yumbo – Técnico de GADPS.**
   Los técnicos Ing. Maribel Castro-Especialista 3 y el Tec. Armando Yumbo-Analista 4, dan una explicación del objetivo del proyecto, actividades, finalidad del proyecto, tiempo de ejecución y familias beneficiarias; se expone mediante un video la temática del proyecto.

5. **Elección y posesión del promotor comunitario para la coordinación de las actividades del proyecto.**
   Después que el equipo técnico del GADPS realizó una explicación, la comunidad elige una terna para el promotor comunitario:

1. Sr. Bayron Descanse
2. Srta. Lisbeth Grefa
3. Srta. Rosely Descanse

Se procede a tomar votación quedando como resultado de la siguiente manera:

Sr. Bayron Descanse	15
Srta. Lisbeth Grefa	6
Srta. Rosely Descanse	5

Financiado por: gef fondo para el medio ambiente mundial

COMUNIDAD COFAN CHANDIA NA'EN

ACUERDO MINISTERIAL 06277

chandianaen@gmail.com / 0991146152

SUCUMBIOS - CASCALES - TARUKA - ETSA - CHANDIA NA'EN

Por votación queda el señor **BAYRON CLAUDINO DESCANSE QUIETA C.I 2101099634** seleccionado como promotor comunitario.

Se realiza la posesión a cargo del Lic. Juan Cerda; seguidamente se le concede la palabra al Promotor mismo que manifiesta su compromiso de colaborar y trabajar por la mejora de los habitantes de la comunidad Cofán Chandia Na'en.

6. **Asuntos varios.**

Toma la palabra el señor Reynaldo Descanse, menciona que la prioridad es también la construcción de la vía de acceso a la comunidad ya que les toca caminar 3 horas por un sendero cuando el rio está demasiado bajo, esto es un impedimento para que las autoridades y turistas lleguen a la comunidad. Al mismo tiempo agradece al señor Prefecto y al cooperante WCS por apoyarles en el proyecto de las chacras ancestrales.

Interviene la Señora Rocio Vargas-Secretaria de la comunidad, donde expresa el agradecimiento al Prefecto de Sucumbíos y a la WCS y manifiesta su compromiso de trabajar con el proyecto, un beneficio para las familias de este sector.

7. **Clausura.**

Siendo las 13:00 minutos, el presidente de la comunidad da por terminada la asamblea general.

Lic. Carlos Descanse
Presidente Chandia Na'en
C.I: 2100871991

Centro Cofán Chandia Na'en SUCUMBIOS

Sra. Rocio Vargas
Secretaria Chandia Na'en
C.I: 2101270656

Financiado por: gef fondo para el medio ambiente mundial

SUCUMBIOS PREFECTURA

Cuenca Putumayo Içá

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: COMUNIDAD:

ACTIVIDAD:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA					GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO/AFRODESCENDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA CON DISCAPACIDAD			
	Liliana Queta Alvarado		X	17			X					2101097299	—	Liliana
	Alicia Alvarado Descanse		X	61			X					2100000419		No firma
	Cristian Descanse Queta	X		25			X					2101097166		
	Yajaira Lucitante Descanse		X	19			X					2150377246		Yajaira
	Francisco Queta	X		31								2100834304		Wilmer queta
	Laddy Descanse		X	24			X					2101097774		Laddy
	Roberto Lucitante	X		27			X					2150370472		Bolivar
	Rocio Varga		X	17			X					2101270656		Jalvarado
	Rosella Descanse		X	21			X					2100871983		
	Angelica Queta		X	43			X					2100792265		
	Georgina Lucitant		X	66			X							No firma

Cuenca Putumayo Içá

SUCUMBIOS PREFECTURA

SUCUMBIOS PREFECTURA

Cuenca Putumayo Içá

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: COMUNIDAD:

ACTIVIDAD:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA					GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO/A AFRODESCENDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA CON DISCAPACIDAD			
	Rynaldo Descanse	X		48			X					2100018486	0996256674	
	Bayron Descanse	X		24			X					2101099634	0960909848	
	Nataly Descanse		X	23			X					2100877918	0979434773	Nataly
	Lisbeth Grefa		X	23			X					2200300883		
	Afanacio Descanse	X		44			X					2100047444		
	Luis Descanse	X		36			X					2100584150		
	Pablo Queta	X		37			X					2100557421		
	Robin Alvarado	X		22			X					2100872098		
	Gladi Descanse		X	50			X					2100159033		Gladys
	cami Alvarado			14			X							camila
	Moises Alvarado			21								2100872106		

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaria do Meio Ambiente · AMAZONAS Governo do Estado Trabalho que transforma · Ambiente · Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica · PERÚ Ministerio del Ambiente

Financiado por: gef fondo para el medio ambiente mundial

Implementado por: GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por: Wildlife Conservation Society

Cuenca Putumayo Içá

SUCUMBIOS PREFECTURA

SUCUMBIOS PREFECTURA

Cuenca Putumayo Içá

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCS

FECHA: COMUNIDAD:

ACTIVIDAD:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO		EDAD	AUIDENTIFICACION ETNICA					GRUPOS		No. CÉDULA	TELEFONO	FIRMA
		M	F		AFROECUATORIANO/A	AFRODESCENDIENTE	BLANCA/O	INDIGENA	MESTIZA	MONTUBIA/O	ADULTO MAYOR	PERSONA DISCAPACIDAD			
	Nelson QUETA	x		26				x					2100872722		
	Noreida Criollo		x	28				x					210126442-8		Noreida
	Wilmer Queta	x		31				x					2100834304		Wilmer queta
	Maria Alvarado		x	48				x					2100447312		

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaría do Meio Ambiente · AMAZONAS Governo do Estado Trabalho que Transforma · Ambiente · Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica · PERÚ Ministerio del Ambiente

Financiado por: gef fondo para el medio ambiente mundial

Implementado por: GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por: Wildlife Conservation Society

ANEXO 5: Registro fotográfico consolidado

- **Anexo 5.1. Georreferenciación de las chacras en la comunidad Kichwa Sandy Yaku.**



Foto 1. Entrega de las raciones alimenticias al presidente de la Comunidad Sandi Yaku (Sr. José Tapuy).



Foto 2. Entrega de 30 galones de gasolina y 6 litros de aceite (anterior foto) para el traslado vía fluvial.



Foto 3. Rumbo a la Comunidad Sandi Yaku



Foto 4. Explicaciones técnicas de la actividad a realizar y aclarando el uso y propósito de los alimentos entregados.



Foto 5. Caminando hacia las Chacras para la Toma de puntos GPS.



Foto 6. Con Beneficiarios de la comunidad recorriendo las chacras tomando los puntos GPS.

- **Anexo 5.2. Georreferenciación de las chacras en la Comunidad O Pueblo Afroecuatoriano: Lorenzó.**



Foto 7. Entrega de raciones alimenticias para el almuerzo de los días 27 y 28 de noviembre; se entrega a la Promotora Comunitaria Srta. Mayra Mancilla.



Foto 2. Entrega de 30 galones de Gasolina y 6 litros de aceite para ligar, destinados al transporte fluvial del equipo técnico a la comunidad Lorenzó.



Foto 3. Rumbo a la Comunidad de Lorenzó.



Foto 4. Toma de Puntos GPS, en compañía de algunos beneficiarios de la comunidad.



Foto 5. Socialización técnica de la actividad a realizar. Socialización de la georreferenciación, del kit de herramientas agrícolas, manejo responsable de la chacra ancestral, metodología de trabajo mediante mingas comunitarias y especies vegetales propuestas para la siembra. En la chacra del Sr. Esteban Pianda. Comunidad Lorenzó.

- **Anexo 5.3. Georreferenciación de las chacras en la Comunidad Siona: San José De Wisuya.**



Foto 1. Entrega de raciones alimenticias para la alimentación de dos días del equipo Técnico de los Comuneros que acompañan la actividad. Recibió el Promotor Comunitario, el Sr, Hans Daril Piaguaje.



Foto 2. Entrega de 15 galones de Gasolina y 3 litros de Aceite para ligar, al Promotor Comunitario, el Sr. Hans Daril Piaguaje.



Foto 3. Socialización de la georreferenciación, del kit de herramientas agrícolas, manejo responsable de la chacra ancestral, metodología de trabajo mediante mingas comunitarias y especies vegetales propuestas para la siembra. En la chacra del Sr. Alonso Aguinda. Comunidad San José de Wisuya.



Foto 4. Caminata por las Chacras en compañía del Técnico de Apoyo, el Sr. Ernesto Maniguaje.

- **Anexo 5.4. Georreferenciación de las chacras en la Comunidad Cofán: Chandia Na´En**



Foto 1. Entrega de las Raciones Alimenticias y el Combustible destinados para los dos (2) días de trabajo del equipo técnico y la comunidad. En compañía del Tnlg. Armando Yumbo, técnico de apoyo del subproyecto.



Foto 2. Rumbo a las Chacras para su Georreferenciación.



Foto 3. Junto al Sr. Silverio Descanse, unos de los beneficiarios del Subproyecto. Después de la georreferenciación de su chacra.



Foto 4. Socialización de la georreferenciación, del kit de herramientas agrícolas, manejo responsable de la chacra ancestral, metodología de trabajo mediante mingas comunitarias y especies vegetales propuestas para la siembra en la comunidad Chandia Na´en.

Anexo 5.5. Identificación y/o perfilamiento de los posibles bioemprendimientos que pueden darse en cada una de las comunidades. Comunidad Kichwa: Sandy Yaku



Foto 1. Traslado vía fluvial a la comunidad Sandy Yaku, con el equipo del GADPS y del ISTEC.



Foto 2. Identificación y/o perfilamiento de los posibles bioemprendimientos comunitarios.



Foto 3. Beneficiarios de la comunidad Sandy Yaku.

- **Anexo 5.6. Identificación y/o perfilamiento de los posibles bioemprendimientos que pueden darse en cada una de las comunidades. Comunidad Afroecuatoriano: Lorenzó**



Foto 1. Rumbo a la comunidad Lorenzó, vía fluvial.



Foto 2. Beneficiarios de la Comunidad Lorenzó.

- **Anexo 5.7. Identificación y/o perfilamiento de los posibles bioemprendimientos que pueden darse en cada una de las comunidades. Comunidad Siona: San José de Wisuya**



Foto 1. Jornada de Identificación de posibles Bioemprendimientos en la comunidad San José de Wisuya, por parte del ISTEC.



Foto 2. Almuerzo comunitario, después de la jornada de Identificación de posibles Bioemprendimientos.

- **Anexo 5.8. Identificación y/o perfilamiento de los posibles bioemprendimientos que pueden darse en cada una de las comunidades. Comunidad Cofán: Chandia Na´En**



Foto 1. Presentación del equipo del ISTEC, comunidad Cofán Chandia Na´en.



Foto 2. Identificación y/o Perfilamiento de los posibles Bioemprendimientos que pueden darse en la comunidad. Por parte del Ing. José Gualotuña, técnico del ISTEC.

- **Anexo 5.9. Taller de Buenas Prácticas Ambientales Y Agrícolas (BPA). Comunidad Kichwa: Sandy Yaku**



Foto 8. Rumbo a la Comunidad Sandy Yaku.



Foto 9. Desarrollo del taller de Buenas Prácticas Agrícolas, facilitado por el Ing. Ángel Buñay.



Foto 10. Desarrollo del taller de Buenas Prácticas Ambientales, facilitado por el Ing. Richard Morales



Foto 11. Beneficiarios de la comunidad Sandy Yaku, taller de BPA.

- **Anexo 5.10. Taller de Buenas Prácticas Ambientales Y Agrícolas (BPA). Comunidad Afroecuatoriana: Lorenzó**



Foto 1. Rumbo a la comunidad Lorenzó.



Foto 2. Desarrollo del taller de Buenas Prácticas Ambientales y Agrícolas (BPA), facilitado por el Ing. Richard Morales y el Ing. Ángel Buñay.



Foto 3. Beneficiarios de la comunidad Lorenzó, taller de BPA.

- **Anexo 5.11. Taller de Buenas Prácticas Ambientales Y Agrícolas (BPA). Comunidad Siona: San José De Wisuya**



Foto 1. Desarrollo del taller de Buenas Prácticas Ambientales (BPA), facilitado por el Ing. Richard Morales.



Foto 2. Desarrollo del taller de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), facilitado por el Ing. Ángel Buñay.

- **Anexo 5.12. Taller de Buenas Prácticas Ambientales Y Agrícolas (BPA). Comunidad Cofán: Chandia Na´En**



Foto 12. Rumbo a la Comunidad Chandia Na´en, Cantón Cascales.



Foto 2. Desarrollo del taller de Buenas Prácticas Ambientales y Agrícolas (BPA), facilitado por el Ing. Richard Morales y el Ing. Ángel Buñay.



Foto 3. Beneficiarios de comunidad Chandia Na´en.

- **Anexo 5.13. Taller de recolección y etiquetado de muestras de suelo por parte del equipo técnico del ISTEC.**



Foto 1. Personal que asistió a la capacitación de recolección y etiquetado de muestras de suelo, por parte del ISTEC.



Foto 2. Explicación teórica de la recolección de muestras de suelo.



Foto 3. Puesta en práctica de como recolectar y etiquetar muestras de suelo.

- **Anexo 5.14. Recepción y verificación técnica de equipos electrónicos: cámara fotográfica, proyector multimedia, GPS y estación de energía portátil.**



Foto 1. Recepción y verificación técnica de equipos electrónicos del subproyecto.



Foto 2. Recepción y asignación de custodia de equipos electrónicos del subproyecto (Ing. Ismael Silva).

- **Anexo 5.15. Capacitación sobre: Matriz de Riesgos; Informe de Cumplimiento MGAS y el Plan para Pueblos Indígenas (PPI).**

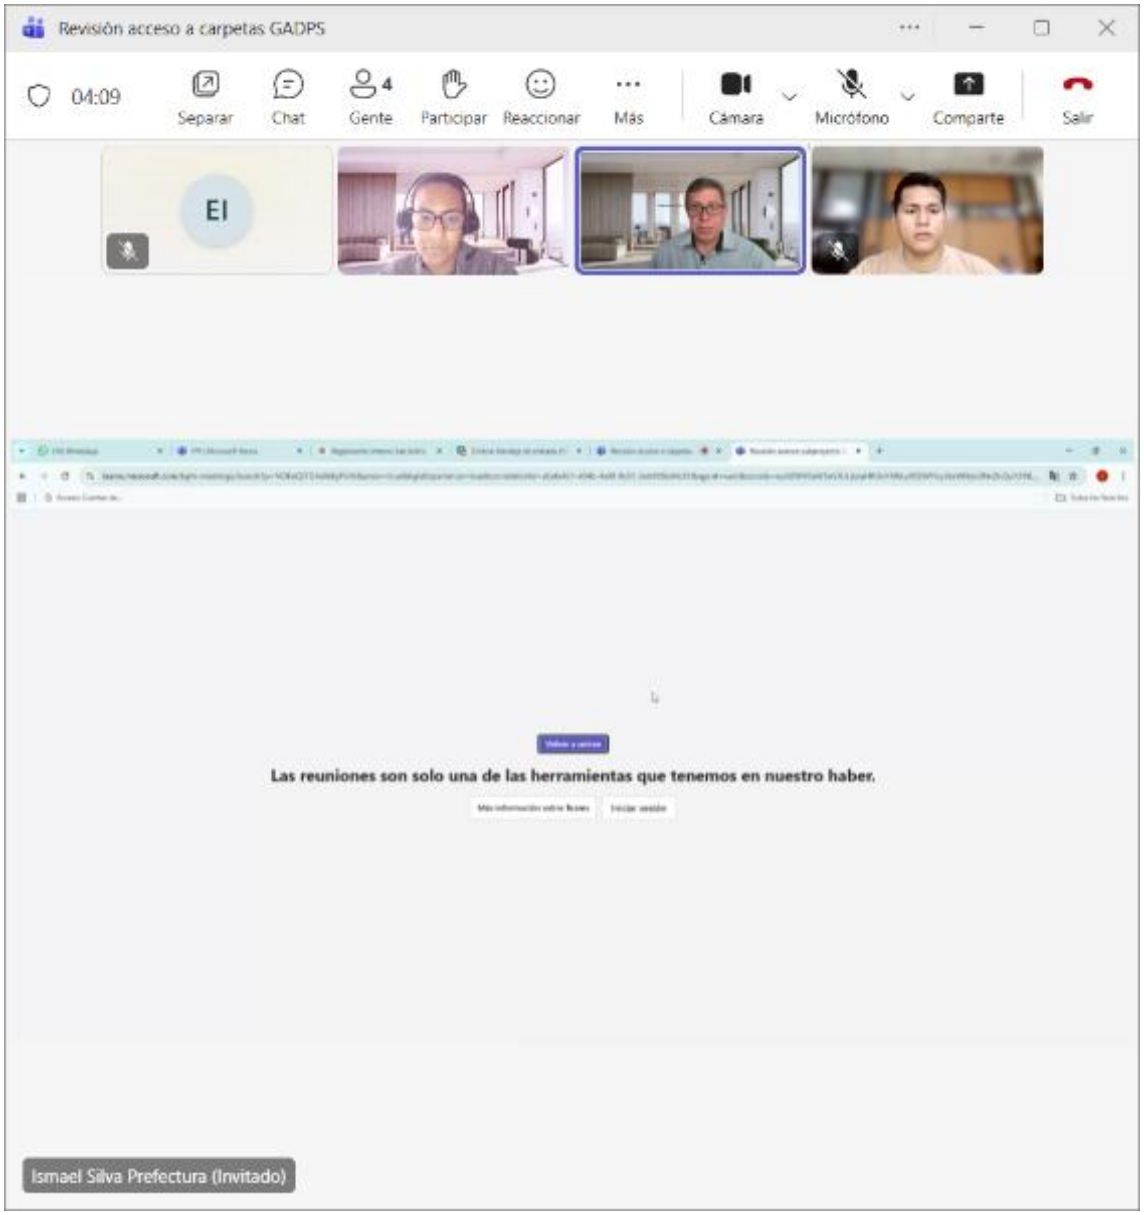


Imagen 1. Capacitación en el correcto llenado de la matriz de riesgos

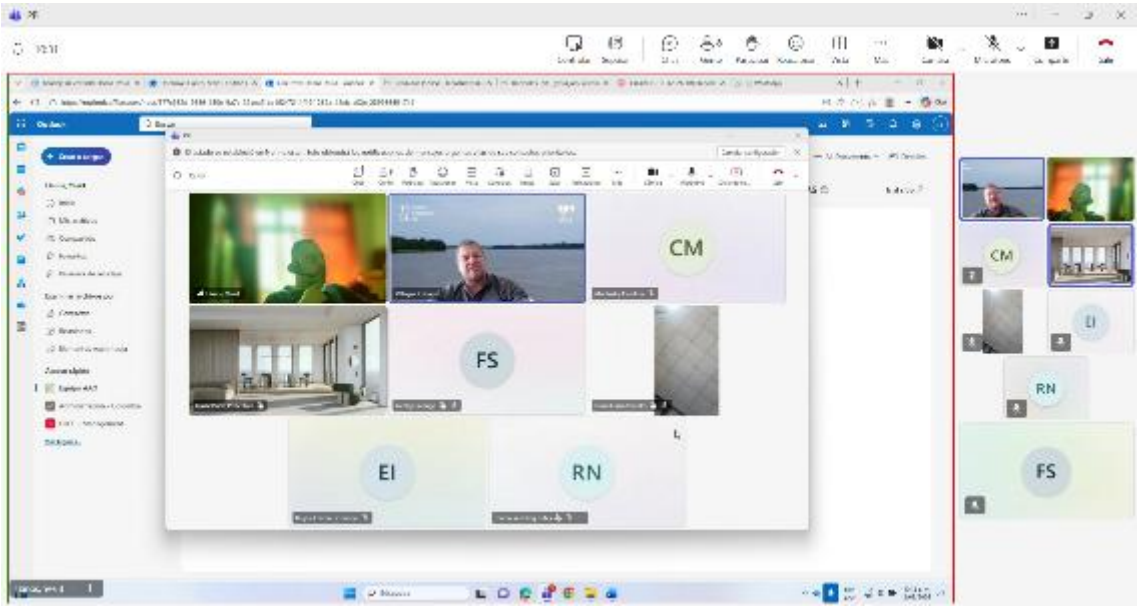


Imagen 2. Capacitación sobre la metodología de distribución y asignación presupuestal para el PPI.

ANEXO 6: Base Técnica Georreferenciada

- **Anexo 6.1. Coordenadas geográficas de las chacras pertenecientes a la COMUNIDAD SANDY YAKU.**

Tabla 5. Coordenadas de la chacra del Sra. Lucy Abigail.

Chacra 1. Lucy Abigail		
ID	Latitud	Longitud
1	0.0322015	-757246339
2	0.0315629	-757246811
3	0.031984259665194	-757259911
4	0.0325365	-757261123

Tabla 6. Coordenadas de la chacra del Sra. María Abigail.

Chacra 2. María Abigail		
ID	Latitud	Longitud
1	0.03059961	-757188647
2	0.0312806	-757187643
3	0.0313093	-757198264
4	0.03059436	-7572008409

Tabla 7. Coordenadas de la chacra del Sr. Wilmer Aguinda.

Chacra 3. Wilmer Aguinda		
ID	Latitud	Longitud
1	0.034269887	-75.694083281
2	0.033791727	-75.693825810
3	0.033518493	-75.695381144
4	0.033928344	-75.695675397

Tabla 8. Coordenadas de la chacra del Sra. Merly Quintero.

Chacra 4. Merly Quintero		
ID	Latitud	Longitud
1	0.030912258	-75.693810047
2	0.030376298	-75.693405450
3	0.029835084	-75.694645513
4	0.030486643	-75.694842557

Tabla 9. Coordenadas de la chacra del Sr. Judtih Coquinche.

Chacra 5. Judith Coquinche		
ID	Latitud	Longitud
1	0.0313228944720128	-75.6912502644272
2	0.0307868004212678	-75.6920066711015
3	0.031495472693828	-75.692590499554
4	0.0320132073592736	-75.6918194053714

Tabla 10. Coordenadas de la chacra del Sr. Esteban Quintero.

Chacra 6. Esteban Quintero		
ID	Latitud	Longitud
1	0.031622930	-75.690363091
2	0.0324605	-75.6910954
3	0.032200925	-75.691734517
4	0.031215706	-75.691009395

Tabla 11. Coordenadas de la chacra del Sr. Clemente Tapuy.

Chacra 7. Francisco Queta		
ID	Latitud	Longitud
1	0.0301163374	-75.6890086582
2	0.0305683039	-75.6897590933
3	0.0309043033	-75.6884553744
4	0.0312794	-75.6892879

Tabla 12. Coordenadas de la chacra de la Sr. José Tapuy.

Chacra 8. José Tapuy		
ID	Latitud	Longitud
1	0.029586	-75.6902955
2	0.030397316	-75.689919085
3	0.0299739	-75.6891304
4	0.0291519991	-75.689467197

Tabla 13. Coordenadas de la chacra del Sr. Segundo Tapuy.

Chacra 9. Segundo Tapuy		
ID	Latitud	Longitud
1	0.0306074971	-75.6880721265
2	0.0298718663	-75.6886080861
3	0.0294094698	-75.6878724553
4	0.0302107819	-75.6873154776

Tabla 14. Coordenadas de la chacra del Sr. Iván Quintero.

Chacra 10. Iván Quintero		
ID	Latitud	Longitud
1	0.03339238499	-75.6943643977
2	0.03288795248	-75.6940018368
3	0.03239402898	-75.6951578281
4	0.03289846149	-75.6955834431

Tabla 15. Coordenadas de la chacra de la Sra. Silvia Gabriela.

Chacra 11. Silvia Gabriela		
ID	Latitud	Longitud
1	0.0303482	-75.7132671
2	0.029588123	-75.713388337
3	0.029404215	-75.7122848911
4	0.0301255	-75.7121345

Tabla 16. Coordenadas de la chacra del Sra. Yeimi Achanga.

Chacra 12. Yeimi Achanga		
ID	Latitud	Longitud
1	0.03746579246	-75.668918576
2	0.03680328759	-75.6691812942
3	0.03638636643	-75.6681418469
4	0.03709456128	-75.6678677070

Tabla 17. Coordenadas de la chacra del Sr. Elvis Proaño.

Chacra 13. Elvis Proaño		
ID	Latitud	Longitud
1	0.03690037882	-75.6694325892
2	0.03756859494	-75.6691755830
3	0.03804833984	-75.6701407840
4	0.03734014498	-75.6704491915

Tabla 18. Coordenadas de la chacra del Sr. Rene Galindo.

Chacra 14. Rene Galindo		
ID	Latitud	Longitud
1	0.0247411300233786	-75.6545919090
2	0.0251209280719845	-75.65528011457
3	0.0246754506615896	-75.65603685504
4	0.0240100901704229	-75.65545145203

Tabla 19. Coordenadas de la chacra del Sr. Adrián Tapuy.

Chacra 15. Adrián Tapuy		
ID	Latitud	Longitud
1	0.036752091894	-75.6993691558
2	0.0374188	-75.6990569999
3	0.03777070143	-75.7000524006
4	0.03717168786	-75.7004543704

- **Anexo 6.2. Coordenadas geográficas de las chacras pertenecientes a la COMUNIDAD LORENZÓ.**

Tabla 1. Coordenadas de la chacra del Sra. Ediberto Painda.

Chacra 1. Ediberto Painda		
ID	Latitud	Longitud
1	0.236354894715583	-75.96915405384
2	0.235897752676393	-75.96989493921
3	0.2367244	-75.97046960000
4	0.237111543608035	-75.969737304028

Tabla 2. Coordenadas de la chacra del Sra. María Pianda.

Chacra 2. María Pianda		
ID	Latitud	Longitud
1	0.23677262730	-75.970675233
2	0.2373898	-75.9701456
3	0.237723692928	-75.971205938
4	0.23716671527	-75.971741898

Tabla 3. Coordenadas de la chacra del Sr. Josué Pianda.

Chacra 3. Josué Pianda		
ID	Latitud	Longitud
1	0.2366727936290	-75.9705911621346
2	0,236223537	-75.971400349203800
3	0,235464267	-75.970953719977300
4	0,235916151	-75.970134023985200

Tabla 4. Coordenadas de la chacra del Sra. Guillermina Agredo.

Chacra 4. Guillermina Agredo		
ID	Latitud	Longitud
1	0.2393144	-75.980928199999
2	0.238872072661238	-75.9801520700418
3	0.238538415378714	-75.9814341547179
4	0.23809966918831	-75.9806275973499

Tabla 5. Coordenadas de la chacra del Sr. Johnny Estupiñán.

Chacra 5. Johnny Estupiñán		
ID	Latitud	Longitud
1	0.240129409235	-75.98100313
2	0.239979657123	-75.98066159
3	0.238069660741	-75.98179590314
4	0.238228608180	-75.98213350516

Tabla 6. Coordenadas de la chacra del Sr. Esteban Pianda.

Chacra 6. Esteban Pianda		
ID	Latitud	Longitud
1	0.253465224015	-75.9998597471359
2	0.252865542886	-76.0004594282653
3	0.252294418001	-75.99967127592380
4	0.252959778492	-75.9990901563532

Tabla 7. Coordenadas de la chacra del Sr. Nilson Mancilla.

Chacra 7. Nilson Mancilla		
ID	Latitud	Longitud
1	0.2538004	-76.0013778
2	0.2538796	-76.0021234
3	0.252794152275895	-76.0021642
4	0.252771307280491	-76.00137037

Tabla 8. Coordenadas de la chacra de la Sr. Crucilda Cisneros.

Chacra 8. Crucilda Cisneros		
ID	Latitud	Longitud
1	0.25359432	-76.002263505
2	0.252627031	-76.002284251
3	0.2526192517192	-76.003129662
4	0.2535807	-76.0030915

Tabla 9. Coordenadas de la chacra del Sra. Deysi Mina.

Chacra 9. Deysi Mina		
ID	Latitud	Longitud
1	0.250715257694052	-76.00348781796
2	0.2500284800197	-76.002746783430
3	0.2500284800197	-76.00337502080
4	250278347156941	-76.00415746189

Tabla 10. Coordenadas de la chacra del Sr. Alexandra Payaguaje.

Chacra 10. Alexandra Payaguaje		
ID	Latitud	Longitud
1	0.264404497952218	-75.984159383873700
2	0.264904890593001	-75.983411642096800
3	0.264415886689418	-75.982656426461200
4	0.263860685750853	-75.983425522120200

Tabla 11. Coordenadas de la chacra de la Sr. Emilio Castillo.

Chacra 11. Emilio Castillo		
ID	Latitud	Longitud
1	0.250913689249147	-76.003779556860000
2	0.251808076382253	-76.003661615699600
3	0.25172289665529	-76.002763952423200
4	0.250821957235495	-76.002865512866900

Tabla 12. Coordenadas de la chacra del Sr. Alexander Valencia.

Chacra 1. Alexander Valencia		
ID	Latitud	Longitud
1	0.24282	-75.99373
2	0.24208	-75.99423
3	0.24159	-75.99344
4	0.2423549	-75.9929517

Tabla 13. Coordenadas de la chacra del Sr. Laudriano Agredo.

Chacra 13.		
ID	Latitud	Longitud
1	0.24395	-75.99801
2	0.24314	-75.9984
3	0.2428	-75.99756
4	0.24364	-75.99712

Tabla 14. Coordenadas de la chacra del Sr. Noe Mina.

Chacra 14.		
ID	Latitud	Longitud
1	0.24119	-75.98950
2	0.24043	-75.99001
3	0.24005	-75.98919
4	0.240804	-75.988682

Tabla 15. Coordenadas de la chacra del Sr. Raúl Guevara.

Chacra 15.		
ID	Latitud	Longitud
1	0.24465	-76.00135
2	0.24374	-76.00139
3	0.24368	-76.00047
4	0.24459	-76.00044

- **Anexo 6.3. Coordenadas geográficas de las chacras pertenecientes COMUNIDAD SAN JOSÉ DE WISUYA**

Tabla 1. Coordenadas de la Chacra del Sr. Alonso Aguinda.

Chacra 1. Alonso Aguinda		
ID	Latitud	Longitud
1	0.4018019	-76.2364156
2	0.401184519564846	-76.2355306144283
3	0.401764596544369	-76.23497758767064
4	0.4022875675	-76.23587024499146

Tabla 2. Coordenadas de la Chacra del Sr. Dago Aguinda.

Chacra 2. Dago Aguinda		
ID	Latitud	Longitud
1	0.3990266	-76.2428579
2	0.3984937	-76.2433525
3	0.39803061119	-76.242341926463538
4	0.39866663408	-76.241889919488088

Tabla 3. Coordenadas de la Chacra del Sr. Abelino Jipa.

Chacra 3. Abelino Jipa		
ID	Latitud	Longitud
1	0.394624824516894	-76,254903823461078
2	0.393756682366465	-76,255419447283757
3	0.3933903	-76,254728299999996
4	0.39428723701639	-76,254205378412351

Tabla 4. Coordenadas de la Chacra del Sra. Sandra Jipa.

Chacra 4. Sandra Jipa		
ID	Latitud	Longitud
1	0.395642564130167	-76.2480424190015
2	0.395118701059509	-76.2490934808952
3	0.394544787544159	-76.2485562719658
4	0.395148731430634	-76.2475185554599

Tabla 5. Coordenadas de la Chacra del Sr. Marcelo Solano.

Chacra 5. Marcelo Solano		
ID	Latitud	Longitud
1	0.42173779890785	-76.2673624180887
2	0.422535294334471	-76.266635706279871
3	0.422983590580205	-76.267296353378839
4	0.422261597679181	-76.267999470648462

Tabla 6. Coordenadas de la Chacra del Sr. Hans Aguinda

Chacra 6. Hans Aguinda		
ID	Latitud	Longitud
1	0.42161894052901	-76.267297282760225
2	0.422446033771331	-76.266381572384802
3	0.421865099232082	-76.265997564808004
4	0.421082314556314	-76.266745887265344

Tabla 7. Coordenadas de la Chacra del Sra. Cecilia Chindoy

Chacra 7. Cecilia Chindoy		
ID	Latitud	Longitud
1	0.421100162457338	-76.2654619274743
2	0.421778107679181	-76.2659155167235
3	0.420378321501706	-76.2662374187713
4	0.420909947610921	-76.2667544129692

Tabla 8. Coordenadas de la Chacra del Sr. Sandro Piaguaje.

Chacra 8. Sandro Piaguaje		
ID	Latitud	Longitud
1	0.423152437241936	-76.261639234758
2	0.423202939306451	-76.2608082462419
3	0.422312266532276	-76.2605511448225
4	0.422169942532279	-76.2613821333387

Tabla 9. Coordenadas de la Chacra del Sr. Darwin Rodríguez.

Chacra 9. Darwin Rodríguez		
ID	Latitud	Longitud
1	0.4105097	-76.266761
2	0.4104046311978	-76.26617528106
3	0.409379462029	-76.265995376728
4	0.4094080182733	-76.266980571550

Tabla 10. Coordenadas de la Chacra del Sr. Hugo Cabrera.

Chacra 10. Hugo Cabrera		
ID	Latitud	Longitud
1	0.4106873380159	-76.2704073164657
2	0.4098649181814	-76.2707157239037
3	0.4103418074604	-76.2715895449779
4	0.411164227295	-76.2710098532195

Tabla 11. Coordenadas de la Chacra del Sr. Álvaro Tiandoy.

Chacra 11. Álvaro Tiandoy		
ID	Latitud	Longitud
1	0.4114334294027	-76.273209365921502
2	0.4107848433276	-76.273757575580206
3	0.411379380563	-76.274539996877138
4	0.4120150986689	-76.274007229744029

Tabla 12. Coordenadas de la Chacra del Sr. Kevin Piaguaje,

Chacra 12. Kevin Piaguaje		
ID	Latitud	Longitud
1	0.43025	-76.2682303
2	0.429706106356655	-76.268781645477830
3	0.429600160424281	-76.267488506200891
4	0.429001849487636	-76.268077468529157

Tabla 13. Coordenadas de la Chacra del Sra. Yesid Piaguaje.

Chacra 13. Yesid Piaguaje		
ID	Latitud	Longitud
1	0.426382326981419	-76.2656272452124
2	0.425770563613955	-76,264948985826763
3	0.425069030621919	-76,265421107555994
4	0.395148731430634	-76.2475185554599

Tabla 14. Coordenadas de la Chacra del Sr. Ramiro Arboleda.

Chacra 14. Ramiro Arboleda		
ID	Latitud	Longitud
1	0.410552294273796	-76.2694392479618
2	0.409668932499052	-76.2695864749242
3	0.409793065036026	-76.2704987047308
4	0.410685087220326	-76.2703283833429

Tabla 15. Coordenadas de la Chacra del Sr. Gustavo Aguinda.

Chacra 15. Gustavo Aguinda		
ID	Latitud	Longitud
1	0.401498409651118	-76.236012273653700
2	0.400993985589685	-76.235261595326100
3	0.40024330726204	-76.235766019387500
4	0.400819224497535	-76.236560387988200

- **Anexo 6.4. Coordenadas geográficas de las chacras pertenecientes COMUNIDAD CHANDIA NA´EN.**

Tabla 1. Coordenadas de la chacra del Sr. Nelson Queta.

Chacra 1. Nelson Queta		
ID	Latitud	Longitud
1	0.246226552580647	-77.2279821114516
2	0.2468154467742	-77.2274446740322
3	0.245614788709675	-77.2270787591935
4	0.246137932580647	-77.2265899198387

Tabla 2. Coordenadas de la chacra del Sr. Silverio Descanse.

Chacra 2. Silverio Descanse		
ID	Latitud	Longitud
1	0.2478175	-77.2348312
2	0.247032333032256	-77.2342585827097
3	0.247539208903226	-77.2334949341936
4	0.248236163225809	-77.2340651695484

Tabla 3. Coordenadas de la chacra del Sr. Cristian Descanse.

Chacra 3. Cristian Descanse		
ID	Latitud	Longitud
1	0.250617517	-77.2343351025597
2	0.251537459	-77.2343307835836
3	0.251559054	-77.2352140141979
4	0.250639112	-77.2352442470307

Tabla 4. Coordenadas de la chacra del Sr. Roberto Lucitante.

Chacra 4. Roberto Lucitante		
ID	Latitud	Longitud
1	0.256841256911263	-77.234902859129704
2	0.256009244078498	-77.235276661996593
3	0.256423240802048	-77.236112694215024
4	0.257231137320819	-77.235642426092156

Tabla 5. Coordenadas de la chacra del Sr. Albertino Descanse.

Chacra 5. Albertino Descanse		
ID	Latitud	Longitud
1	0.242967798122867	-77.22745286766210
2	0.242667035836178	-77.22801215034130
3	0.243914016552901	-77.22853932918090
4	0.243914016552901	-77.22784994146760

Tabla 6. Coordenadas de la chacra del Sr. Heriberto Alvarado.

Chacra 6. Heriberto Alvarado		
ID	Latitud	Longitud
1	0.2450164	-77.228489
2	0.245293344744027	-77.2293372978669
3	0.244430522116041	-77.2295683466041
4	0.244145321331058	-77.2286676175426

Tabla 720. Coordenadas de la chacra del Sr. Francisco Queta.

Chacra 7. Francisco Queta		
ID	Latitud	Longitud
1	0.2583758	-77.2282993
2	0.259086811228669	-77.2277303404436
3	0.258394802457338	-77.2271758737884
4	0.257681302730376	-77.2276830603413

Tabla 8. Coordenadas de la chacra de la Sra. Alicia Alvarado.

Chacra 8. Alicia Alvarado		
ID	Latitud	Longitud
1	0.2574635	-77.234403
2	0.258143392790102	-77.2350984086177
3	0.58761126066553	-77.234487577389
4	0.258181354052901	-77.2338439614334

Tabla 9. Coordenadas de la chacra del Sr. Bayron Descanse.

Chacra 9. Bayron Descanse		
ID	Latitud	Longitud
1	0.259018445	-77.2398906901934
2	0.259046205	-77.2407021850645
3	0.258056529	-77.2407196157419
4	0.258041036	-77.2398674492902

Tabla 1021. Coordenadas de la chacra del Sr. Luis Descanse.

Chacra 10. Luis Descanse		
ID	Latitud	Longitud
1	0.259017301697907	-77.2407960312831
2	0.258080744856154	-77.2408536655503
3	0.25809515342295	-77.2417145774163
4	0.2590605	-77.2416532999999

Tabla 11. Coordenadas de la chacra de la Sra. Nathaly Descanse.

Chacra 11. Nathaly Descanse		
ID	Latitud	Longitud
1	0.2590045	-77.239787
2	0.257668085215973	-77.23978133861334
3	0.258981672451753	-77.23916452373740
4	0.257673796464824	-77.23915310123970

Tabla 12. Coordenadas de la chacra del Sr. Armando Lucitante.

Chacra 12. Armando Lucitante		
ID	Latitud	Longitud
1	0.257364800096773	-77.2385776095806
2	0.257390392999999	-77.23947592048389
3	0.256492082096768	-77.23948871693547
4	0.256456252032252	-77.23858016887098

Tabla 13. Coordenadas de la chacra del Sr. Reynaldo Descanse.

Chacra 13. Reynaldo Descanse		
ID	Latitud	Longitud
1	0.263691	-77.2391625
2	0.2643748	-77.2384894
3	0.263810734671502	-77.2378707864121
4	0.263113236872867	-77.2385183094069


Tabla 14. Coordenadas de la chacra del Sr. Atanacio Descanse.

Chacra 14. Atanacio Descanse		
ID	Latitud	Longitud
1	0.2629858	-77.2383361
2	0.263324418327645	-77.23799287220130
3	0.262295486826984	-77.23661218761540
4	0.261947375398412	-77.23693104598270

Tabla 15. Coordenadas de la chacra del Sr. Carlos Descanse.

Chacra 15. Carlos Descanse		
ID	Latitud	Longitud
1	0.2573499	-77.2455502
2	0.257422	-77.246446
3	0.25833	-77.24641
4	0.25825	-77.24553

- **Anexo 6.5. Mapas de las chacras: Comunidad Sandy Yaku**

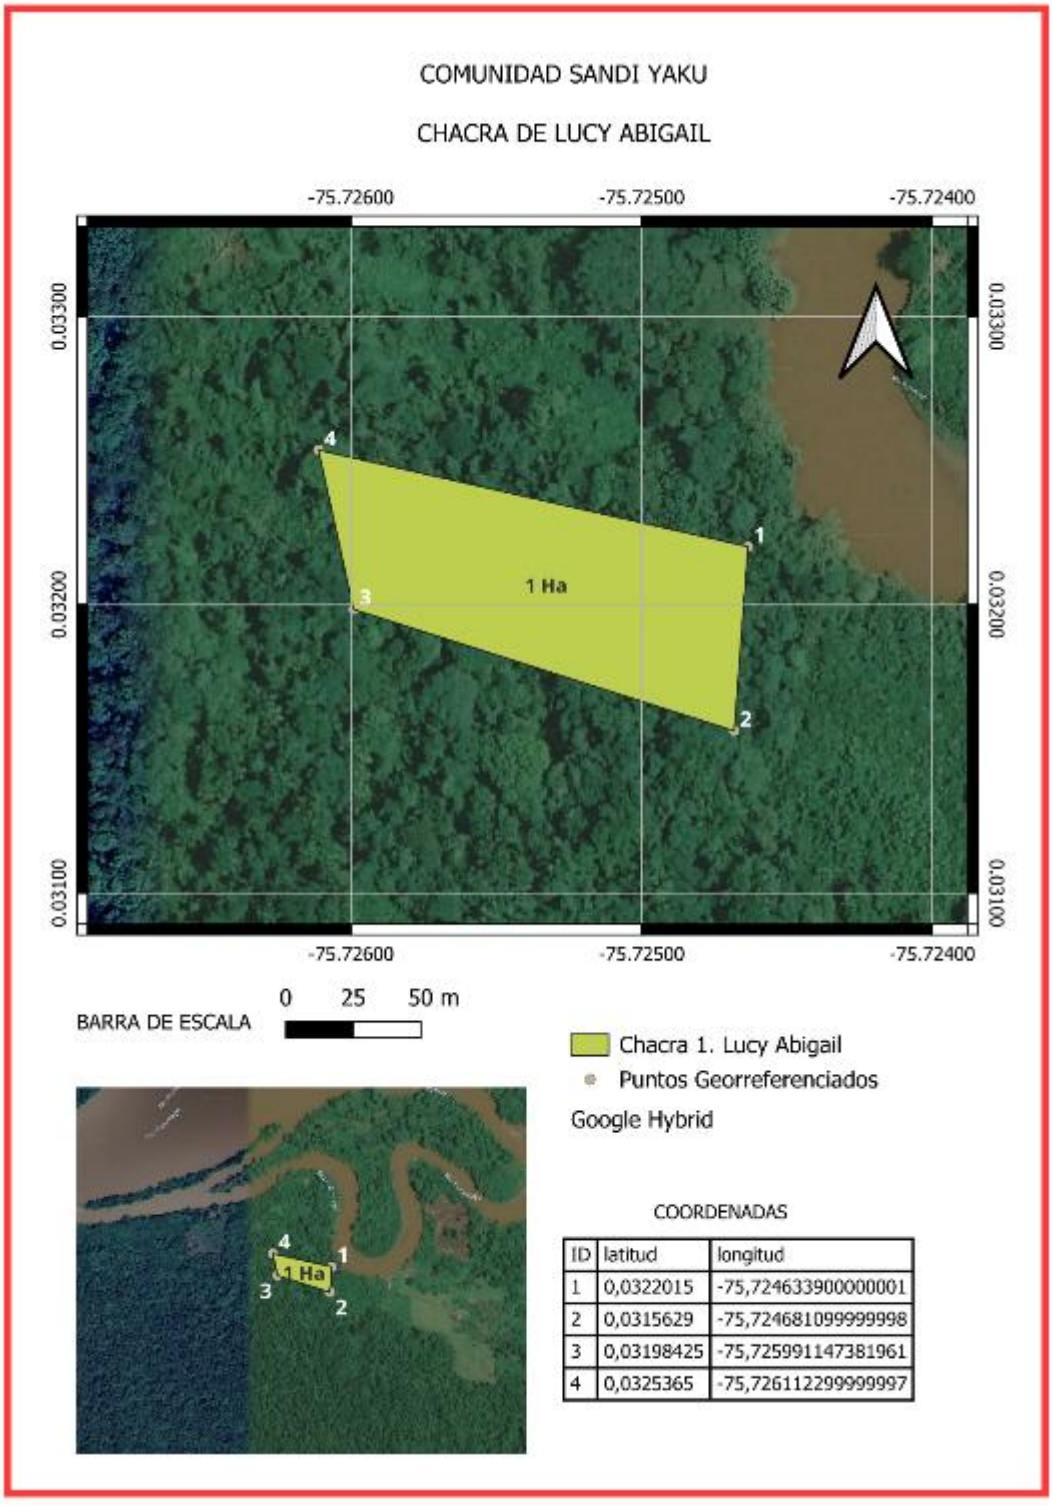

ID	latitud	longitud
1	0,0322015	-75,724633900000001
2	0,0315629	-75,724681099999998
3	0,03198425	-75,725991147381961
4	0,0325365	-75,726112299999997

COMUNIDAD SANDI YAKU

CHACRA DE MARÍA ABIGAIL



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA




Chacra 2. María Abigail

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid


COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,03059961	-75,718864699999997
2	0,0312806	-75,718764300000004
3	0,0313093	-75,719826400000002
4	0,03059436	-75,720084099999994

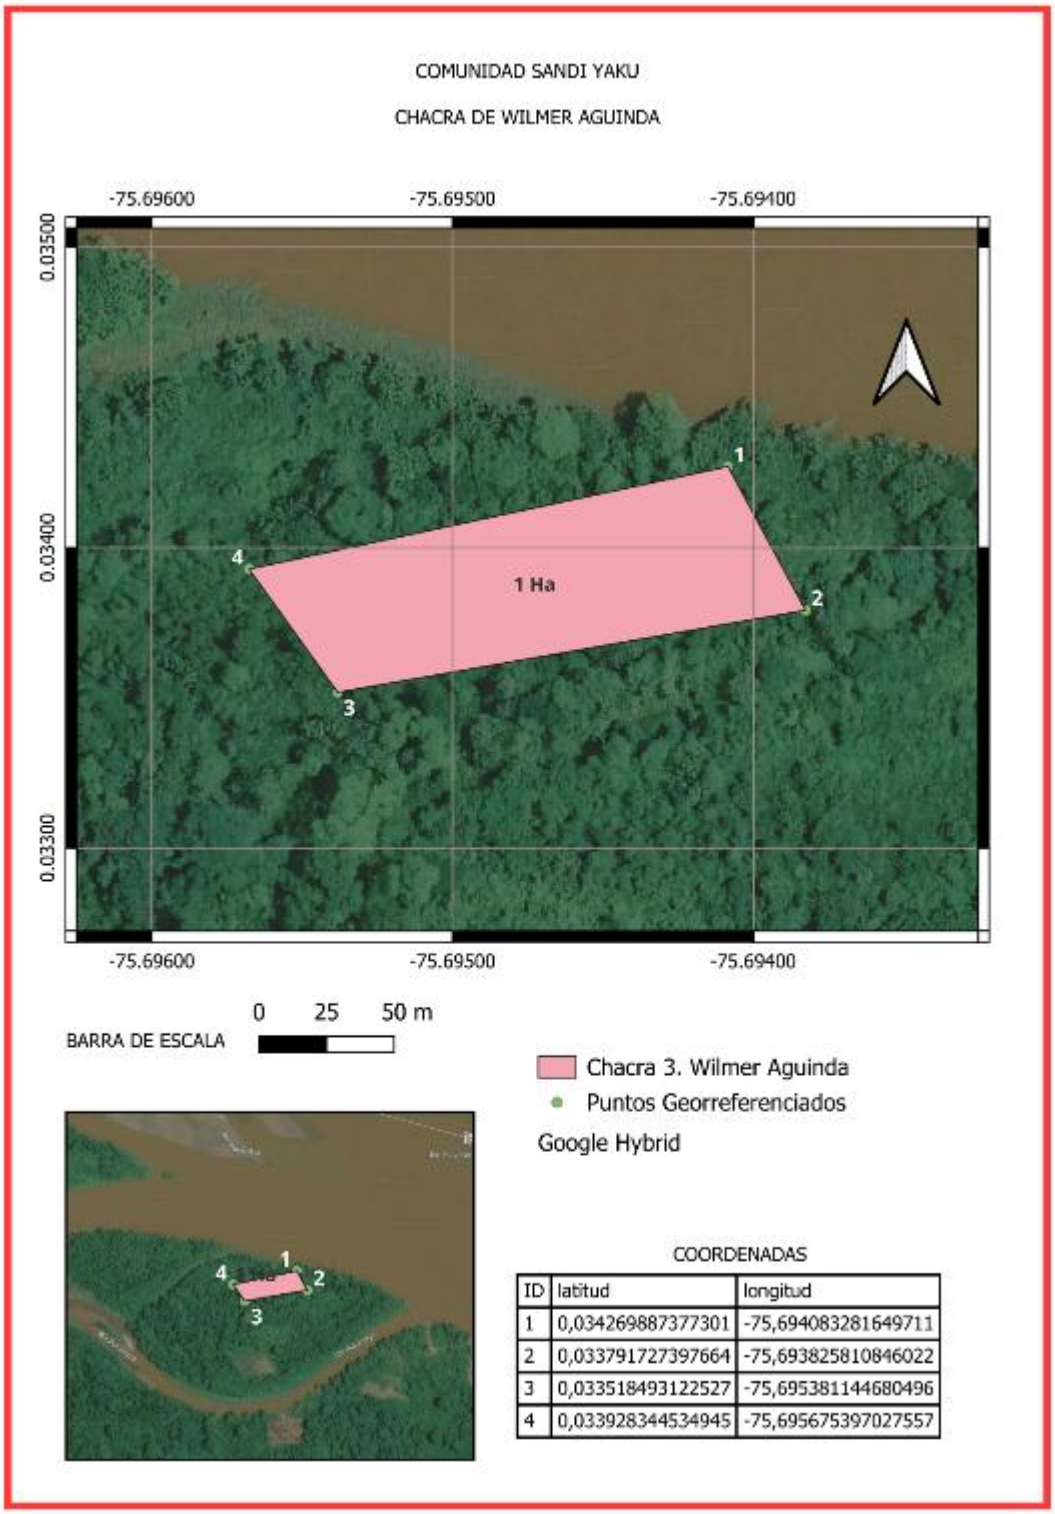


COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,034269887377301	-75,694083281649711
2	0,033791727397664	-75,693825810846022
3	0,033518493122527	-75,695381144680496
4	0,033928344534945	-75,695675397027557

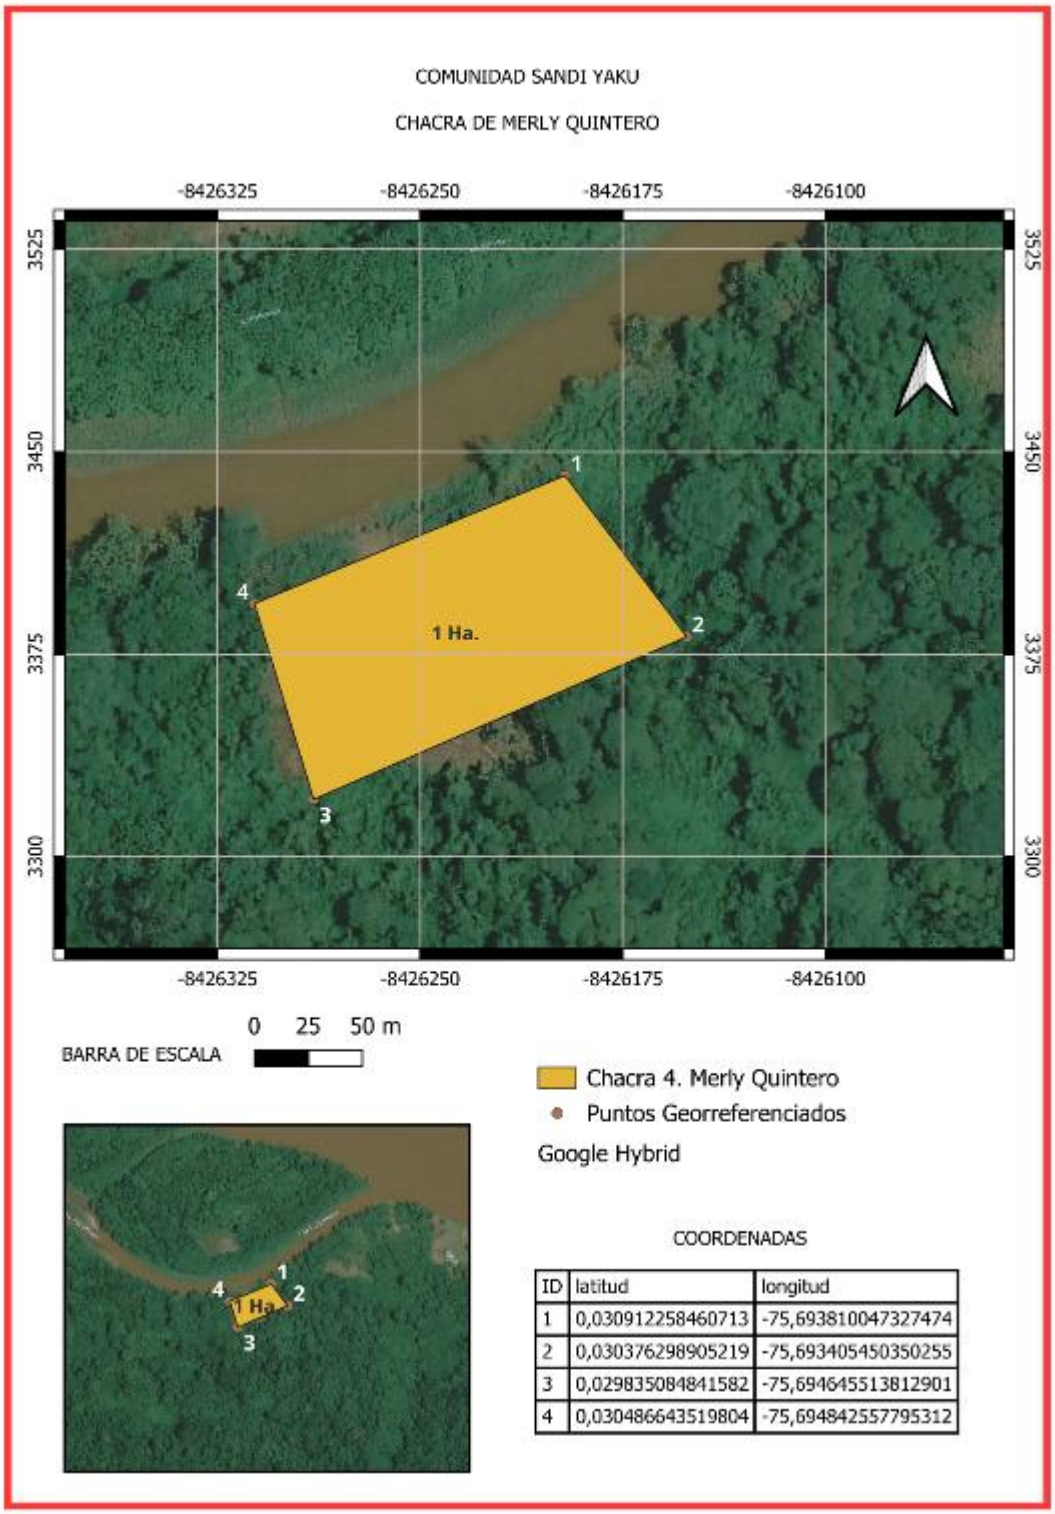

COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,030912258460713	-75,693810047327474
2	0,030376298905219	-75,693405450350255
3	0,029835084841582	-75,694645513812901
4	0,030486643519804	-75,694842557795312

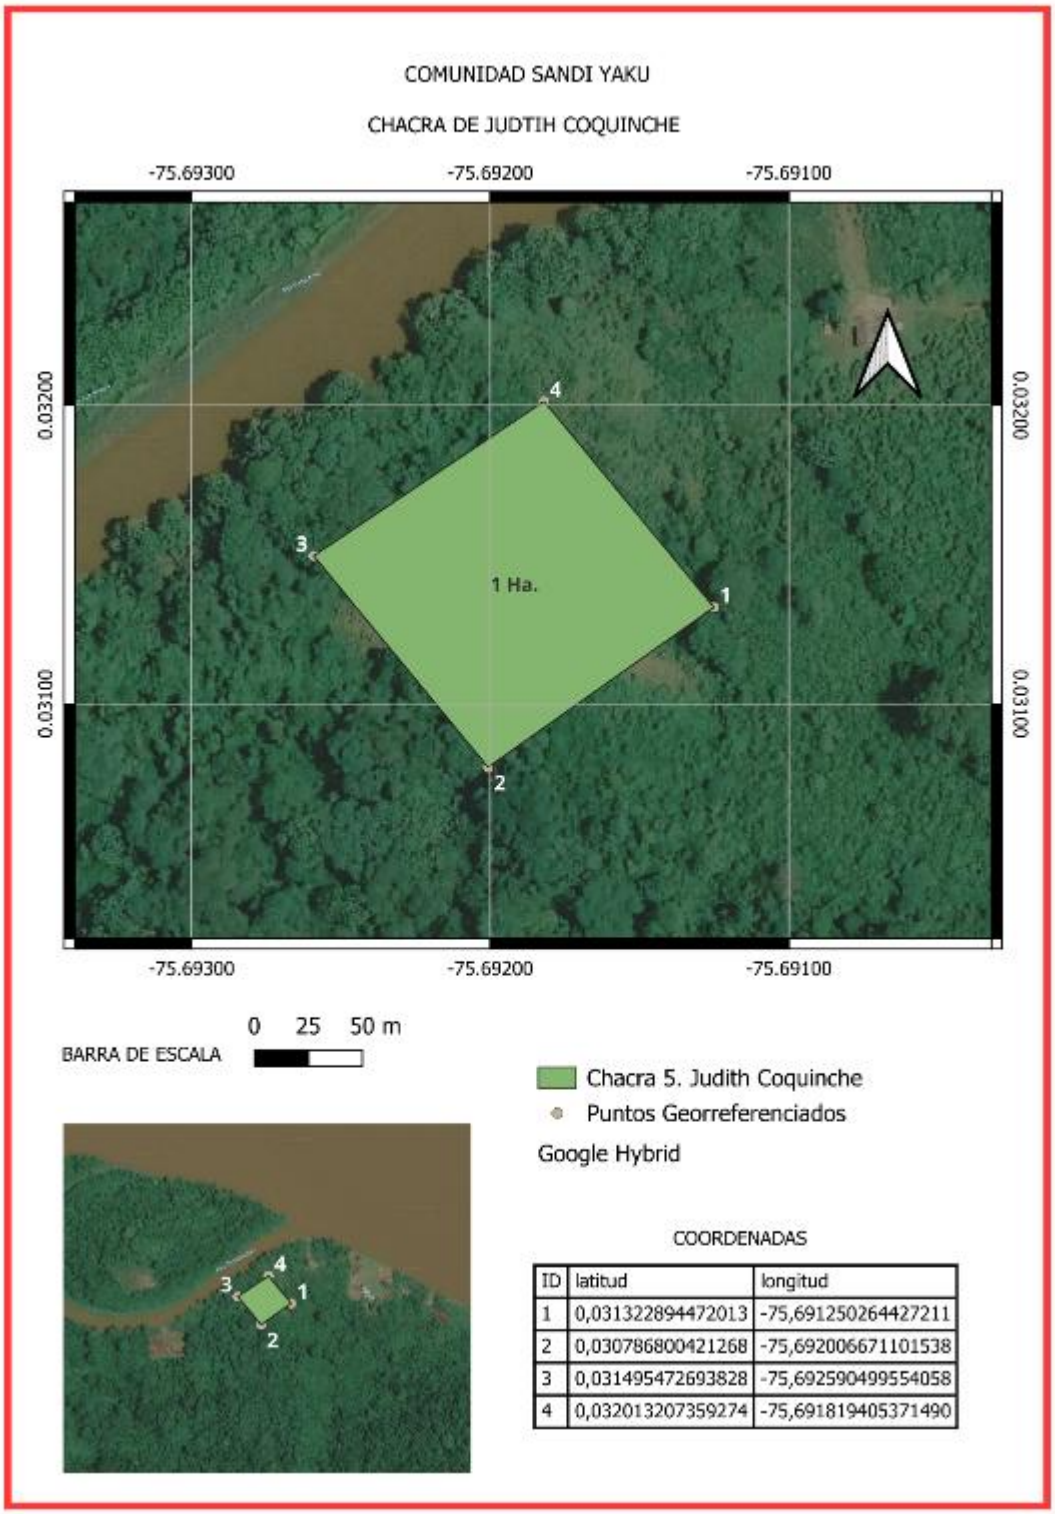


COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,031322894472013	-75,691250264427211
2	0,030786800421268	-75,692006671101538
3	0,031495472693828	-75,692590499554058
4	0,032013207359274	-75,691819405371490

COMUNIDAD SANDI YAKU

CHACRA DE ESTEBAN QUINTERO

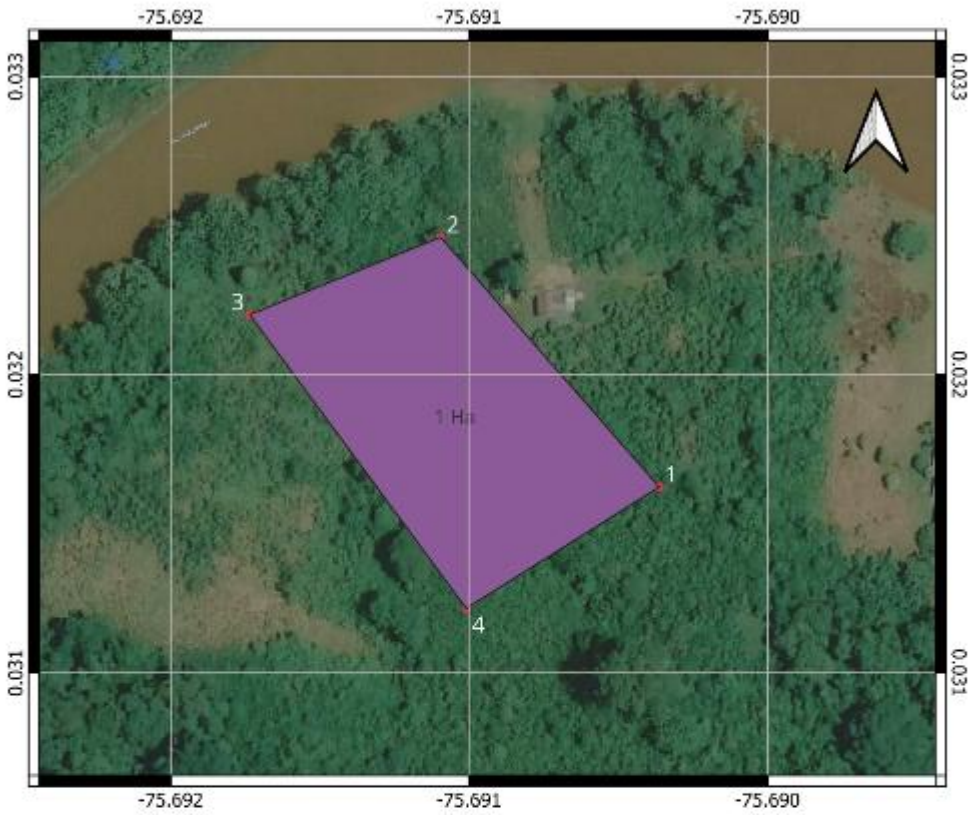

0 25 50 m

BARRA DE ESCALA




Chacra 6. Esteban Quintero

Puntos Georreferenciados

Mapa Base

COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,031622930318101	-75,690363091261901
2	0,0324605	-75,691095399999995
3	0,032200925910182	-75,691734517379473
4	0,031215706149018	-75,691009395524190

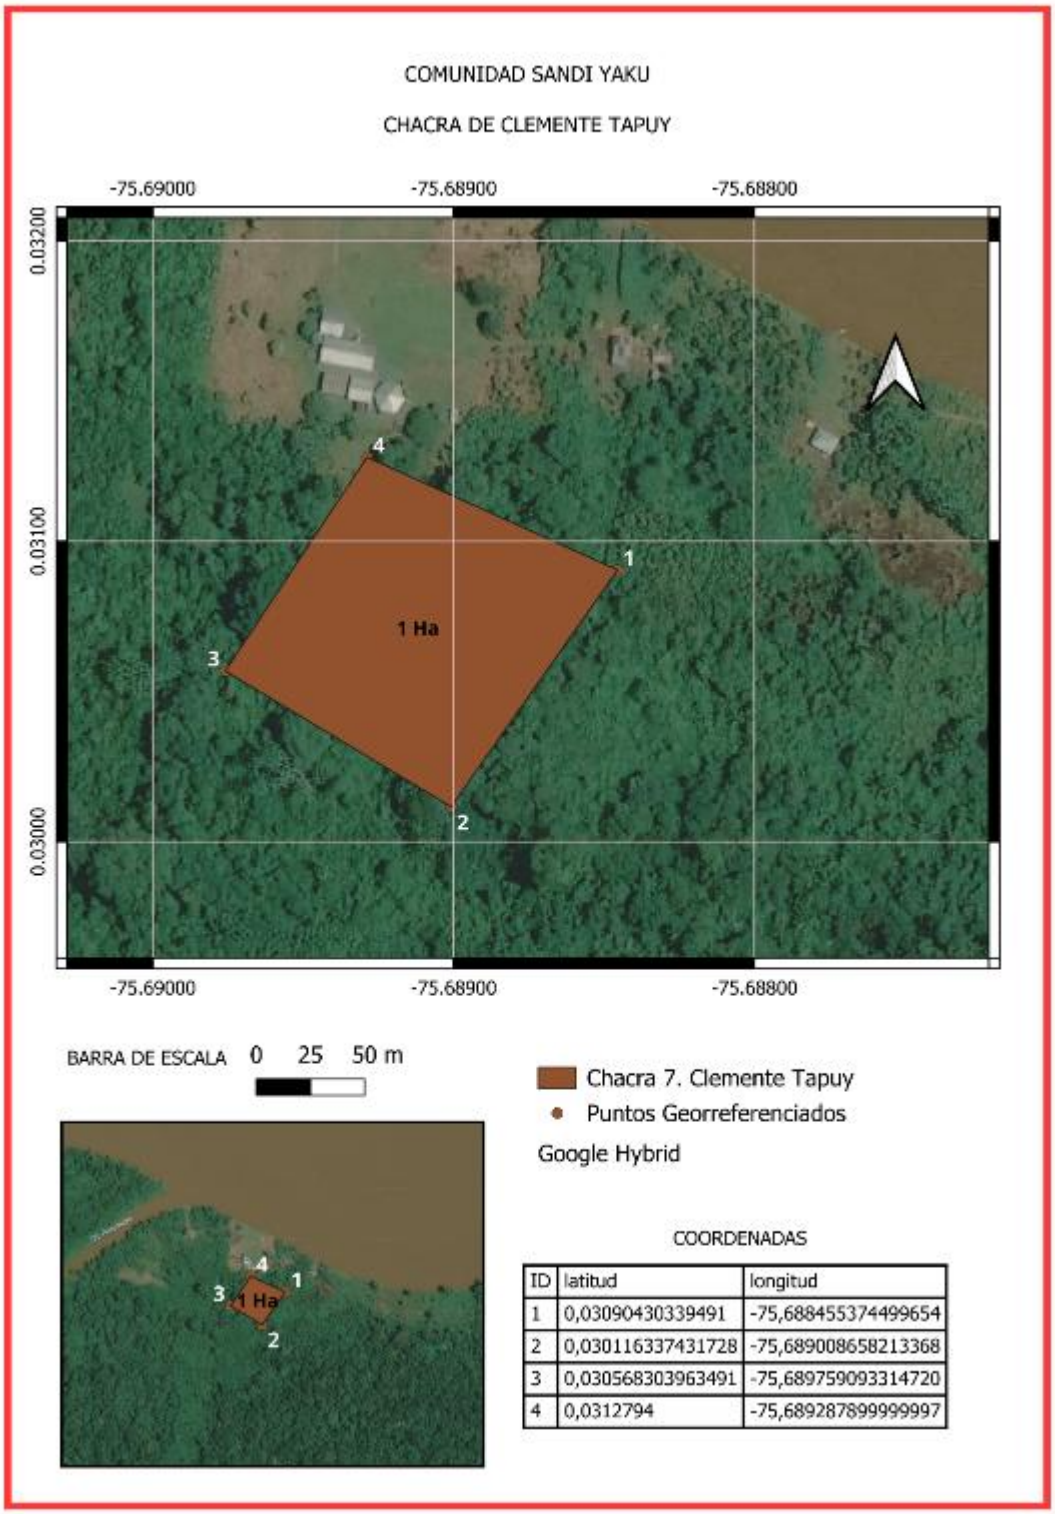


COORDENADAS


ID	latitud	longitud
1	0,03090430339491	-75,688455374499654
2	0,030116337431728	-75,689008658213368
3	0,030568303963491	-75,689759093314720
4	0,0312794	-75,689287899999997

COMUNIDAD SANDI YAKU

CHACRA DE JOSÉ TAPUY

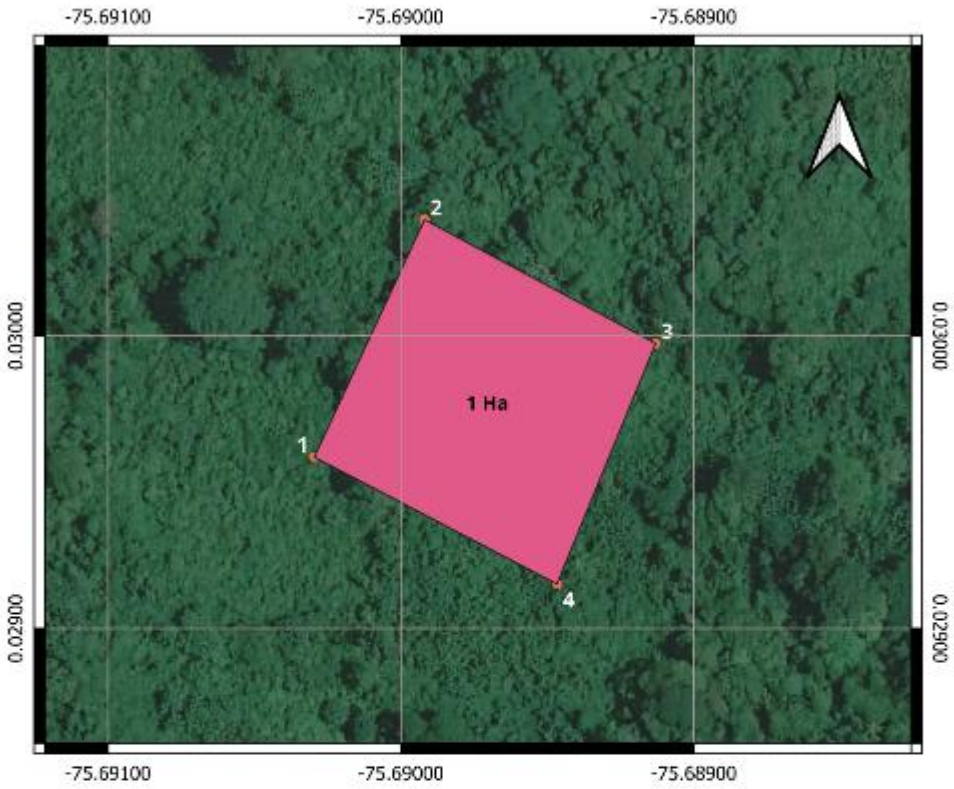

BARRA DE ESCALA 0 25 50 m

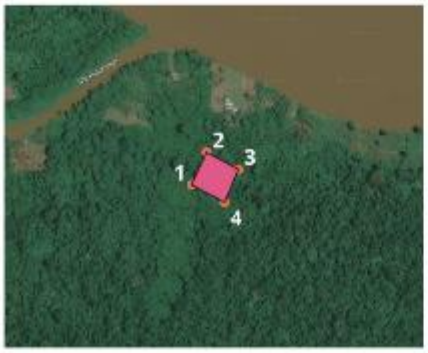


Chacra 8. José Tapuy

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid


COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,029586	-75,690295500000005
2	0,03039731692703	-75,689919085488185
3	0,0299739	-75,689130399999996
4	0,029151999126378	-75,689467197955196

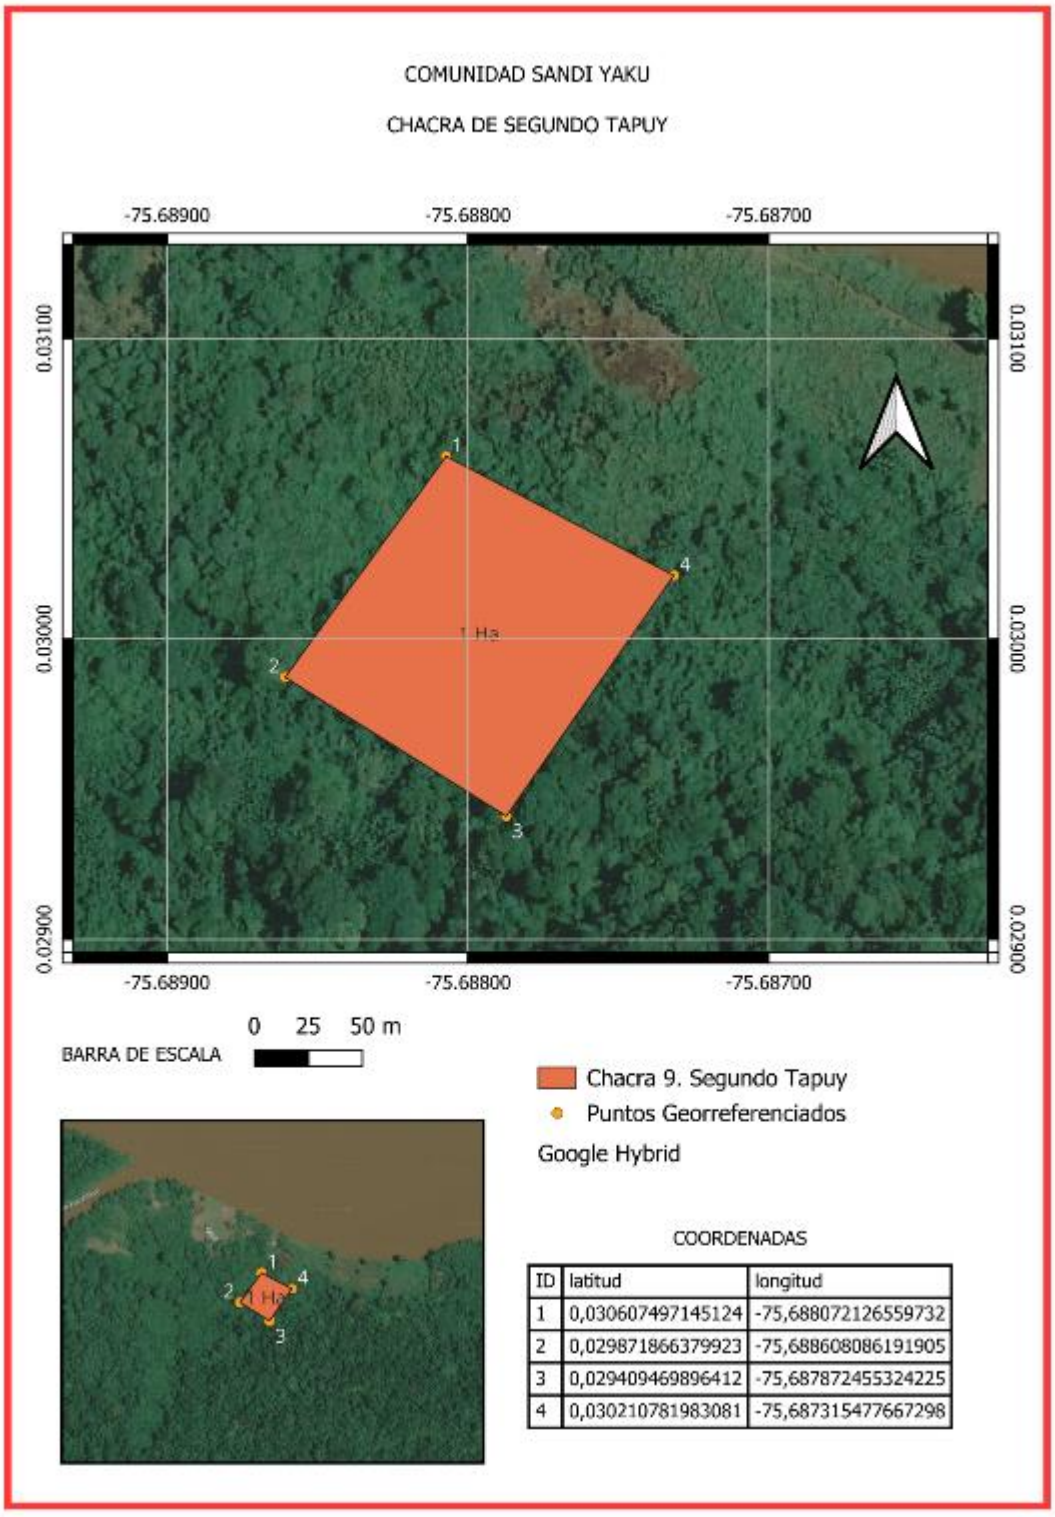


COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,030607497145124	-75,688072126559732
2	0,029871866379923	-75,688608086191905
3	0,029409469896412	-75,687872455324225
4	0,030210781983081	-75,687315477667298

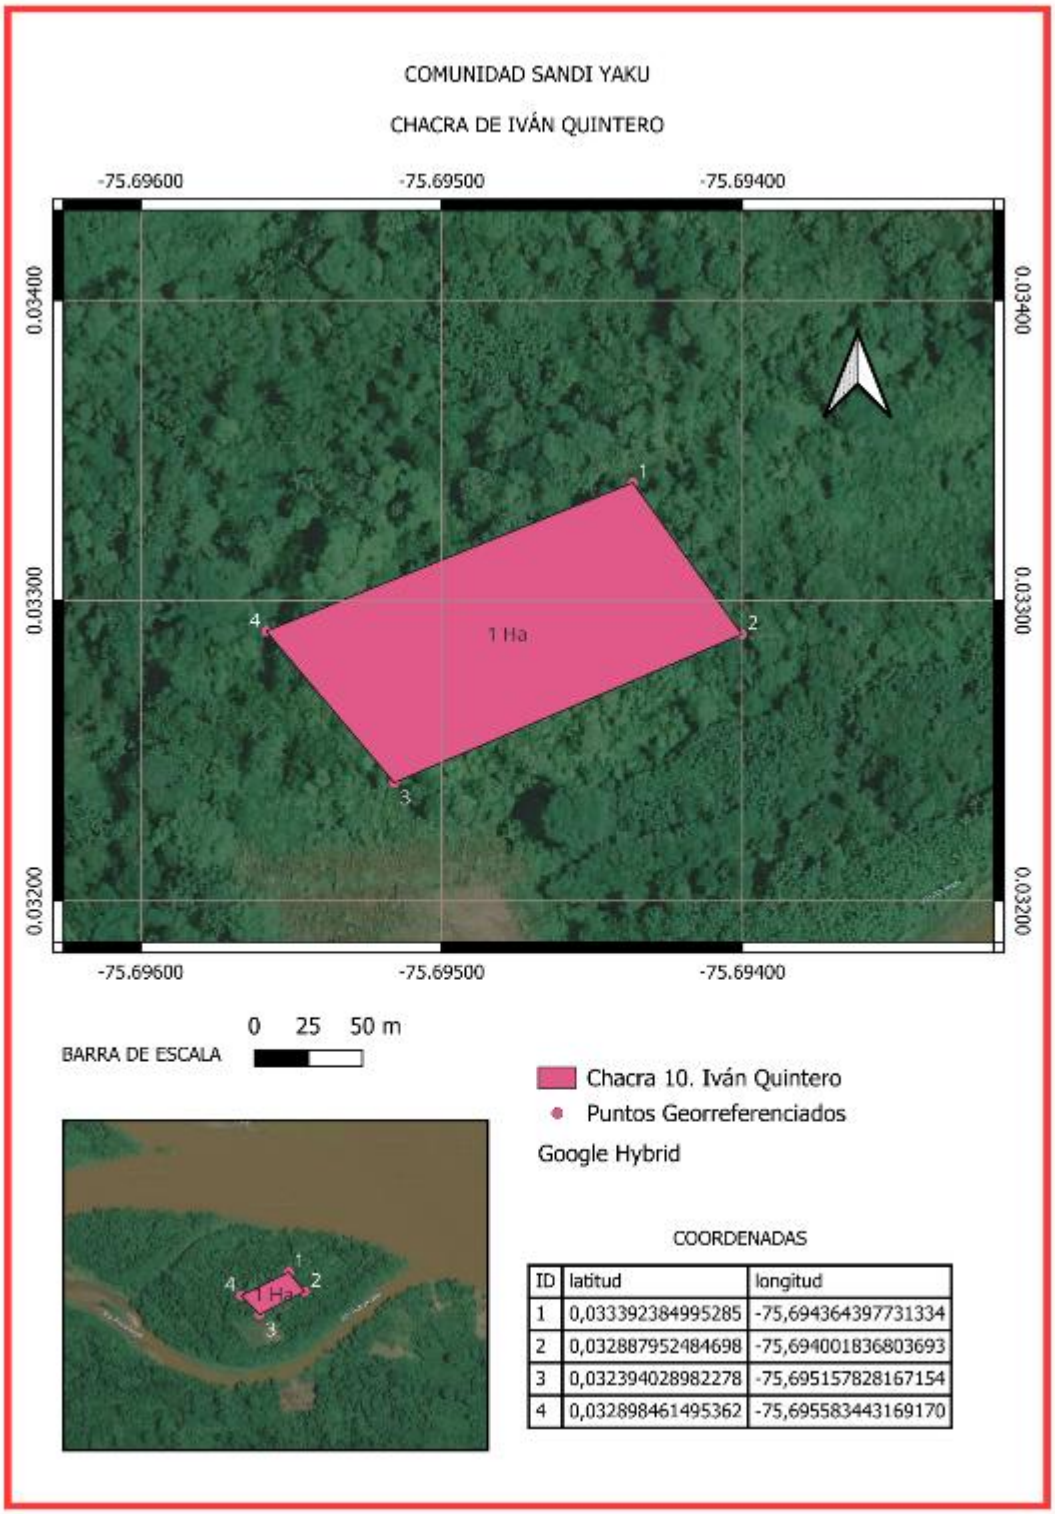

COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,033392384995285	-75,694364397731334
2	0,032887952484698	-75,694001836803693
3	0,032394028982278	-75,695157828167154
4	0,032898461495362	-75,695583443169170

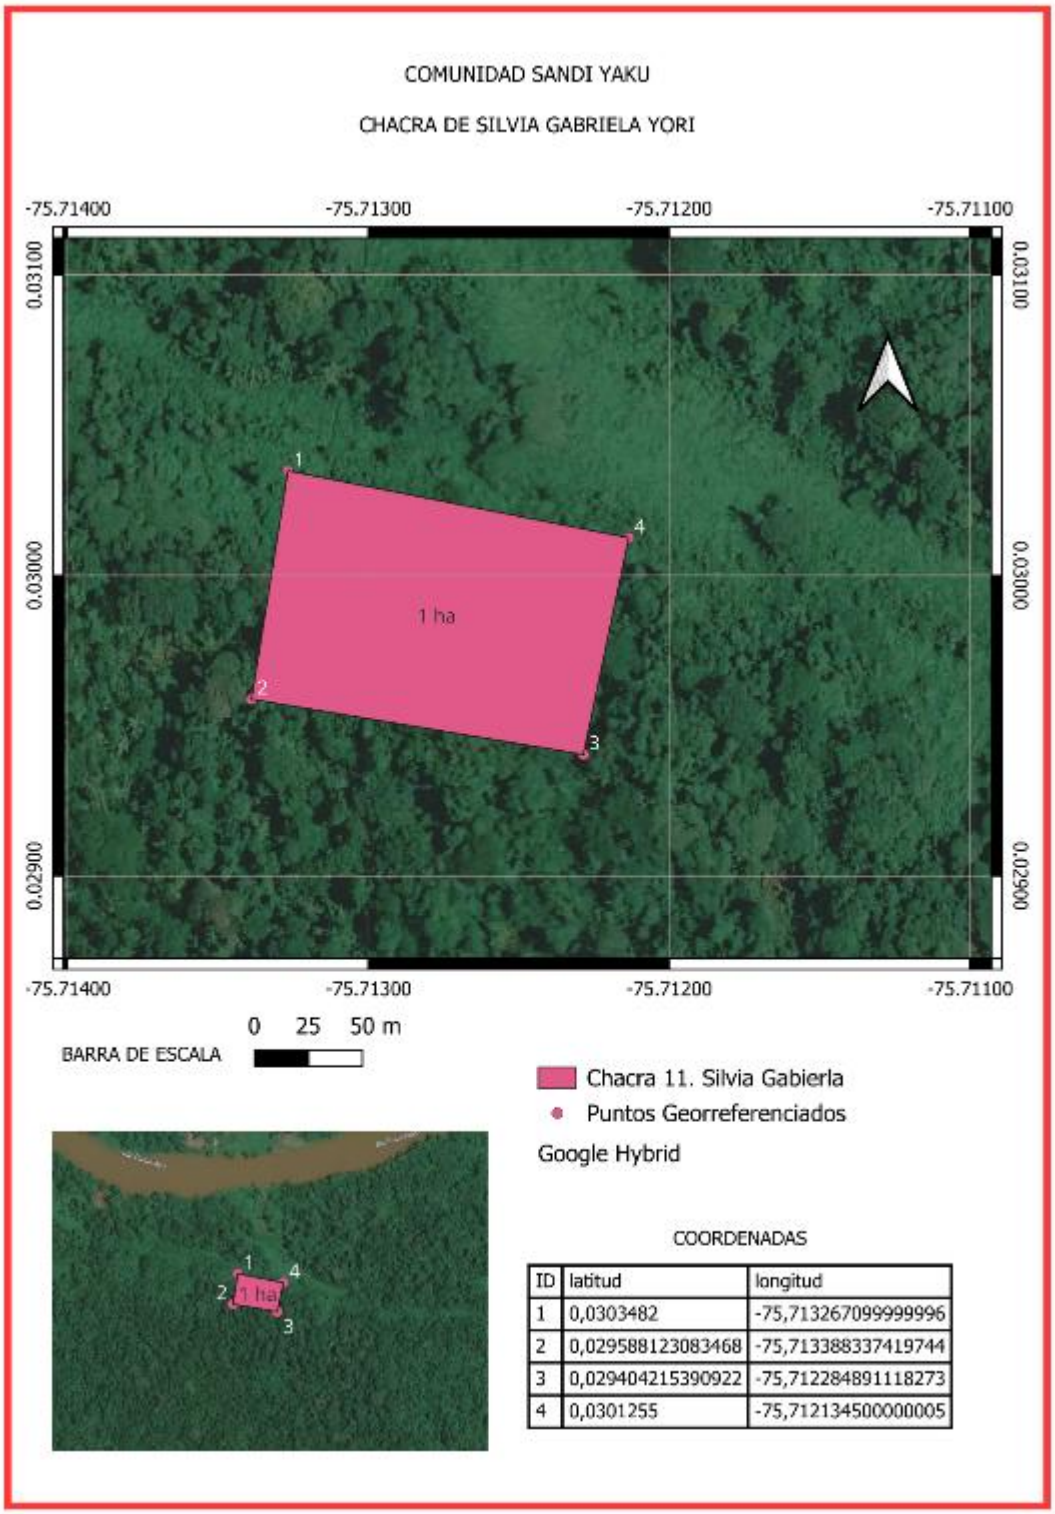


COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,0303482	-75,713267099999996
2	0,029588123083468	-75,713388337419744
3	0,029404215390922	-75,712284891118273
4	0,0301255	-75,712134500000005

COMUNIDAD SANDI YAKU

CHACRA DE YEIMI ACHANGA

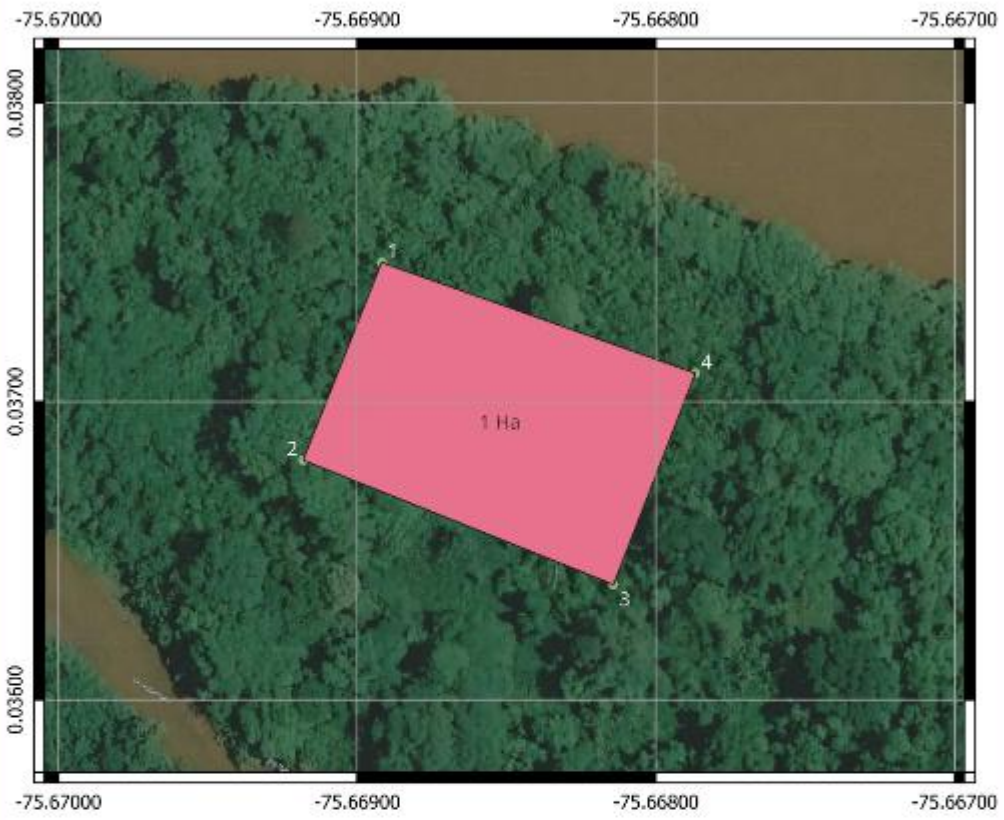

0 25 50 m

BARRA DE ESCALA




Chacra 12. Yeimi Achanga

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid


COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,037465792463816	-75,668918576829171
2	0,036803287597078	-75,669181294276314
3	0,036386366430941	-75,668141846985421
4	0,037094561288489	-75,667867707040557

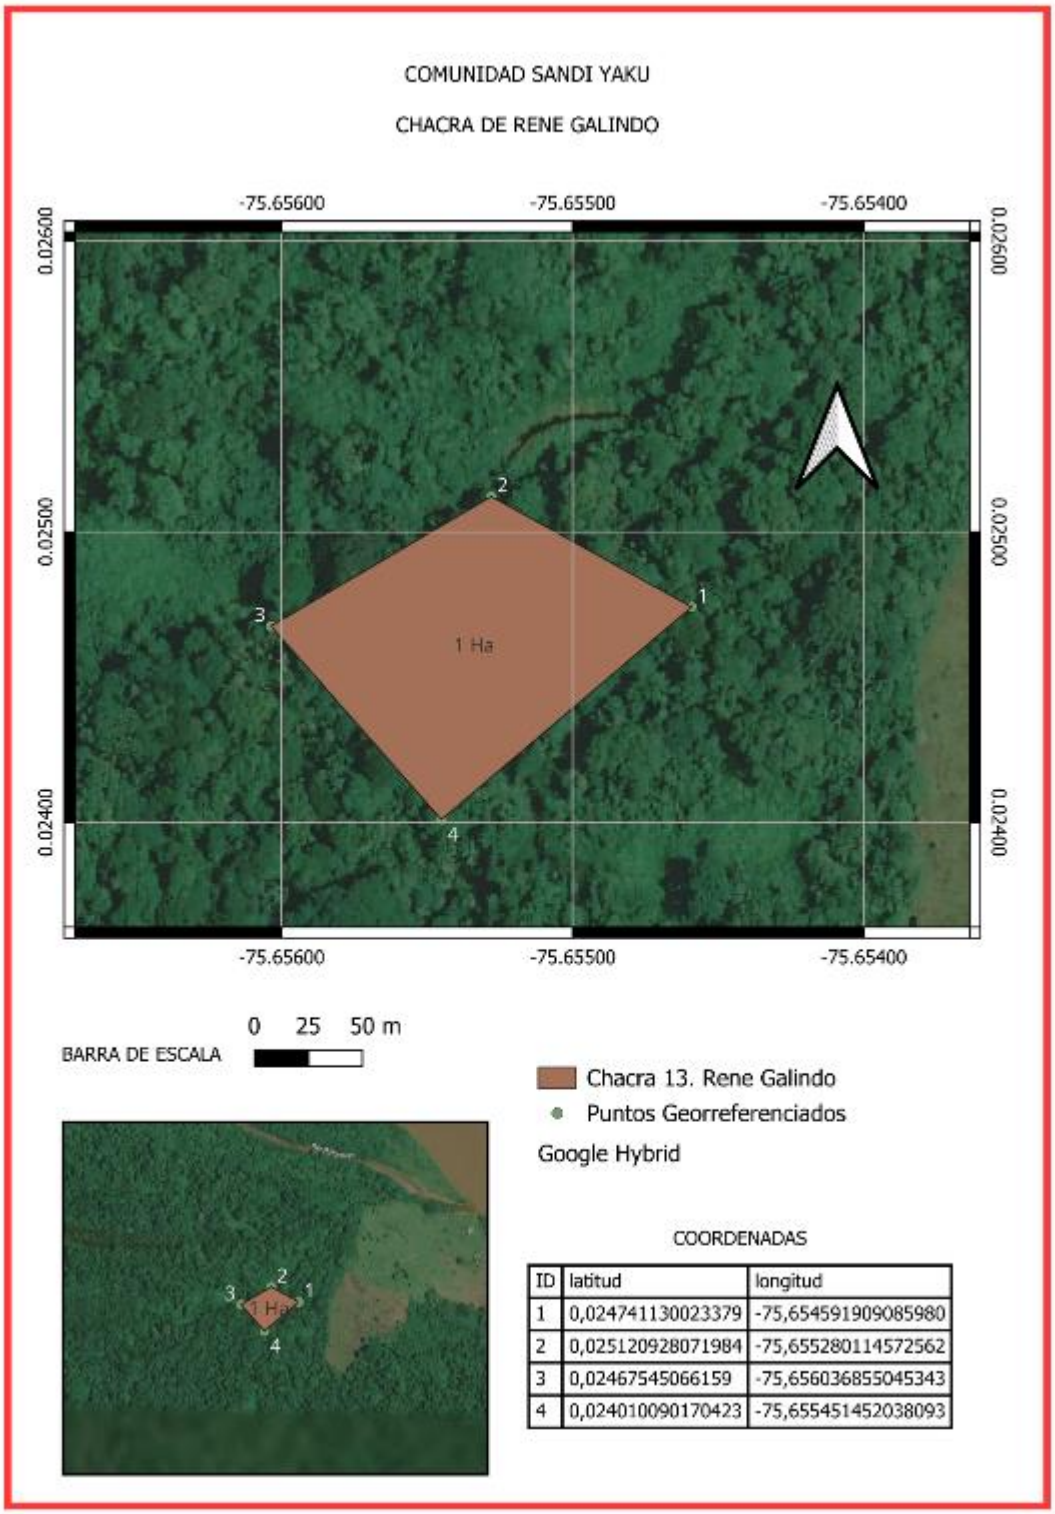


COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,024741130023379	-75,654591909085980
2	0,025120928071984	-75,655280114572562
3	0,02467545066159	-75,656036855045343
4	0,024010090170423	-75,655451452038093

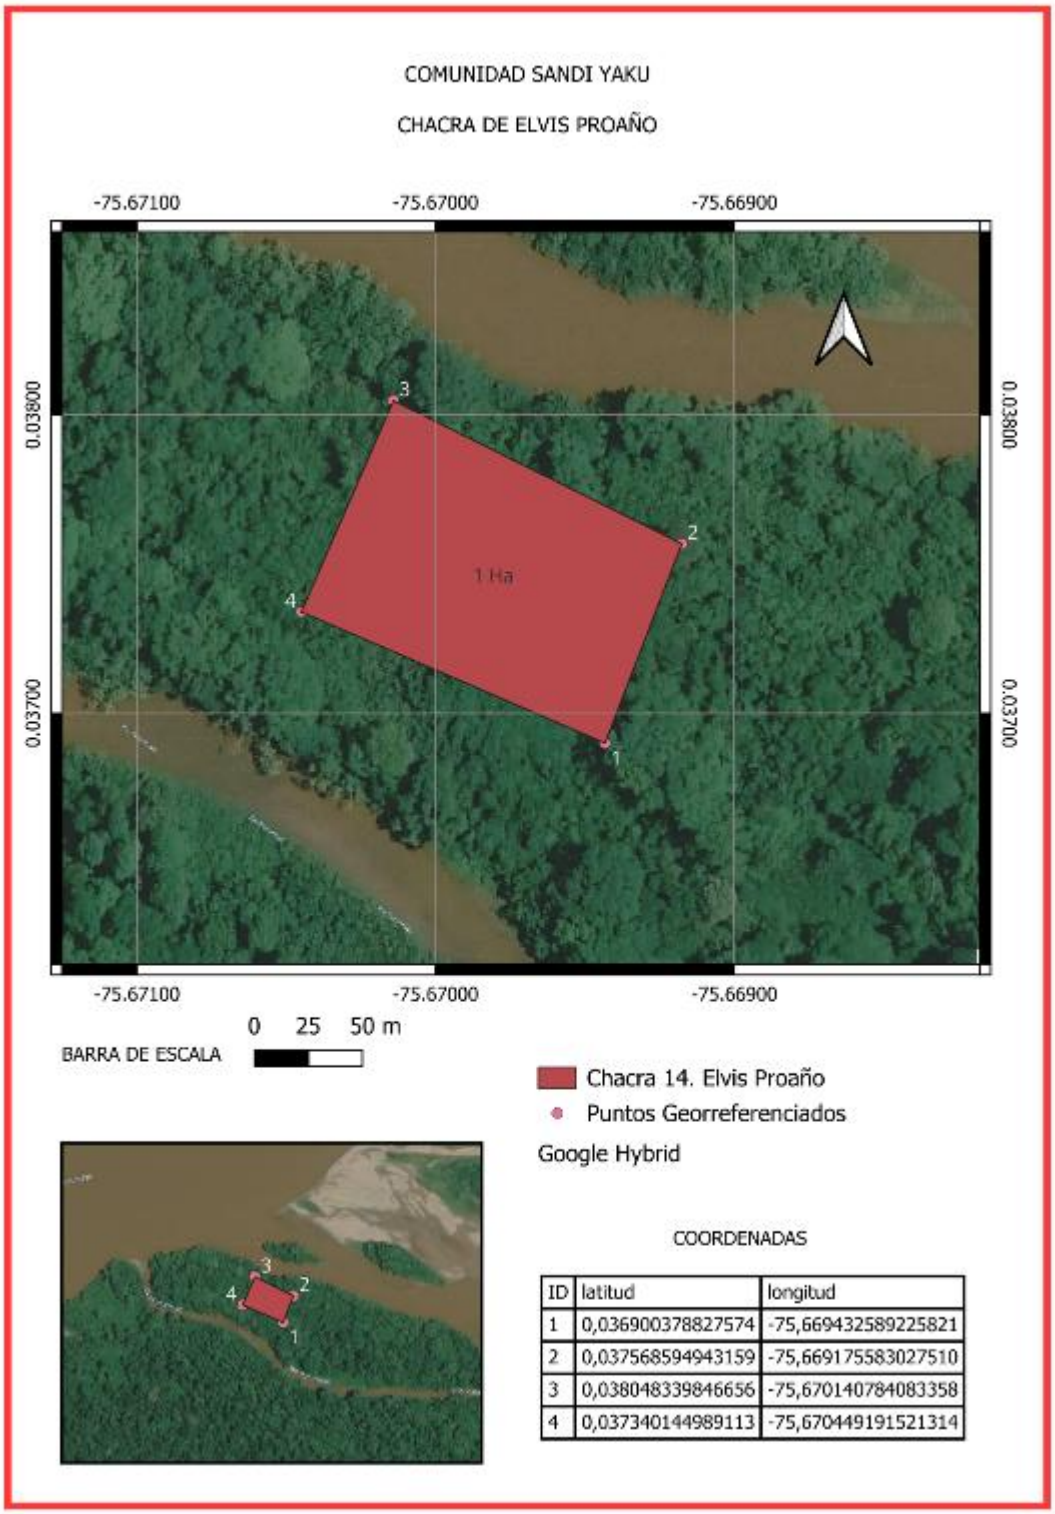

COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,036900378827574	-75,669432589225821
2	0,037568594943159	-75,669175583027510
3	0,038048339846656	-75,670140784083358
4	0,037340144989113	-75,670449191521314

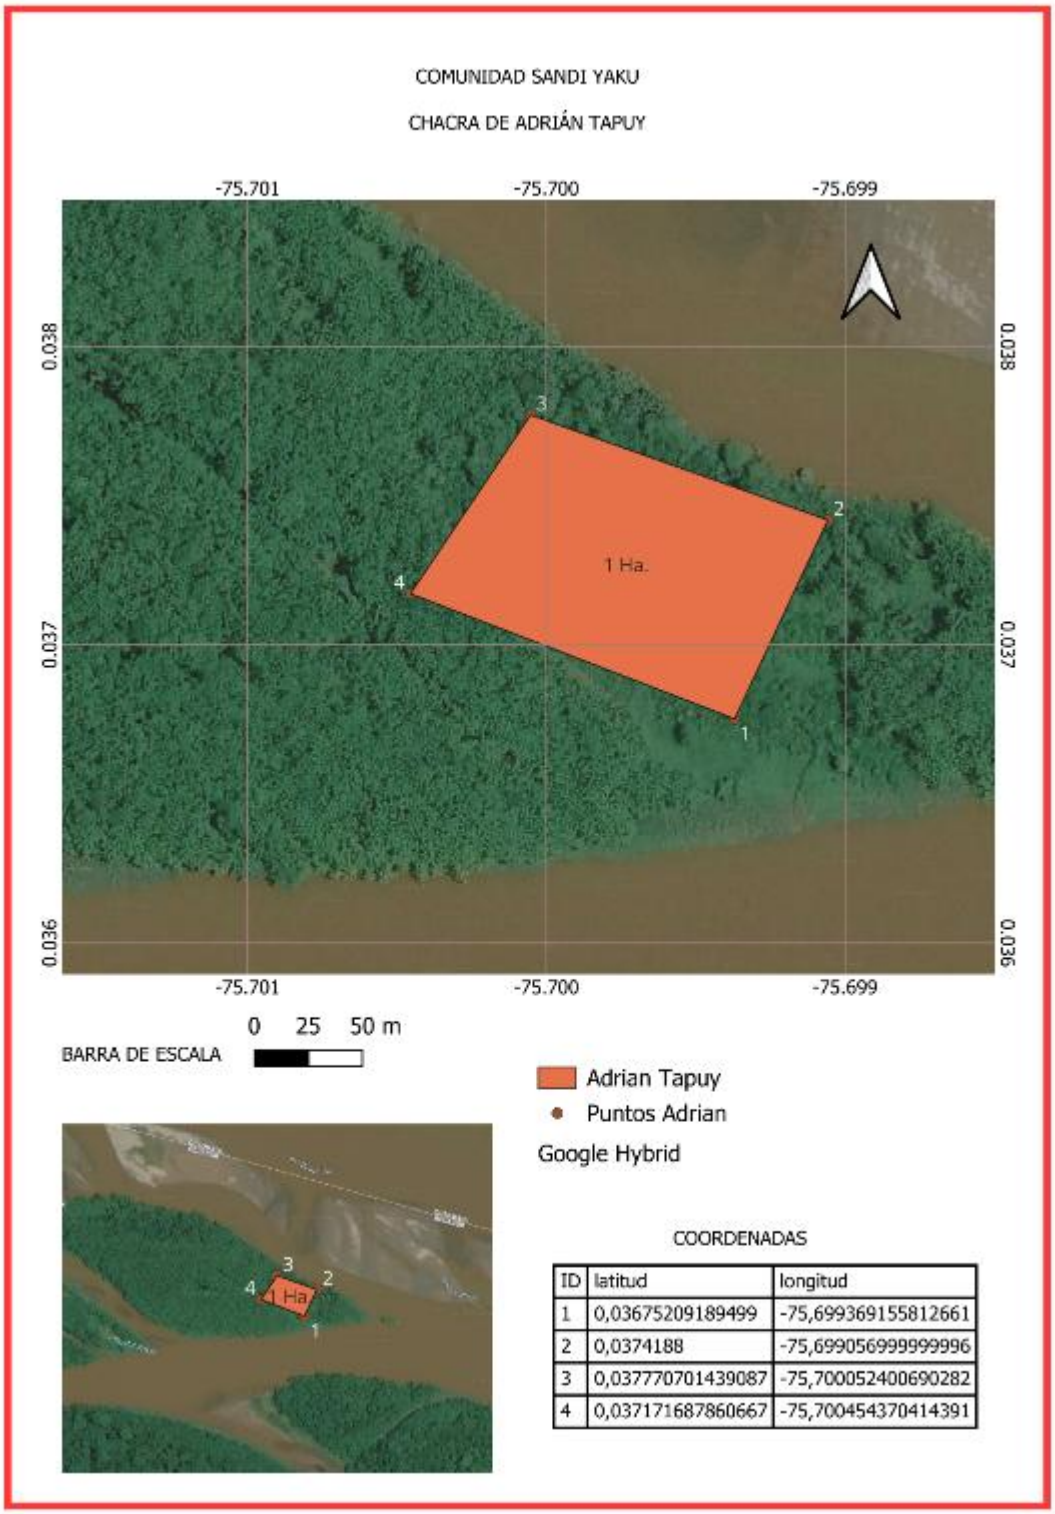

COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,03675209189499	-75,699369155812661
2	0,0374188	-75,699056999999996
3	0,037770701439087	-75,700052400690282
4	0,037171687860667	-75,700454370414391




COMUNIDAD KICHWA

SANDI YAKU

- Chacra 1. Lucy Abigail
- Chacra 2. María Abigail
- Chacra 3. Wilmer Aguinda
- Chacra 4. Merly Quintero
- Chacra 5. Judith Coquinche
- Chacra 6. Esteban Quintero
- Chacra 7. Clemente Tapuy
- Chacra 8. José Tapuy
- Chacra 9. Segundo Tapuy
- Chacra 10. Iván Quintero
- Chacra 11. Silvia Gabriela
- Chacra 12. Yeimi Achanga
- Chacra 13. Elvis Proaño
- Chacra 14. Rene Galindo
- Chacra 15. Adrian Tapuy

Google Hybrid

- **Anexo 6.6. Mapas de las chacras: Comunidad Lorenzó**

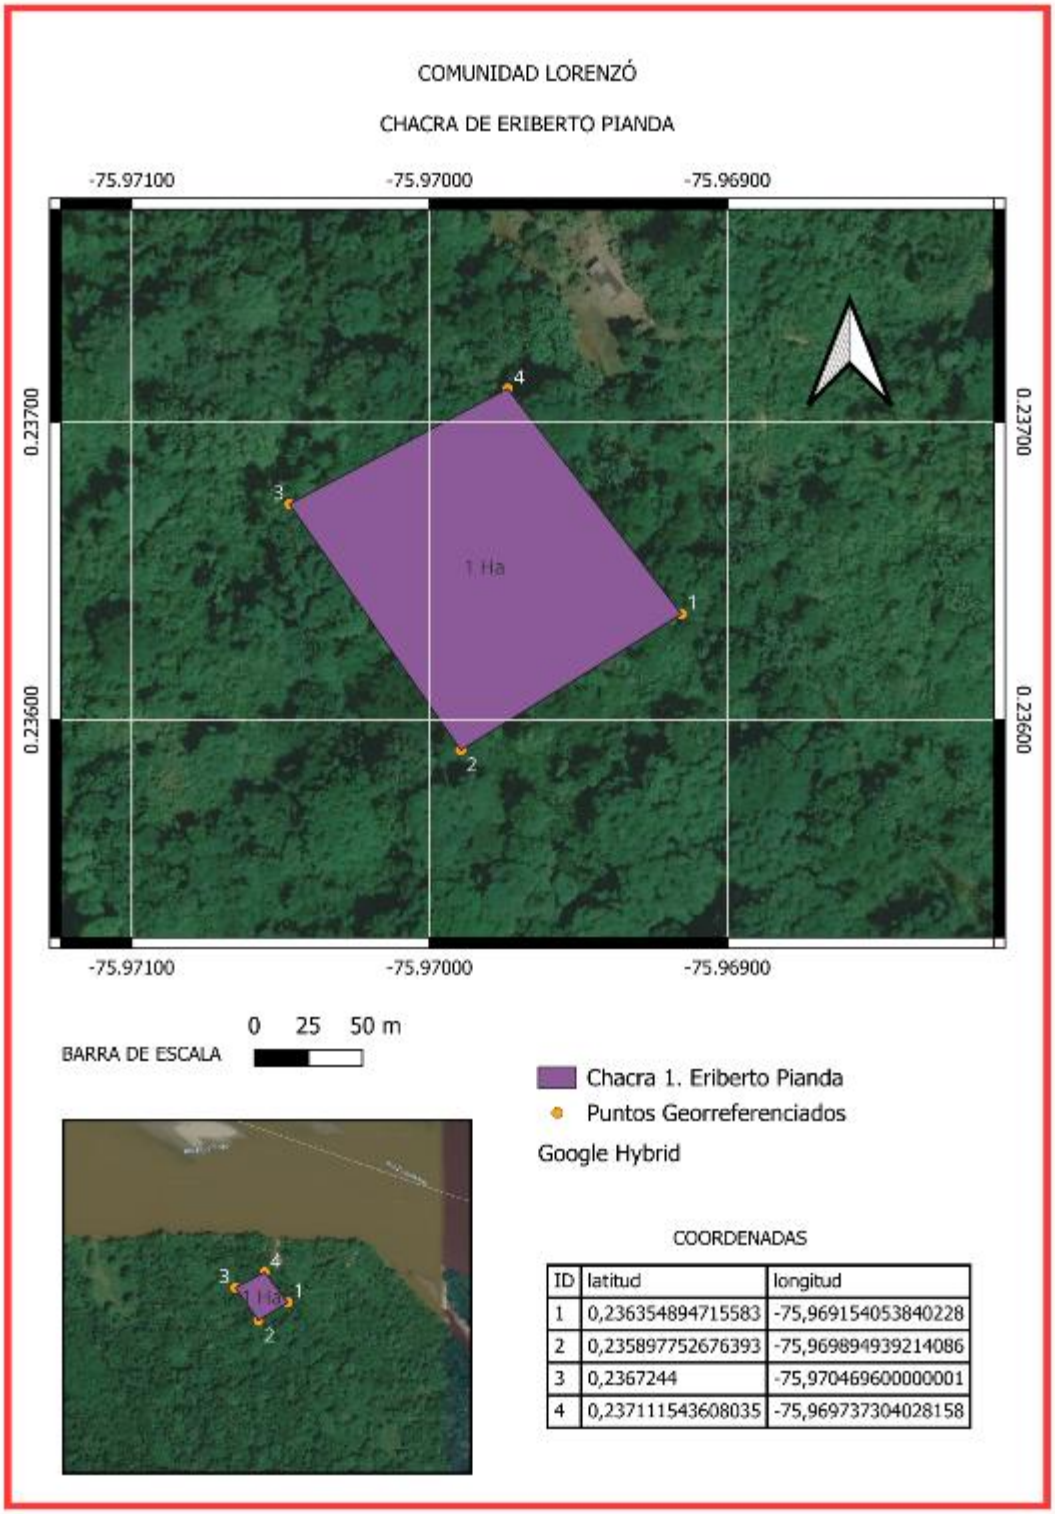


COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,236354894715583	-75,969154053840228
2	0,235897752676393	-75,969894939214086
3	0,2367244	-75,970469600000001
4	0,237111543608035	-75,969737304028158

COMUNIDAD LORENZÓ

CHACRA DE MARÍA PIANDA

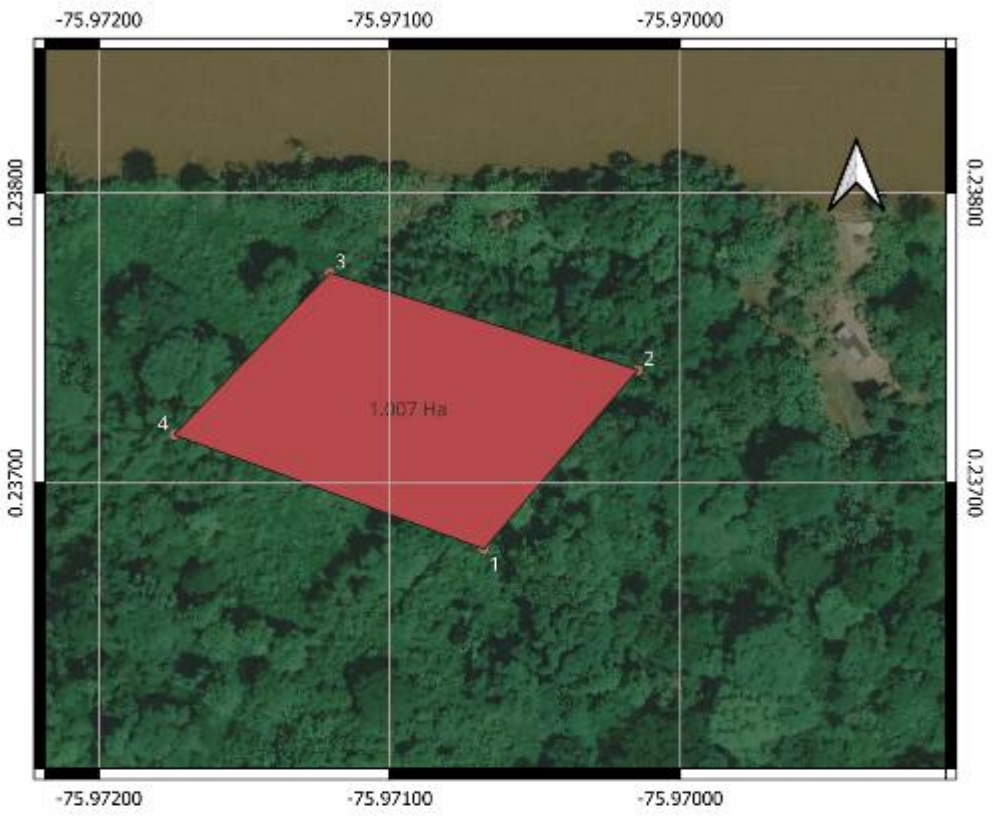

BARRA DE ESCALA 0 25 50 m



Chacra 2. María Pianda

Puntos Georreferenciados


Google Hybrid

COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,236772627306328	-75,970675233384426
3	0,237723692928085	-75,971205938510380
4	0,237166715271144	-75,971741898142525
2	0,2373898	-75,970145599999995

COMUNIDAD LORENZÓ

CHACRA DE JOSUÉ PIANDA

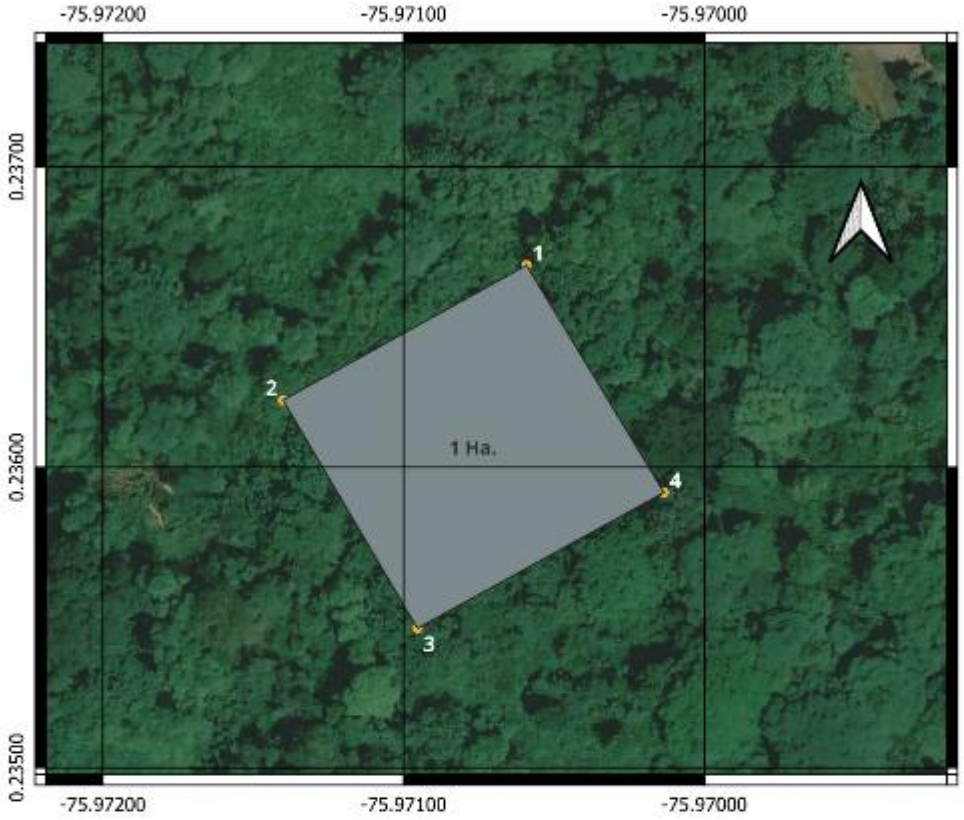

0 25 50 m

BARRA DE ESCALA

Chacra 3. Josué Pianda

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid




COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,236672793629097	-75,970591162134681
2	0,236223537171877	-75,971400349203805
3	0,235464267486867	-75,970953719977345
4	0,235916151174831	-75,970134023985239

COMUNIDAD LORENZÓ

CHACRA DE GUILLERMINA AGREDO

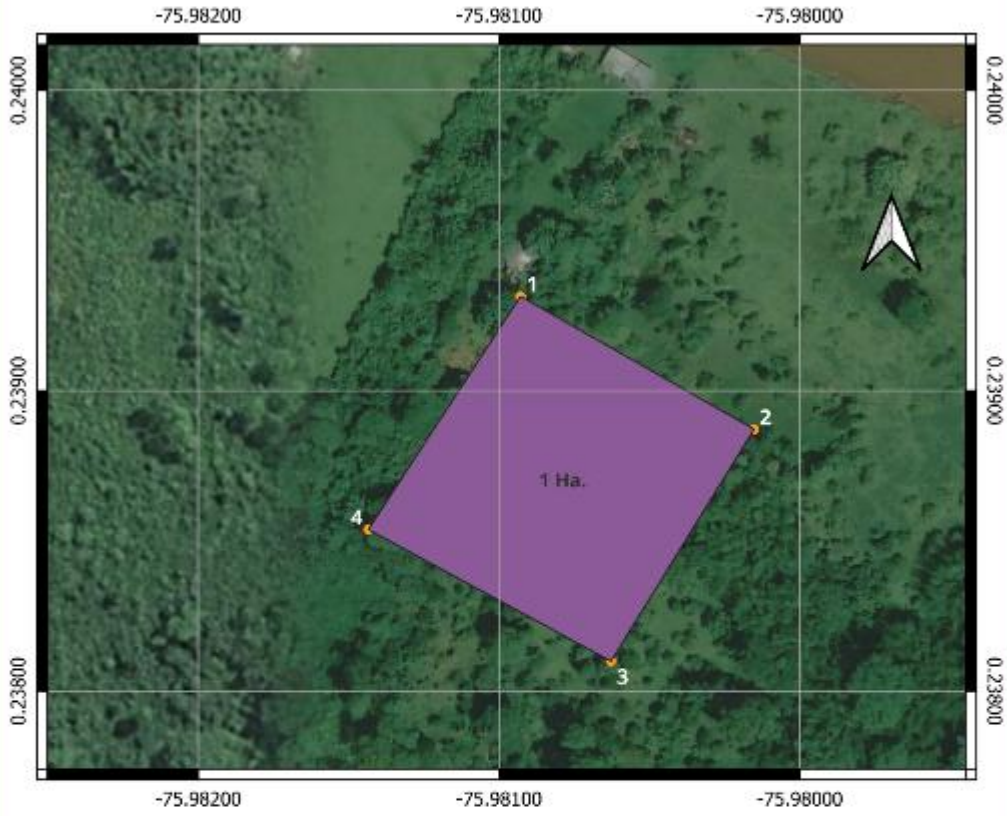

0 25 50 m

BARRA DE ESCALA



Chacra 4 Guillermina Agredo

Puntos Georreferenciados


Google Hybrid

COORDENADAS


ID	latitud	longitud
1	0,2393144	-75,980928199999994
2	0,238872072661238	-75,980152070041811
3	0,23809966918831	-75,980627597349979
4	0,238538415378714	-75,981434154717974

COMUNIDAD LORENZÓ

CHACRA DE JHONNY ESTUPIÑAN

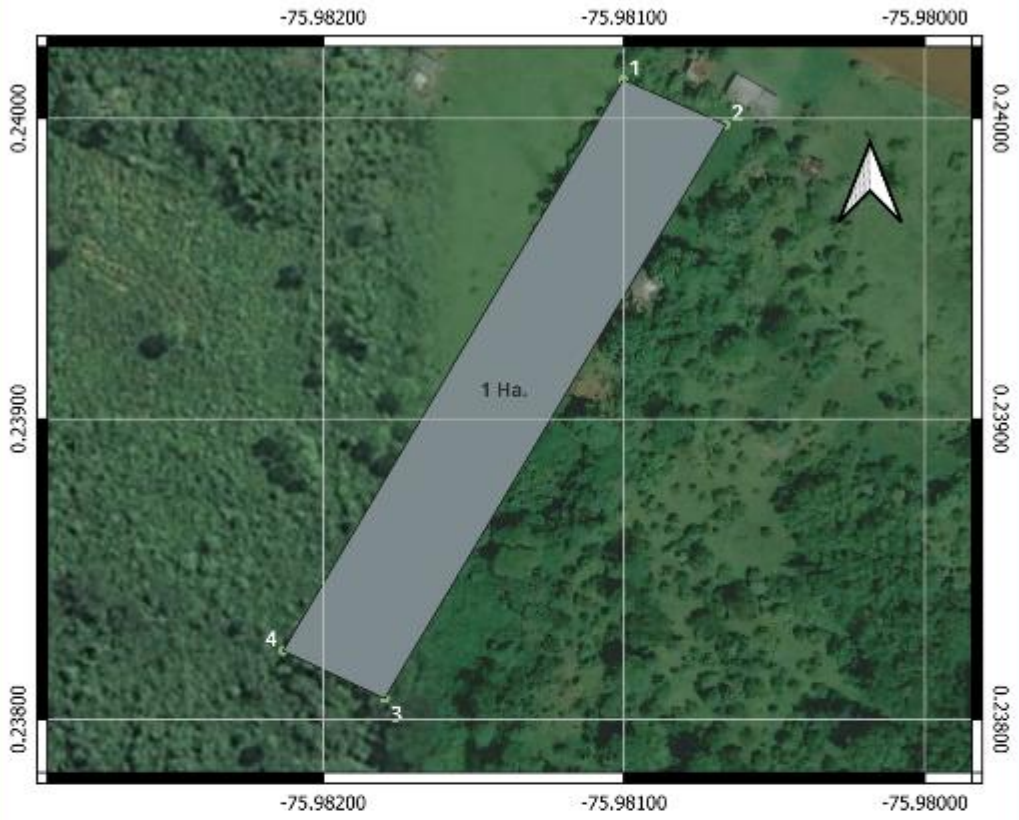

BARRA DE ESCALA 0 25 50 m

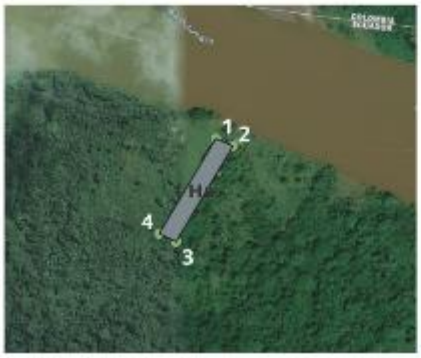

Chacra 5. Jhonny Estupiñán

Puntos Georreferenciados


Google Hybrid

COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,240129409235496	-75,981003129518896
2	0,239979657123244	-75,980661586616051
3	0,238069660741077	-75,981795903141403
4	0,238228608180525	-75,982133505164597

COMUNIDAD LORENZÓ

CHACRA DE ESTEBAN PIANDA

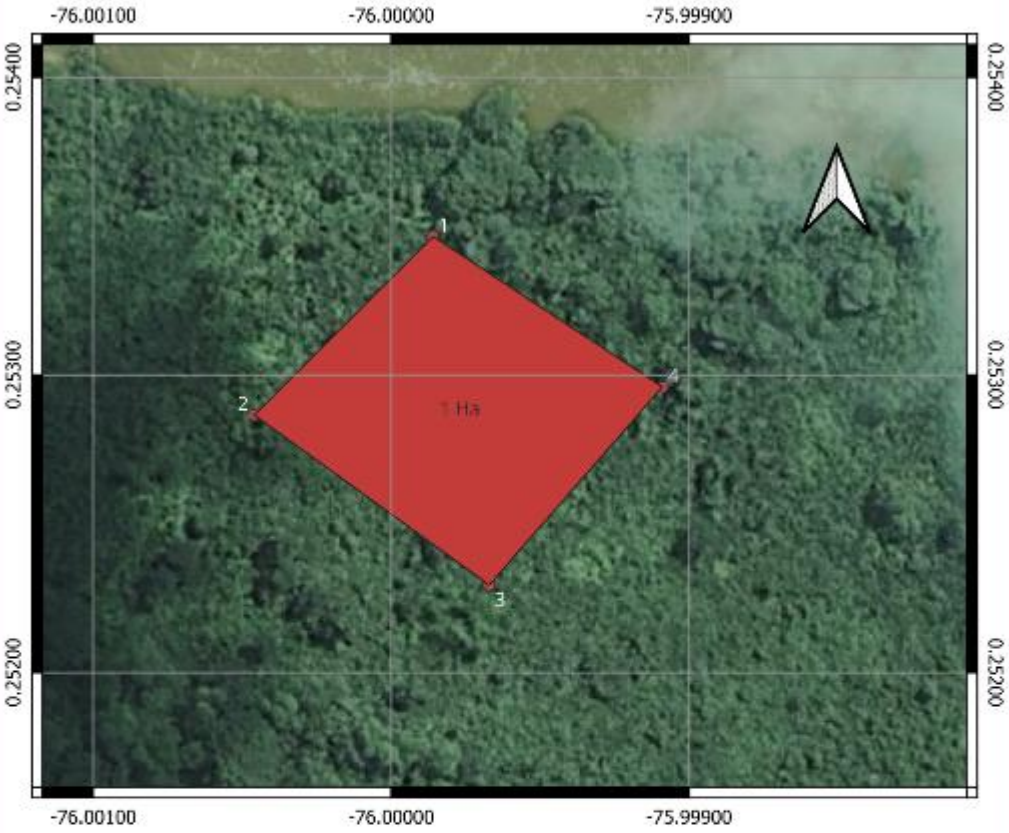

0 25 50 m

BARRA DE ESCALA




Chacra 6. Esteban Pianda

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid

COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,253465224015912	-75,999859747135929
2	0,252865542886534	-76,000459428265316
3	0,252294418001412	-75,999671275923859
4	0,252959778492578	-75,999090156353247

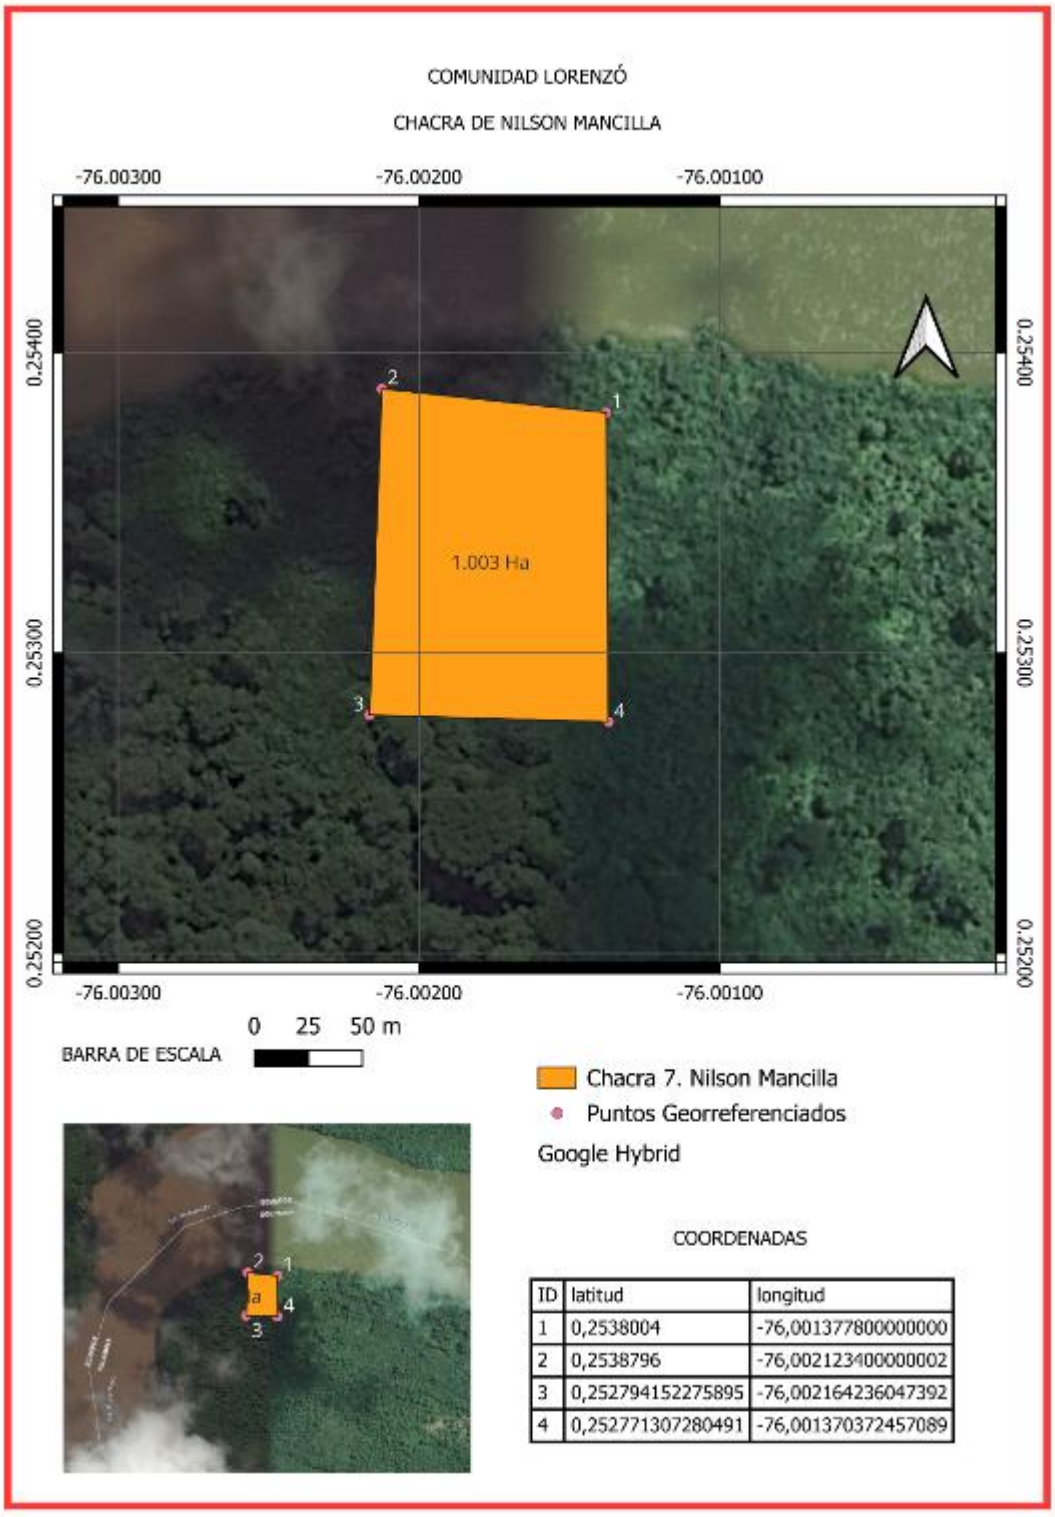


COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,2538004	-76,001377800000000
2	0,2538796	-76,002123400000002
3	0,252794152275895	-76,002164236047392
4	0,252771307280491	-76,001370372457089

COMUNIDAD LORENZÓ

CHACRA DE CRUCILDA CISNEROS

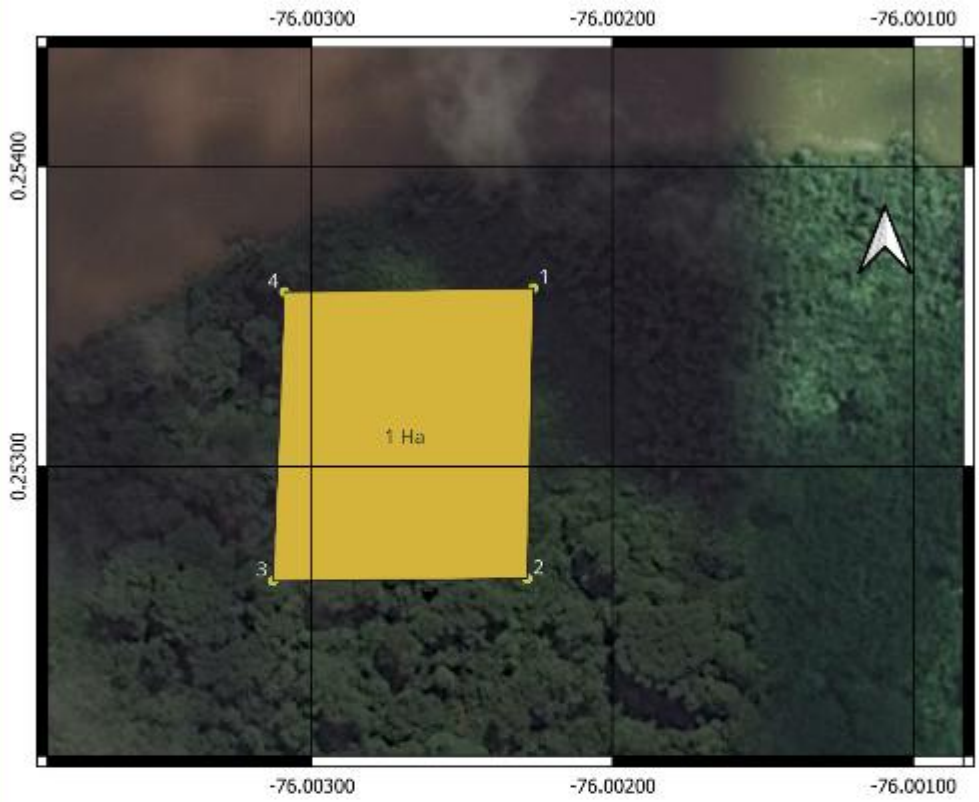

0 25 50 m

BARRA DE ESCALA



Chacra 8. Crucilda Cisneros

Puntos Georreferenciados


Google Hybrid

COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,253594326872867	-76,002263505708157
2	0,252627031574232	-76,002284251988030
3	0,252619251719283	-76,003129662892462
4	0,2535807	-76,003091499999996

COMUNIDAD LORENZÓ

CHACRA DE DEISY MINA

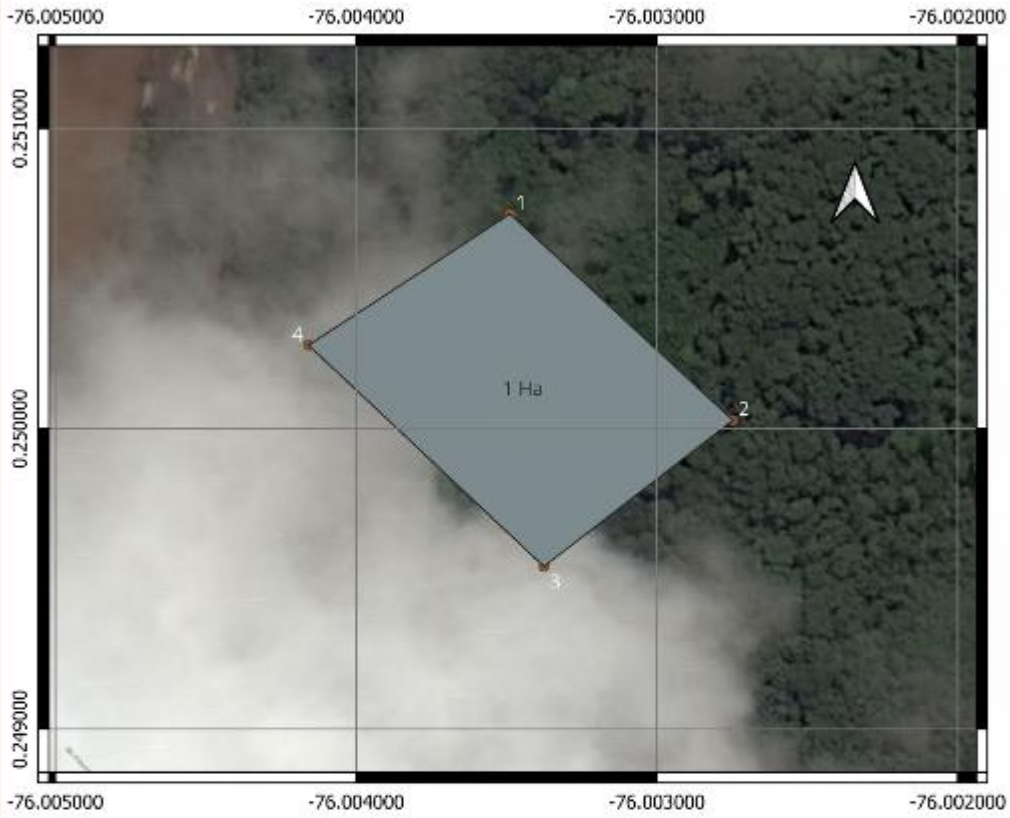

0 25 50 m

BARRA DE ESCALA

Chacra 9. Deisy Mina

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid



COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,250715257694052	-76,003487817968633
2	0,2500284800197	-76,002746783430197
3	0,249541596055138	-76,003375020803844
4	0,250278347156941	-76,004157461896469

COMUNIDAD LORENZÓ

CHACRA DE ALEXANDRA PAYAGUAJE



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA




Chacra 10. Alexandra Payaguaje

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid

COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,264404497952218	-75,984159383873703
2	0,264904890593001	-75,983411642096897
3	0,264415886689418	-75,982656426461219
4	0,263860685750853	-75,983425522120299

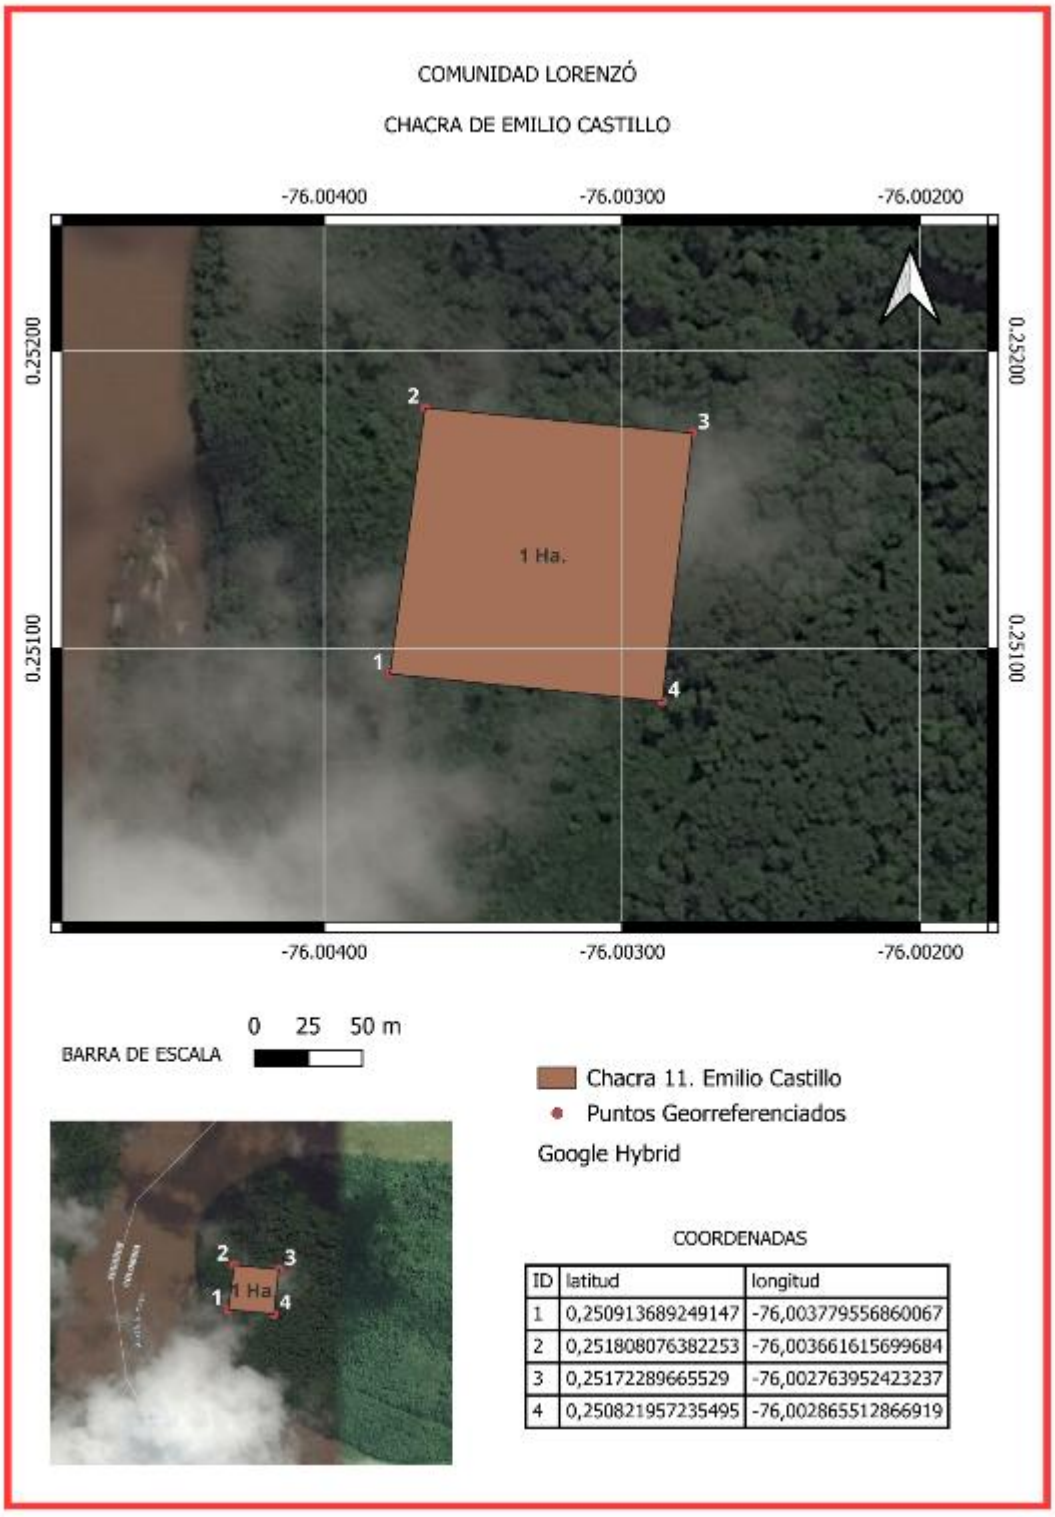


COORDENADAS

ID	latitud	longitud
1	0,250913689249147	-76,003779556860067
2	0,251808076382253	-76,003661615699684
3	0,25172289665529	-76,002763952423237
4	0,250821957235495	-76,002865512866919

COMUNIDAD LORENZÓ

CHACRA DE ALEXANDER VALENCIA

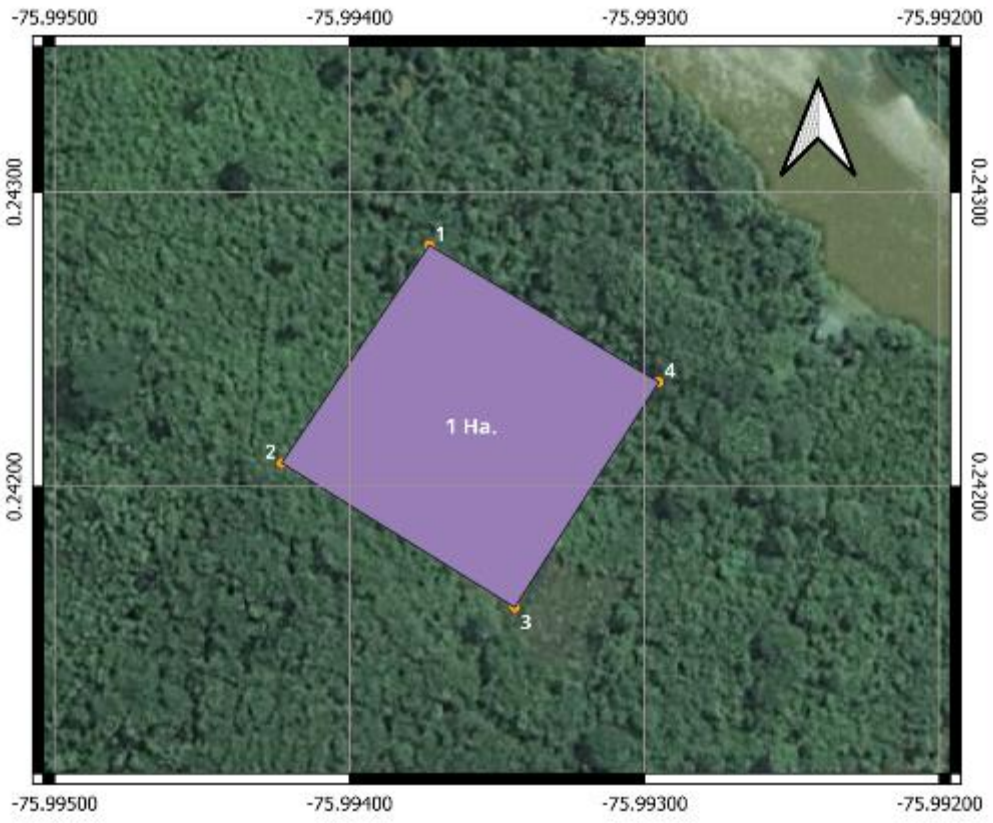

BARRA DE ESCALA 0 25 50 m



Chacra 12. Alexander Valencia

Alexander Valencia

Google Hybrid

COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	-75,99373	0,24282
2	-75,99423	0,24208
3	-75,99344	0,24159

COMUNIDAD LORENZÓ

CHACRA DE LAUDRIANO AGREDO



BARRA DE ESCALA 0 25 50 m



Chacra 13. Laudriano Agredo

Laudriano Agredo

Google Hybrid

COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	-75,99801	0,24395
2	-75,9984	0,24314
3	-75,99756	0,2428
4	-75,99712	0,24364

COMUNIDAD LORENZÓ

CHACRA DE NOE MINA



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA

Chacra 14. Noe Mina

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid



COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	-75,9895	0,24119
2	-75,99001	0,24043
3	-75,98919	0,24005
4	-75,988682	0,240804

COMUNIDAD LORENZÓ

CHACRA DE RAÚL GUEVARA



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA

Chacra 15. Raúl Guevara

Raúl Guevara

Google Hybrid



COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	-76,00135	0,24465
2	-76,00139	0,24374
3	-76,00047	0,24368
4	-76,00044	0,24459



COMUNIDAD AFROECUATORIANA


LORENZÓ

- Chacra 1. Eriberto Pianda
- Chacra 2. María Pianda
- Chacra 3. Josué Pianda
- Chacra 4. Guillermina Agredo
- Chacra 5. Jhonny Estupiñán
- Chacra 6. Esteban Pianda
- Chacra 7. Nilson Mancilla
- Chacra 8. Crucilda Cisneros
- Chacra 9. Deysi Mina
- Chacra 10. Emilio Castillo
- Chacra 11. Alexandra Payaguaje
- Chacra 12. Alexander Valencia
- Chacra 13. Laudriano Agredo
- Chacra 14. Noe Mina
- Chacra 15. Raúl Guevara

Google Hybrid

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec


- **Anexo 6.7. Mapas de las chacras: Comunidad San José de Wisuya.**

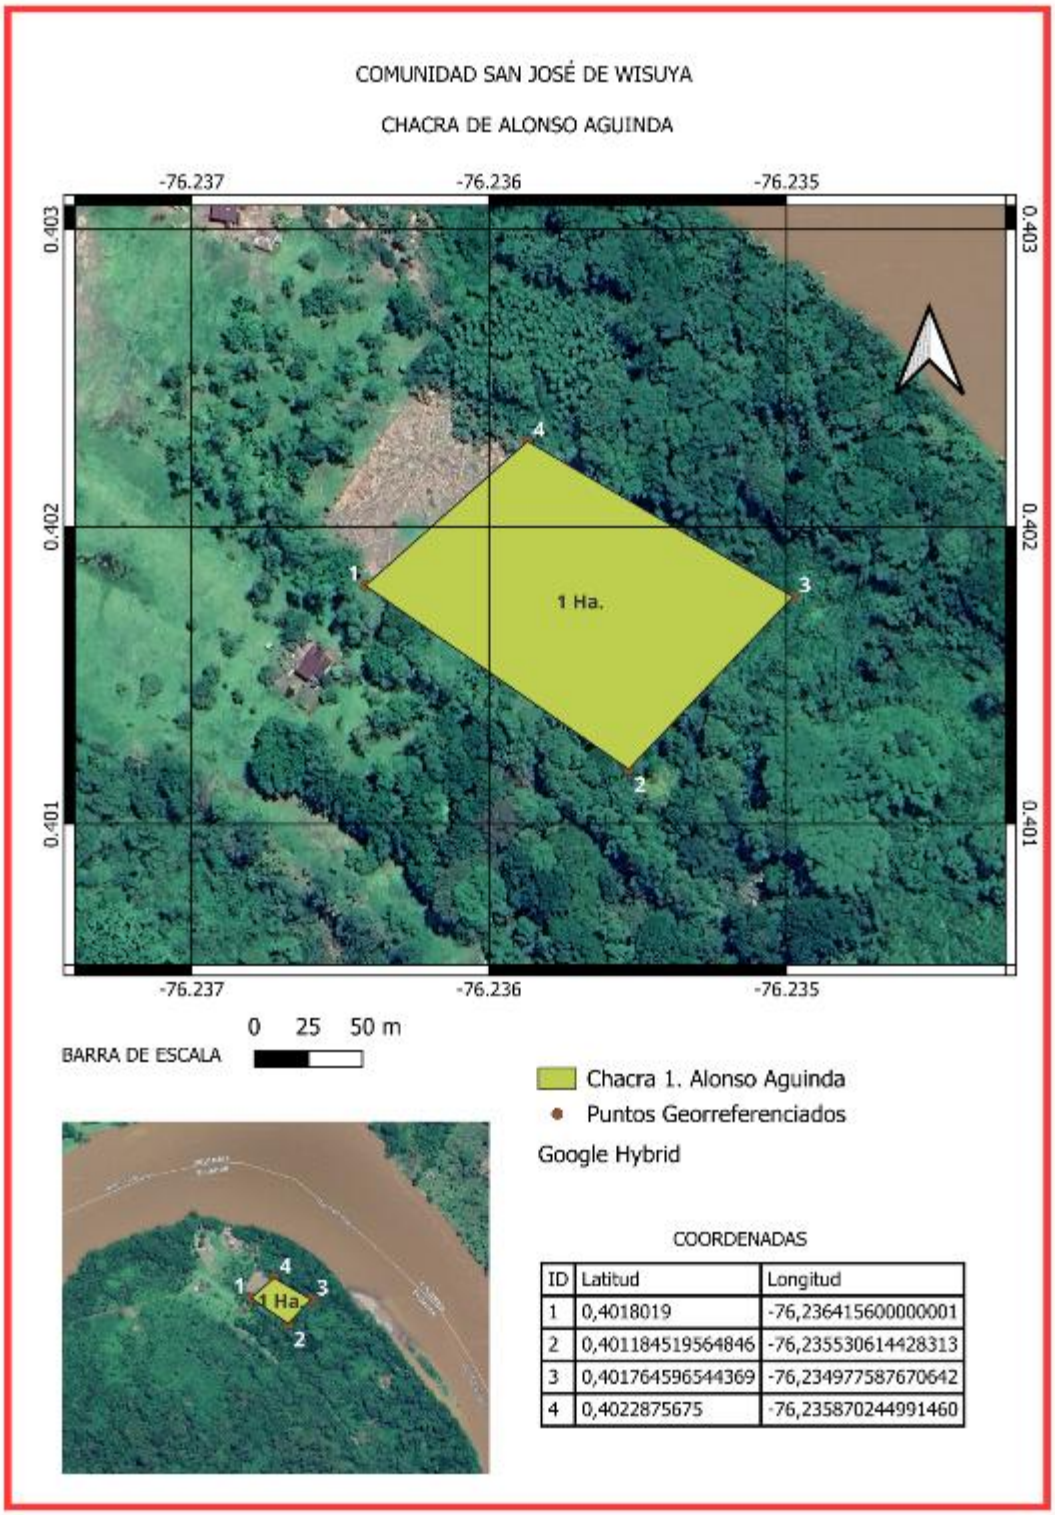

ID	Latitud	Longitud
1	0,4018019	-76,236415600000001
2	0,401184519564846	-76,235530614428313
3	0,401764596544369	-76,234977587670642
4	0,4022875675	-76,235870244991460

COMUNIDAD SAN JOSÉ DE WISUYA

CHACRA DE DAGO AGUINDA

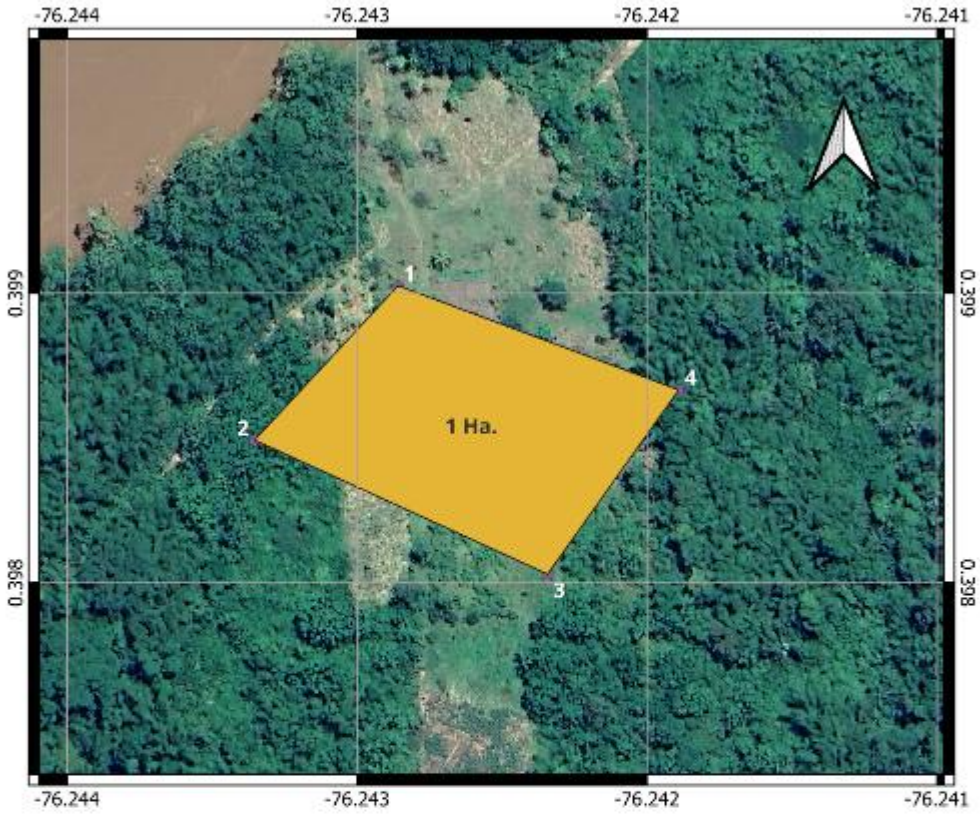

0 25 50 m

BARRA DE ESCALA




Chacra 2. Dago Aguinda

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid


COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,3990266	-76,242857900000004
2	0,3984937	-76,243352500000000
3	0,398030611192306	-76,242341926463538
4	0,398666634082764	-76,241889919488088

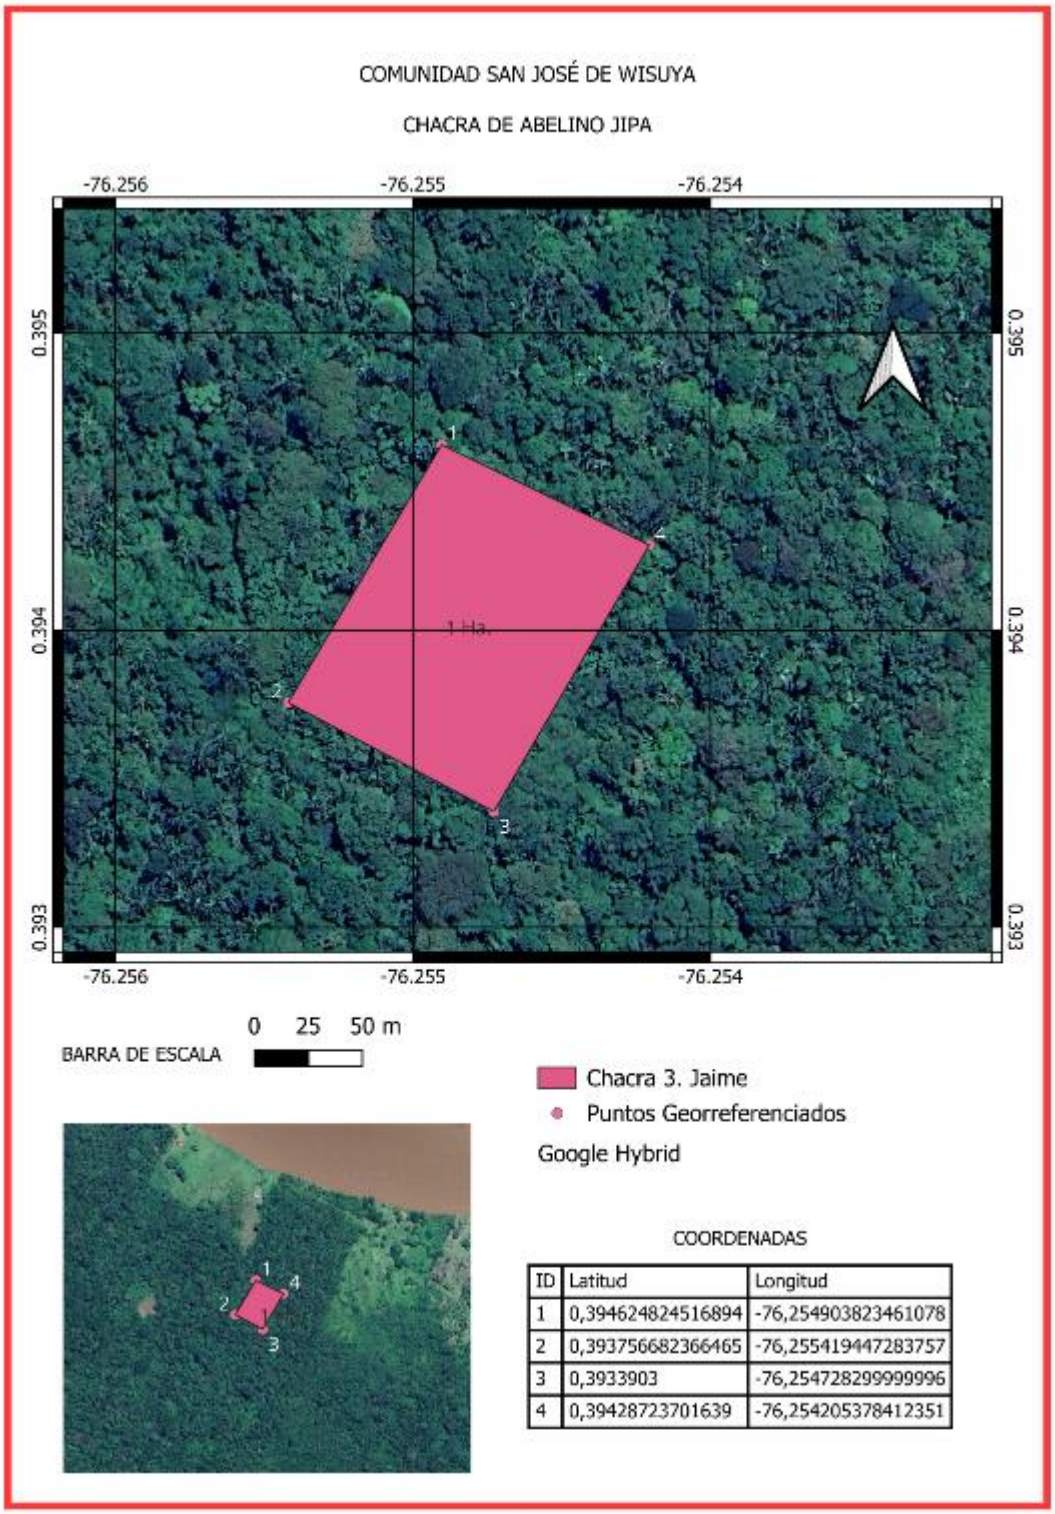

COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,394624824516894	-76,254903823461078
2	0,393756682366465	-76,255419447283757
3	0,3933903	-76,254728299999996
4	0,39428723701639	-76,254205378412351

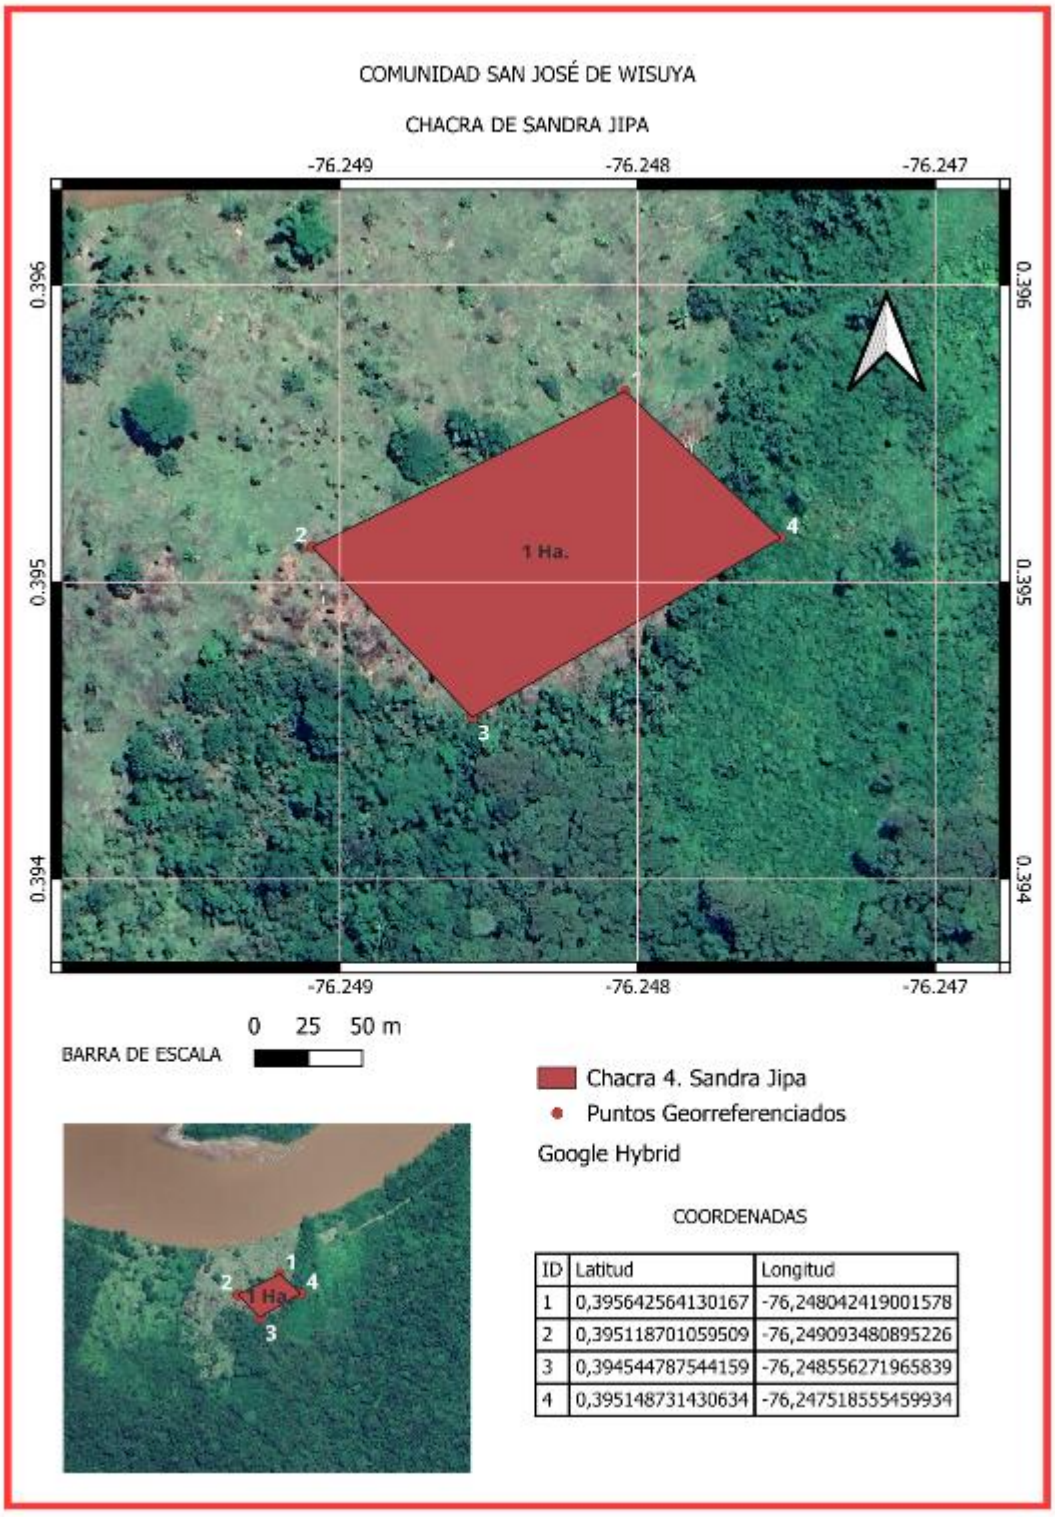

COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,395642564130167	-76,248042419001578
2	0,395118701059509	-76,249093480895226
3	0,394544787544159	-76,248556271965839
4	0,395148731430634	-76,247518555459934

COMUNIDAD SAN JOSÉ DE WISUYA

CHACRA DE MARCELO SOLANO



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA



Chacra 5. Marcelo Solano

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid

COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,42173779890785	-76,267362418088737
2	0,422535294334471	-76,266635706279871
3	0,422983590580205	-76,267296353378839
4	0,422615976791 81	-76,267999470648462



COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,42161894052901	-76,267297282760225
2	0,422446033771331	-76,266381572384802
3	0,421865099232082	-76,265997564808004
4	0,421082314556314	-76,266745887265344

COMUNIDAD SAN JOSÉ DE WISUYA

CHACRA DE CECILIA CHINDOY



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA

Chacra 7. Cecilia Chindoy

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid



COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,421778107679181	-76,265915516723538
2	0,421100162457338	-76,265461927474391
3	0,420378321501706	-76,266237418771325
4	0,420909947610922	-76,266754412969277

COMUNIDAD SAN JOSÉ DE WISUYA

CHACRA DE SANDRO PIAGUAJE



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA




Chacra 8. Sandro Piaguaje

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid


COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,423152437241936	-76,261639234758064
2	0,423202939306451	-76,260808246241950
3	0,422312266532276	-76,260551144822585
4	0,422169942532279	-76,261382133338714

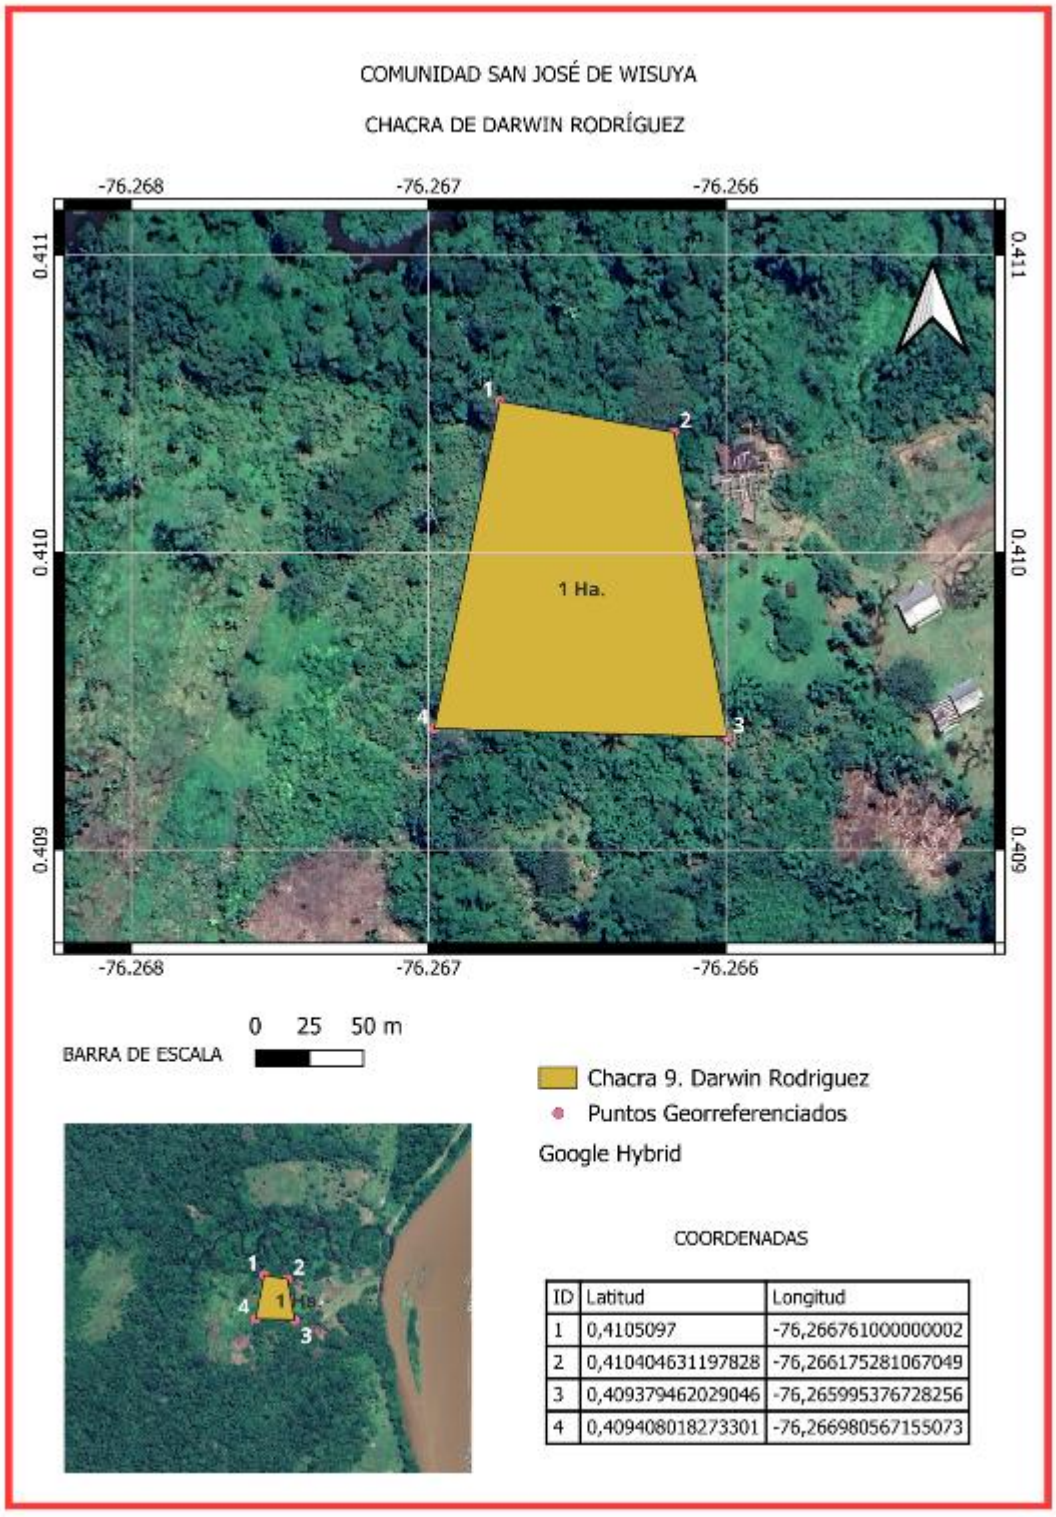


COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,4105097	-76,266761000000002
2	0,410404631197828	-76,266175281067049
3	0,409379462029046	-76,265995376728256
4	0,409408018273301	-76,266980567155073

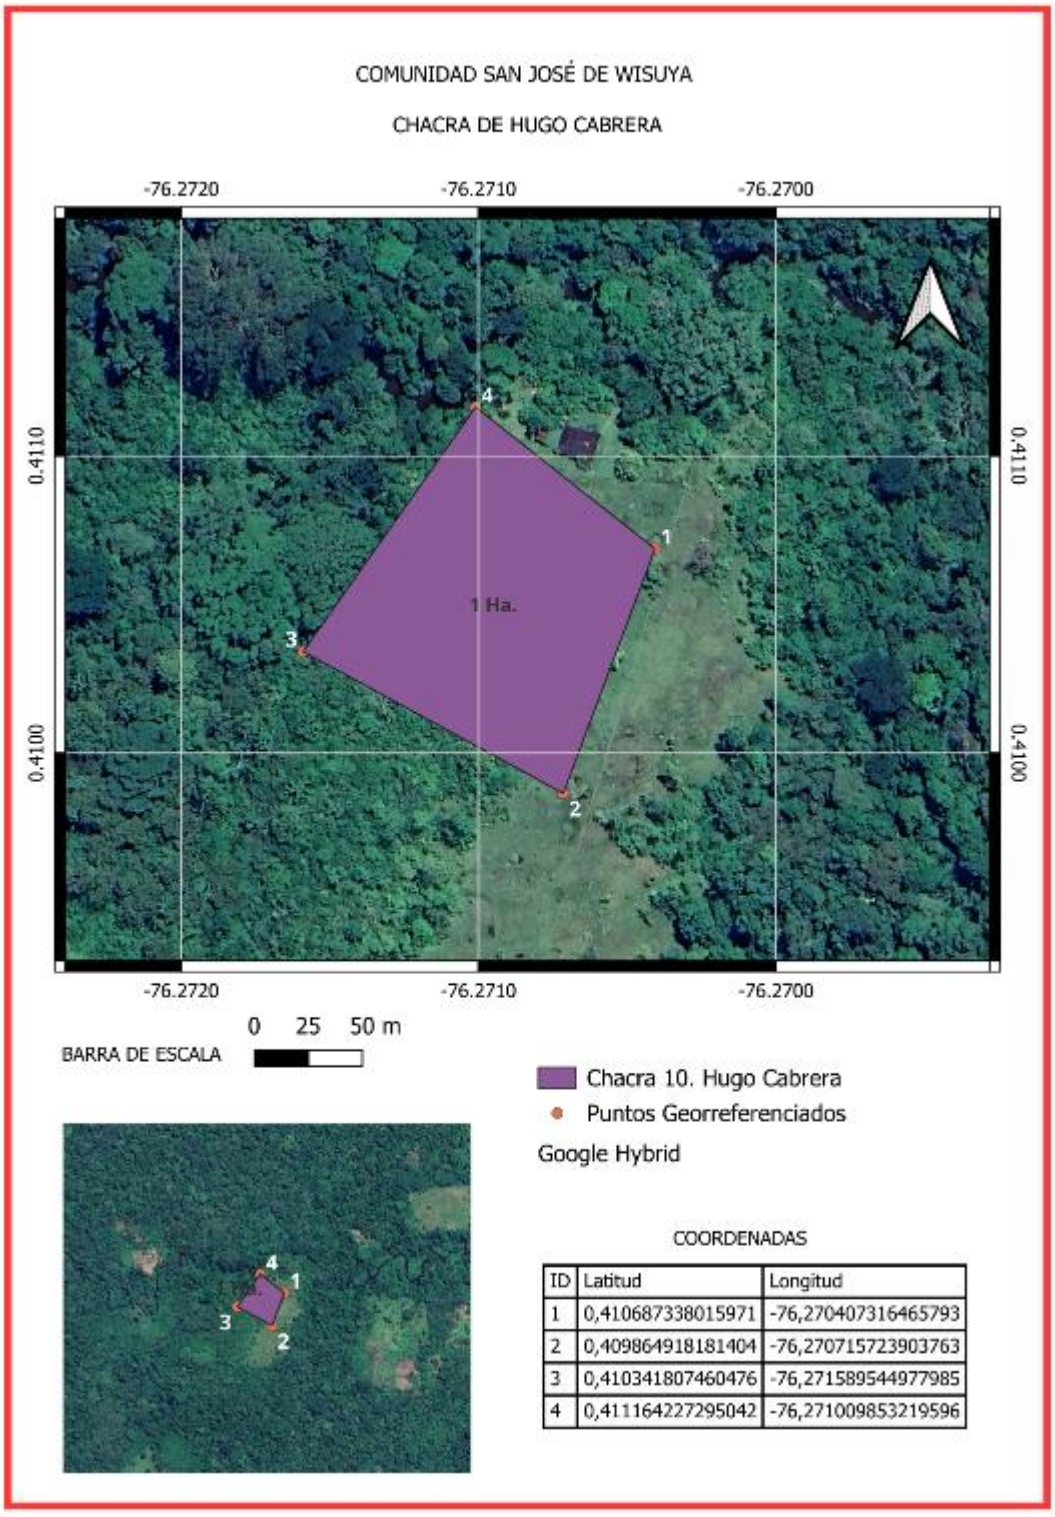


COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,410687338015971	-76,270407316465793
2	0,409864918181404	-76,270715723903763
3	0,410341807460476	-76,271589544977985
4	0,411164227295042	-76,271009853219596

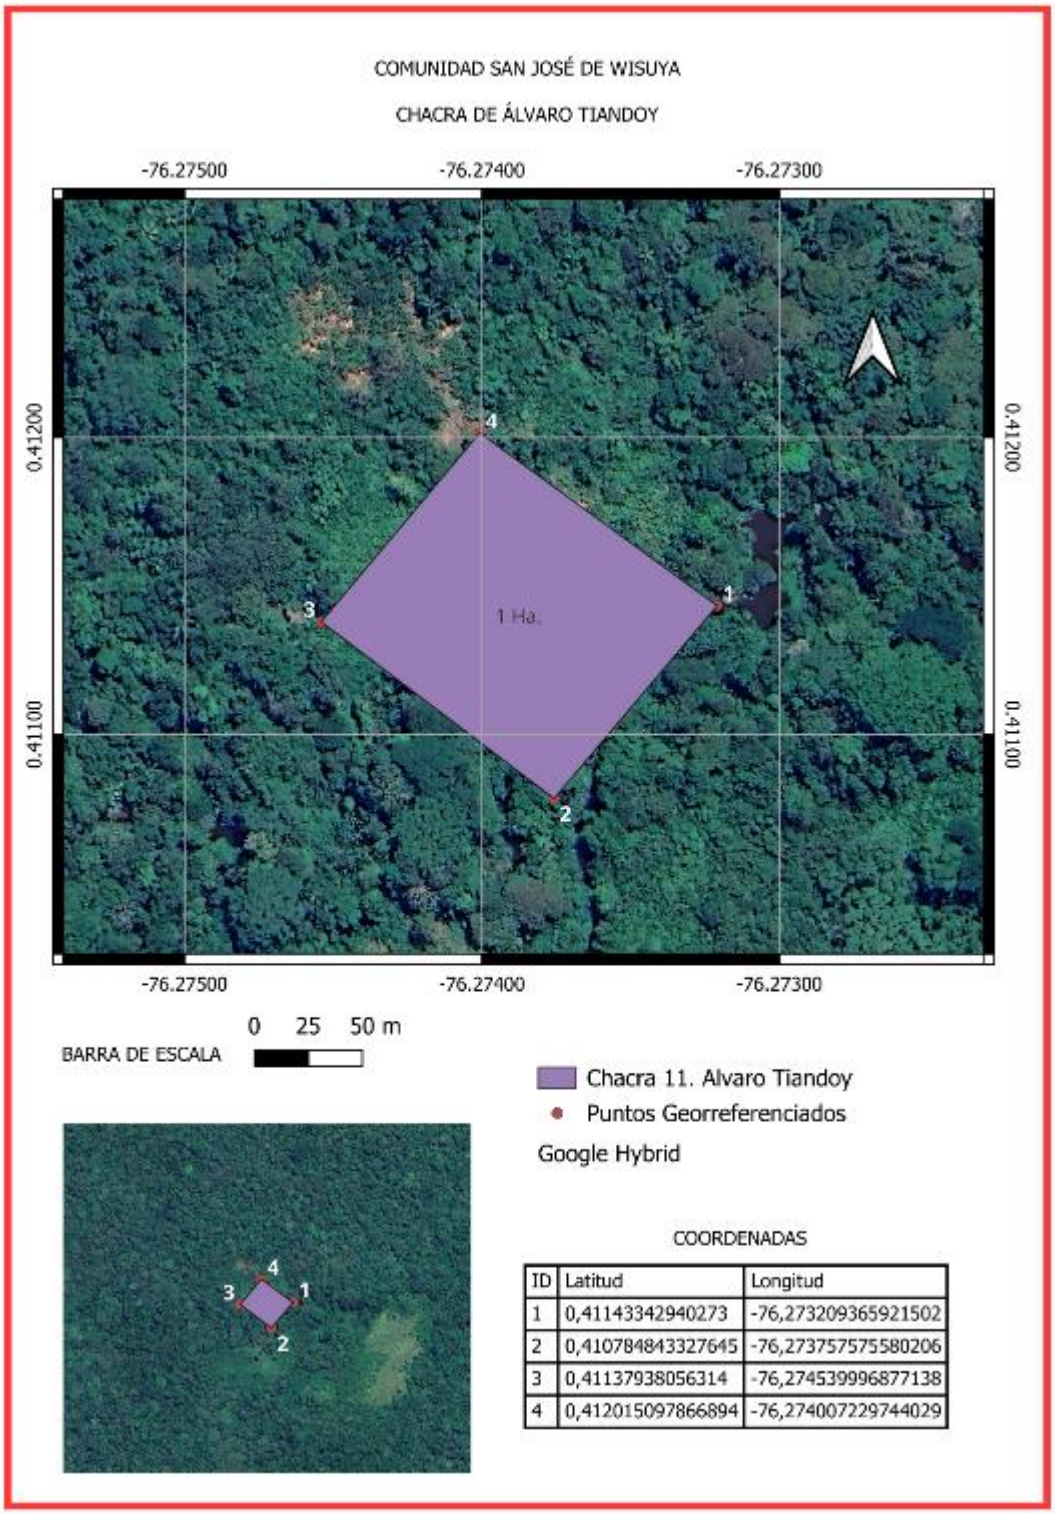


COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,41143342940273	-76,273209365921502
2	0,410784843327645	-76,273757575580206
3	0,41137938056314	-76,274539996877138
4	0,412015097866894	-76,274007229744029

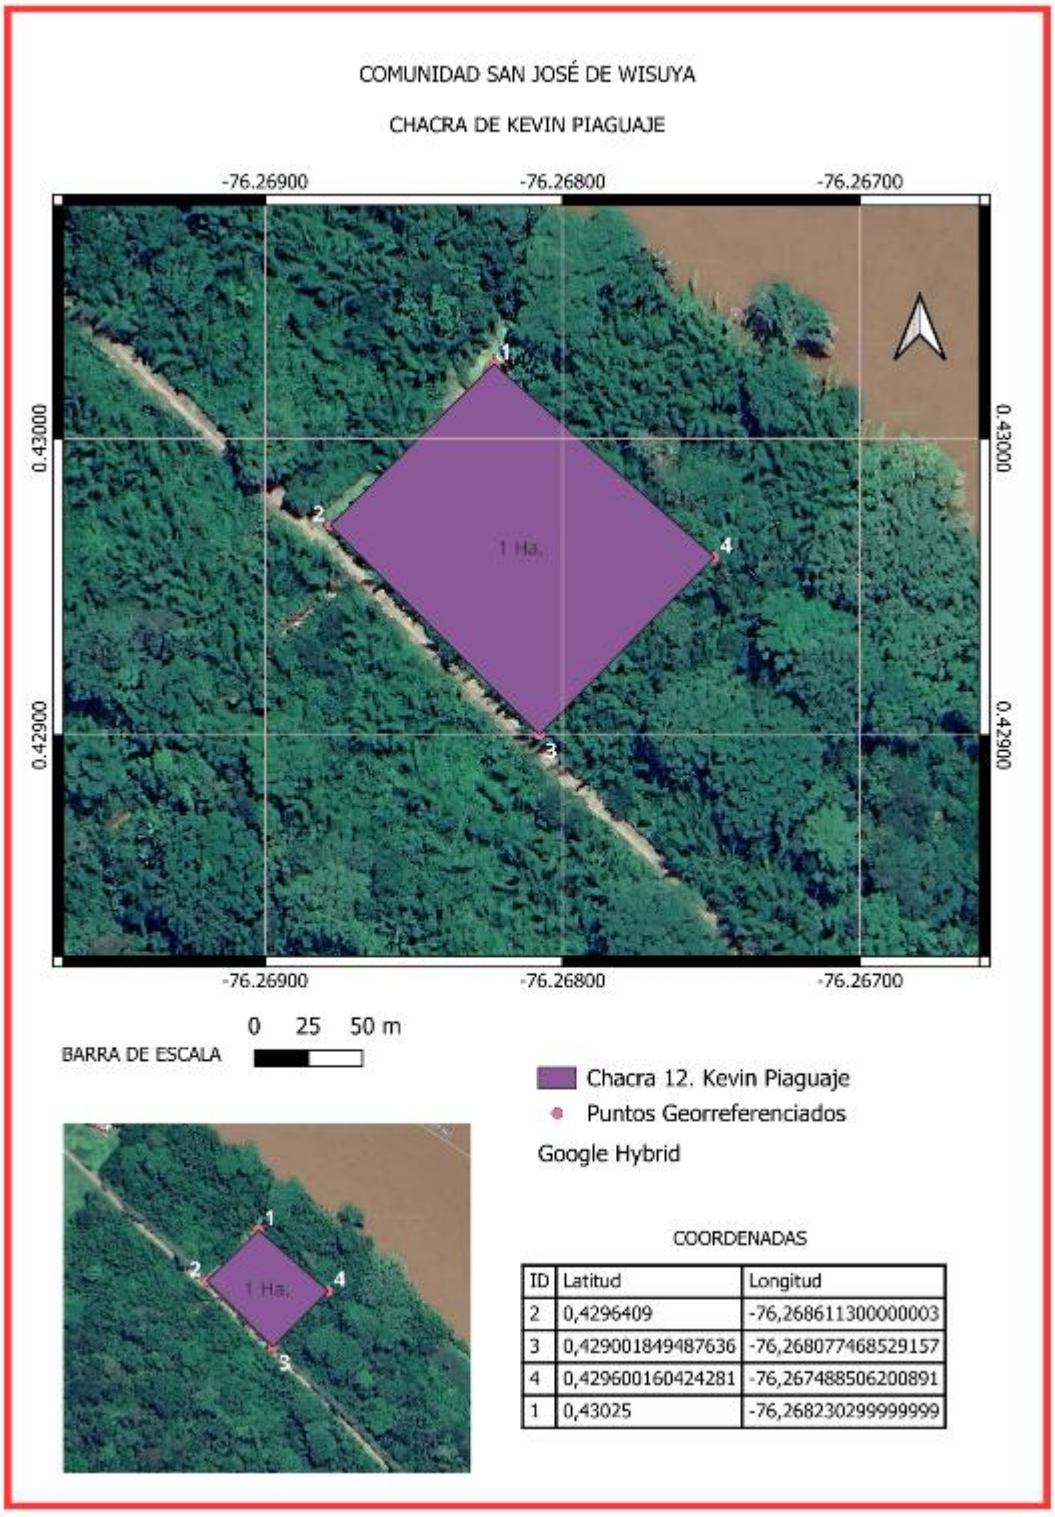

COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
2	0,4296409	-76,268611300000003
3	0,429001849487636	-76,268077468529157
4	0,429600160424281	-76,267488506200891
1	0,43025	-76,268230299999999

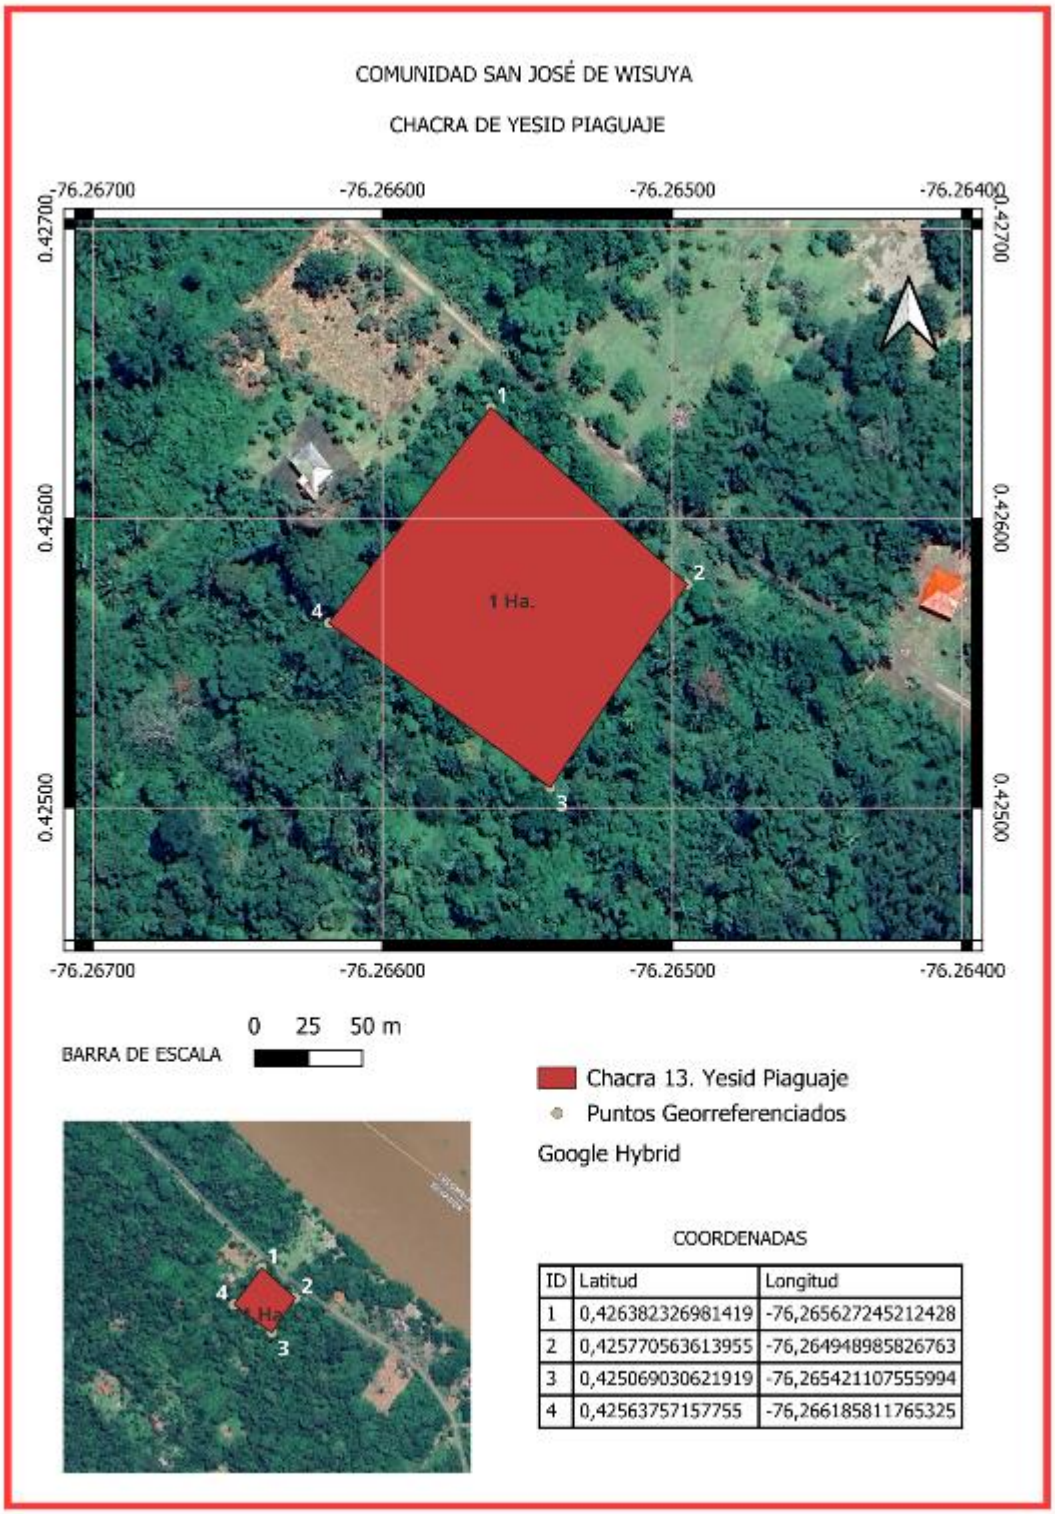

COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,426382326981419	-76,265627245212428
2	0,425770563613955	-76,264948985826763
3	0,425069030621919	-76,265421107555994
4	0,42563757157755	-76,266185811765325

COMUNIDAD SAN JOSÉ DE WISUYA

CHACRA DE RAMIRO ARBOLEDA



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA

Chacra 14. Ramiro Arboleda

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid



COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,410552294273796	-76,269439247961827
2	0,409668932499052	-76,269586474924282
3	0,409793065036026	-76,270498704730883
4	0,410685087220326	-76,270328383342942

COMUNIDAD SAN JOSÉ DE WISUYA

CHACRA DE GUSTAVO AGUINDA



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA

Chacra 15. Gustavo Aguinda

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid



COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,401498409651118	-76,236012273653756
2	0,400993985589685	-76,235261595326108
3	0,40024330726204	-76,235766019387540
4	0,400819224497535	-76,236560387988234

Cuenca Putumayo Içá

SUCUMBÍOS PREFECTURA



CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec


Secretaria do Meio Ambiente · AMAZONAS · Ambiente · Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica · PERÚ Ministerio del Ambiente

Financiado por: gef fondo para el medio ambiente mundial

Implementado por: GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por: Wildlife Conservation Society


- **Anexo 6.8. Mapa de las chacras: Comunidad Chandia Na´en.**

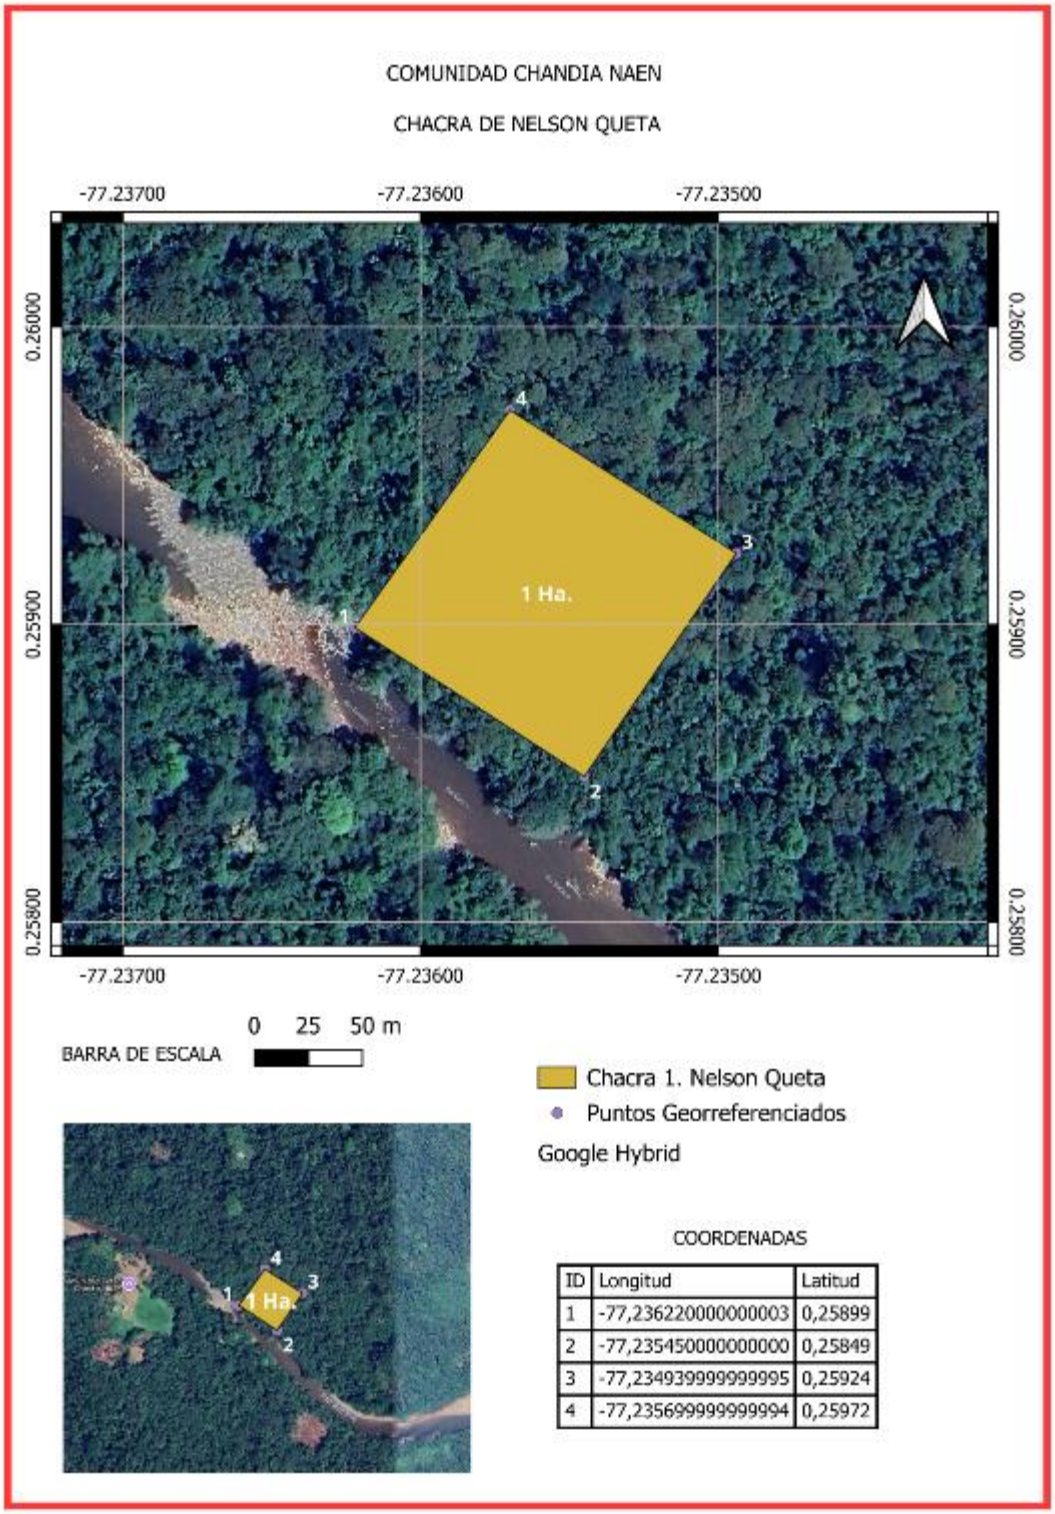

ID	Longitud	Latitud
1	-77,236220000000003	0,25899
2	-77,235450000000000	0,25849
3	-77,234939999999995	0,25924
4	-77,235699999999994	0,25972

COMUNIDAD CHANDIA NA´EN

CHACRA DE SILVERIO DESCANSE

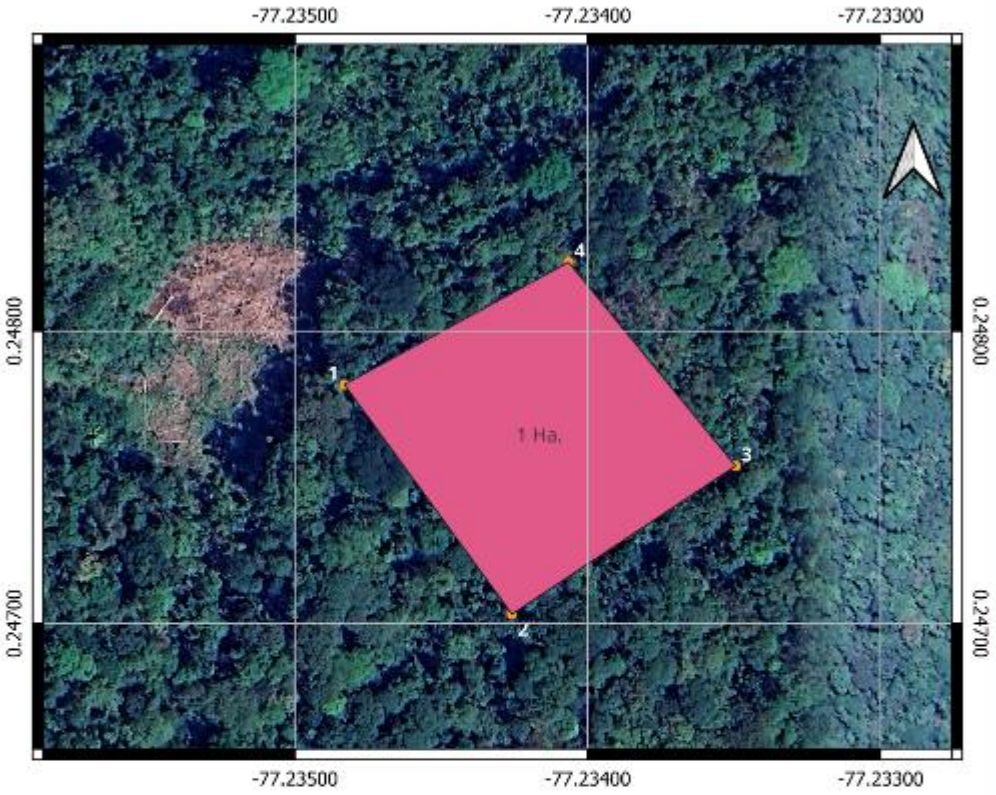

0 25 50 m

BARRA DE ESCALA



Chacra 2. Silverio Descanse

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid

COORDENADAS

ID	LATITUD	LONGITUD
1	0,2478175	-77,234831200000002
2	0,247032333032256	-77,234258582709728
3	0,247539208903226	-77,233494934193601
4	0,248236163225809	-77,234065169548444

COMUNIDAD CHANDIA NAEN

CHACRA DE CRISTIAN DESCANSE



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA



Chacra 3. Cristian Descanse

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid

COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,250617517303754	-77,234335102559783
2	0,251537459215017	-77,234330783583658
3	0,251559054095563	-77,235214014197979
4	0,2506391121843	-77,235244247030749

COMUNIDAD CHANDIA NAEN

CHACRA DE ROBERTO LUCITANTE



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA



Chacra 4. Roberto Lucitante

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid

COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,256841256911263	-77,234902859129704
2	0,256009244078498	-77,235276661996593
3	0,256423240802048	-77,236112694215024
4	0,257231137320819	-77,235642426092156

COMUNIDAD CHANDIA NA´EN

CHACRA DE ALBERTINO DESCANSE



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA




Chacra 5. Albertino Descanse

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid


COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,242967798122867	-77,227452867662137
2	0,242667035836178	-77,228012150341343
3	0,243914016552901	-77,228539329180933
4	0,244039052559727	-77,227849941467611

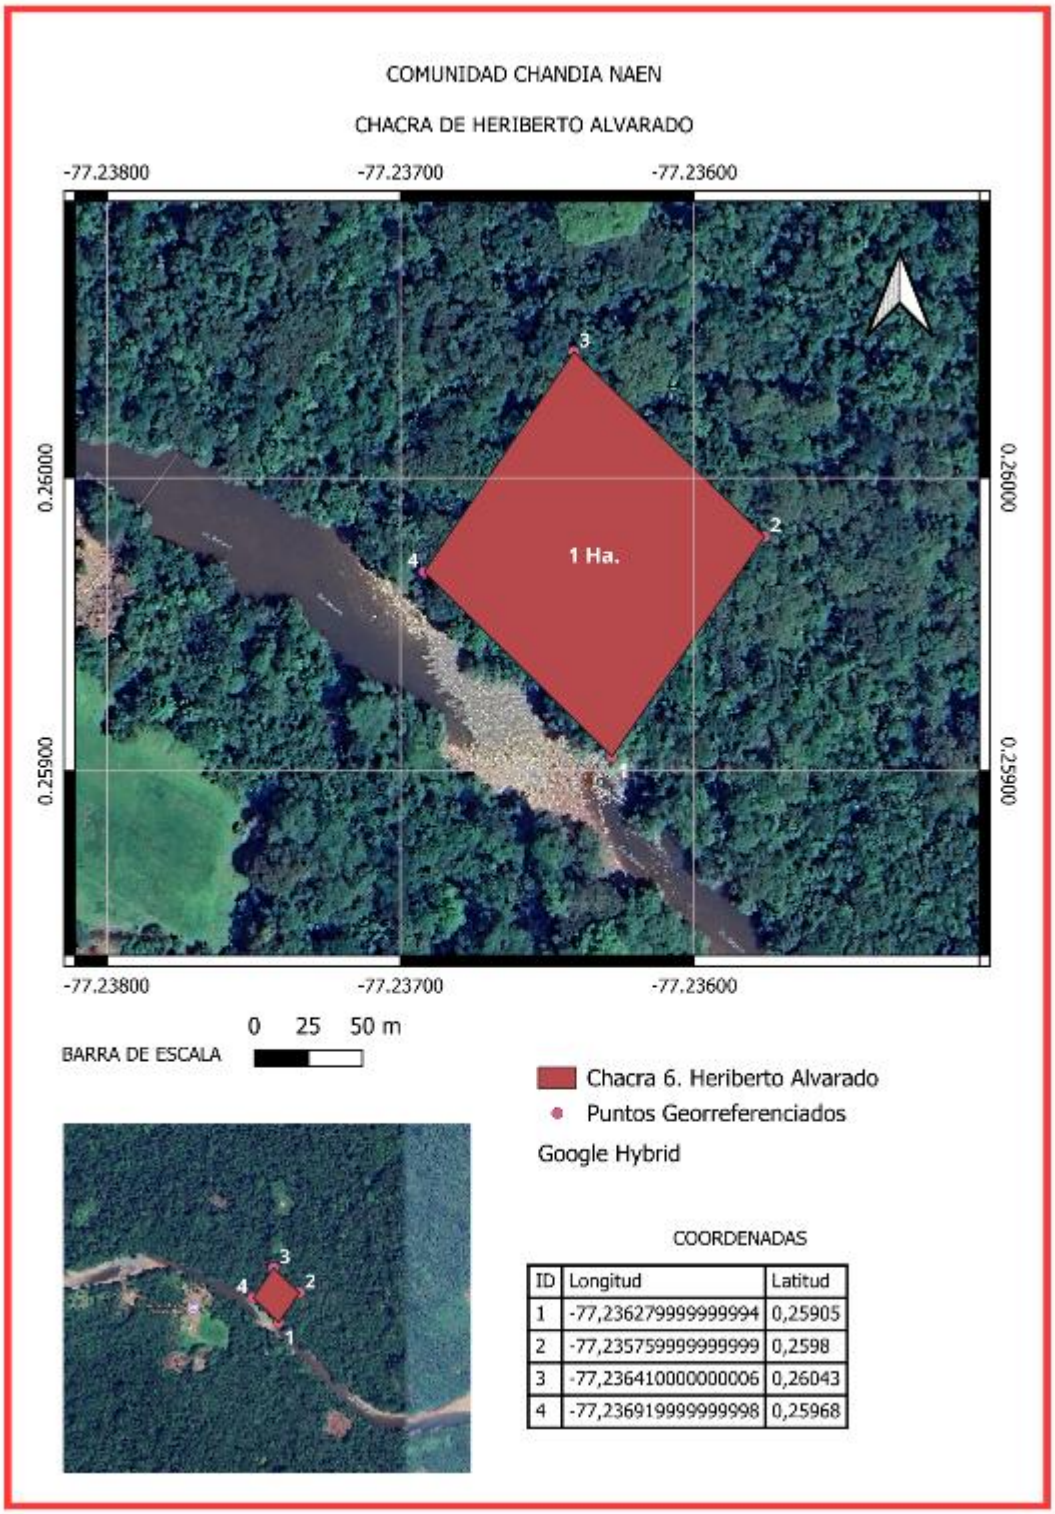


COORDENADAS

ID	Longitud	Latitud
1	-77,236279999999994	0,25905
2	-77,235759999999999	0,2598
3	-77,236410000000006	0,26043
4	-77,236919999999998	0,25968

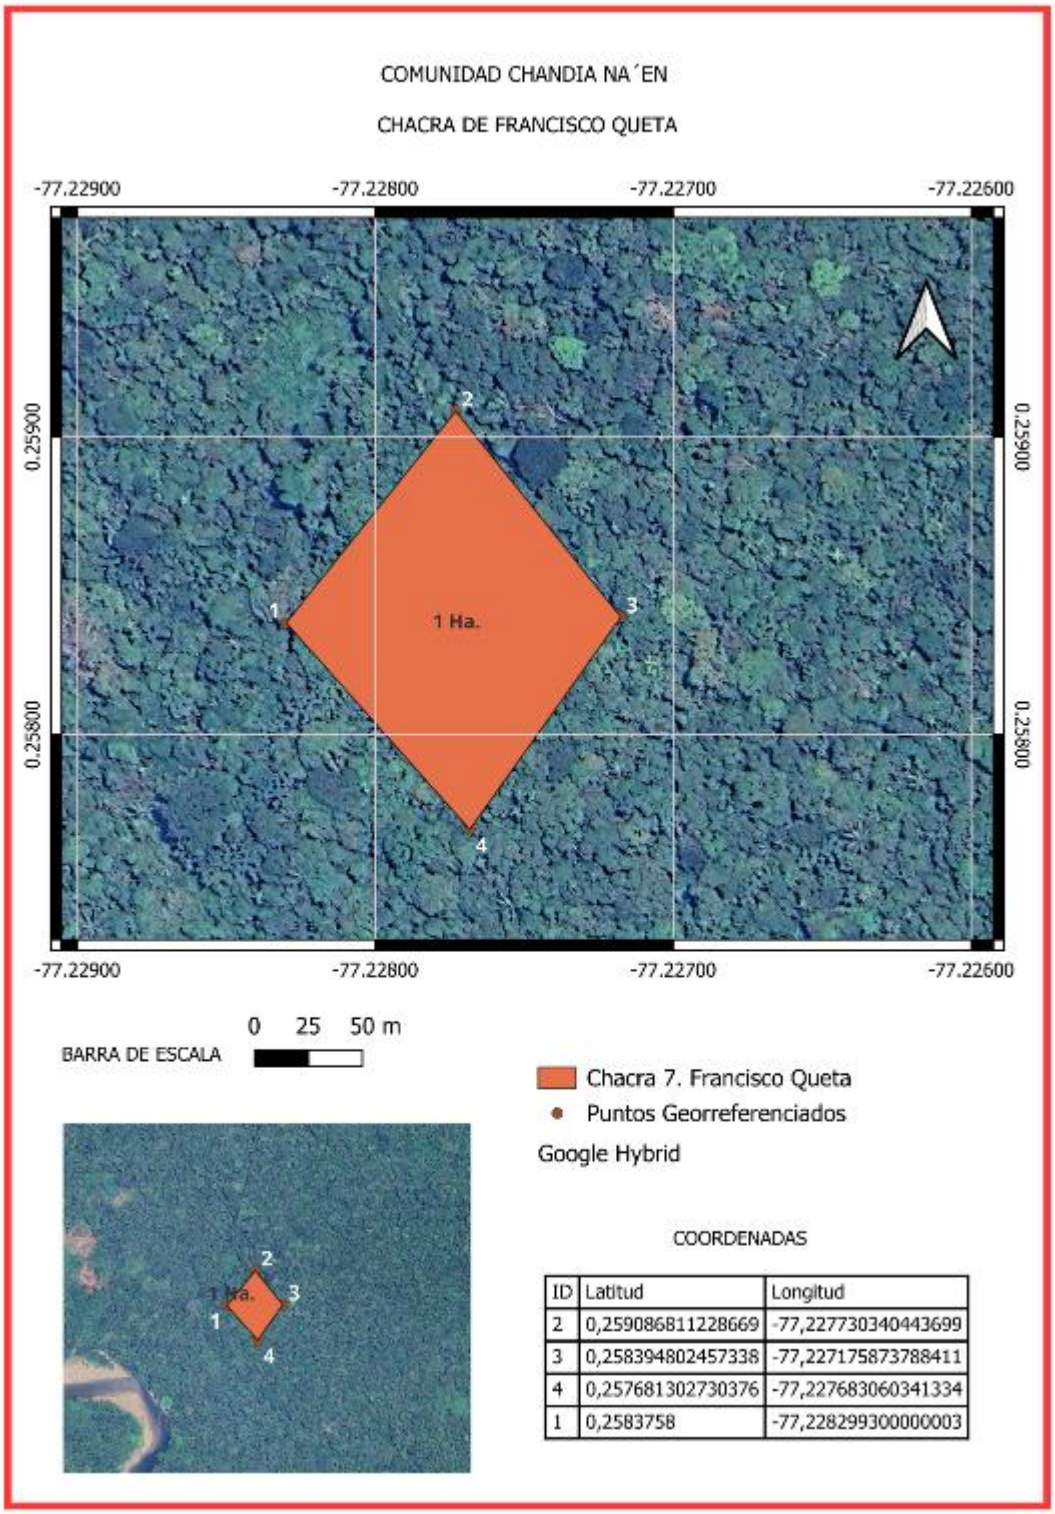

COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
2	0,259086811228669	-77,227730340443699
3	0,258394802457338	-77,227175873788411
4	0,257681302730376	-77,227683060341334
1	0,2583758	-77,228299300000003

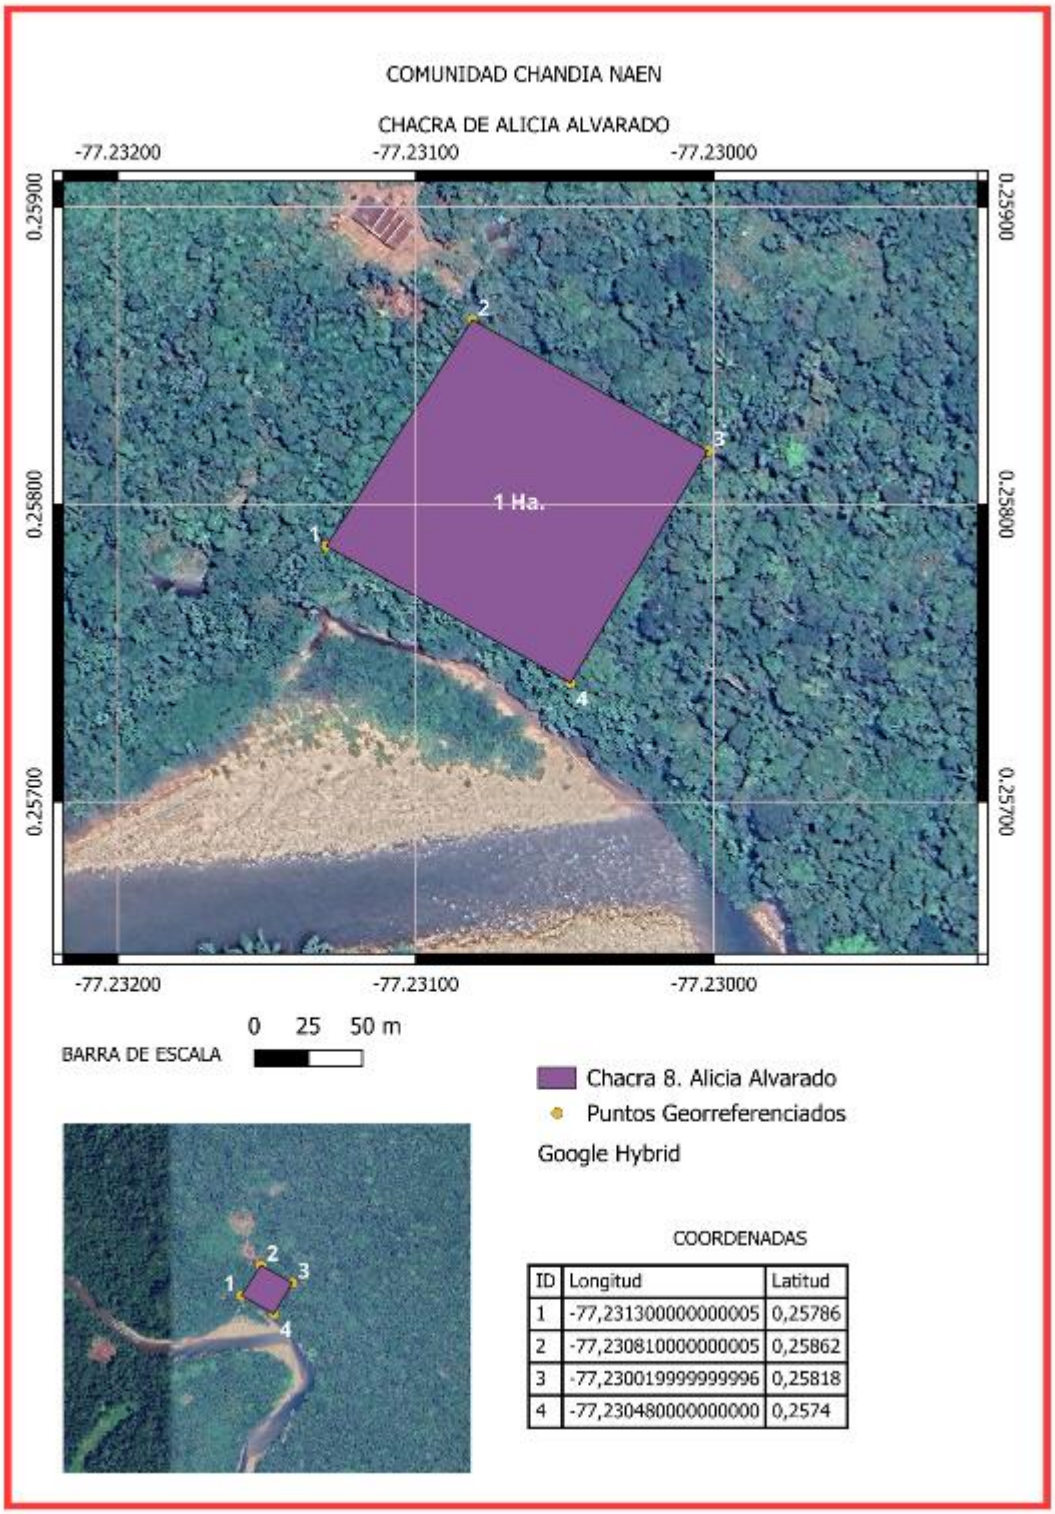

COORDENADAS

ID	Longitud	Latitud
1	-77,231300000000005	0,25786
2	-77,230810000000005	0,25862
3	-77,230019999999996	0,25818
4	-77,230480000000000	0,2574

COMUNIDAD CHANDIA NA´EN

CHACRA DE BAYRON DESCANSE



BARRA DE ESCALA 0 25 50 m

Chacra 9. Bayron Descance

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid



COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,259018444629033	-77,239890690193462
2	0,259046204596777	-77,240702185064535
3	0,258056529467671	-77,240719615741909
4	0,258041035532186	-77,239867449290230

COMUNIDAD CHANDIA NA´EN

CHACRA DE LUIS DESCANSE



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA



Chacra 10. Luis Descanse

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid

COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,259017301697907	-77,240796031283111
2	0,258080744856154	-77,240853665550304
3	0,25809515342295	-77,241714577416374
4	0,2590605	-77,241653299999996

COMUNIDAD CHANDIA NA´EN

CHACRA DE NATHALY DESCANSE



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA

Chacra 11. Nathaly Descanse


Puntos Georreferenciados

Google Hybrid



COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,2590045	-77,239787000000007
2	0,257668085215973	-77,239781338613341
3	0,257673796464824	-77,239153101239708
4	0,258981672451753	-77,239164523737401

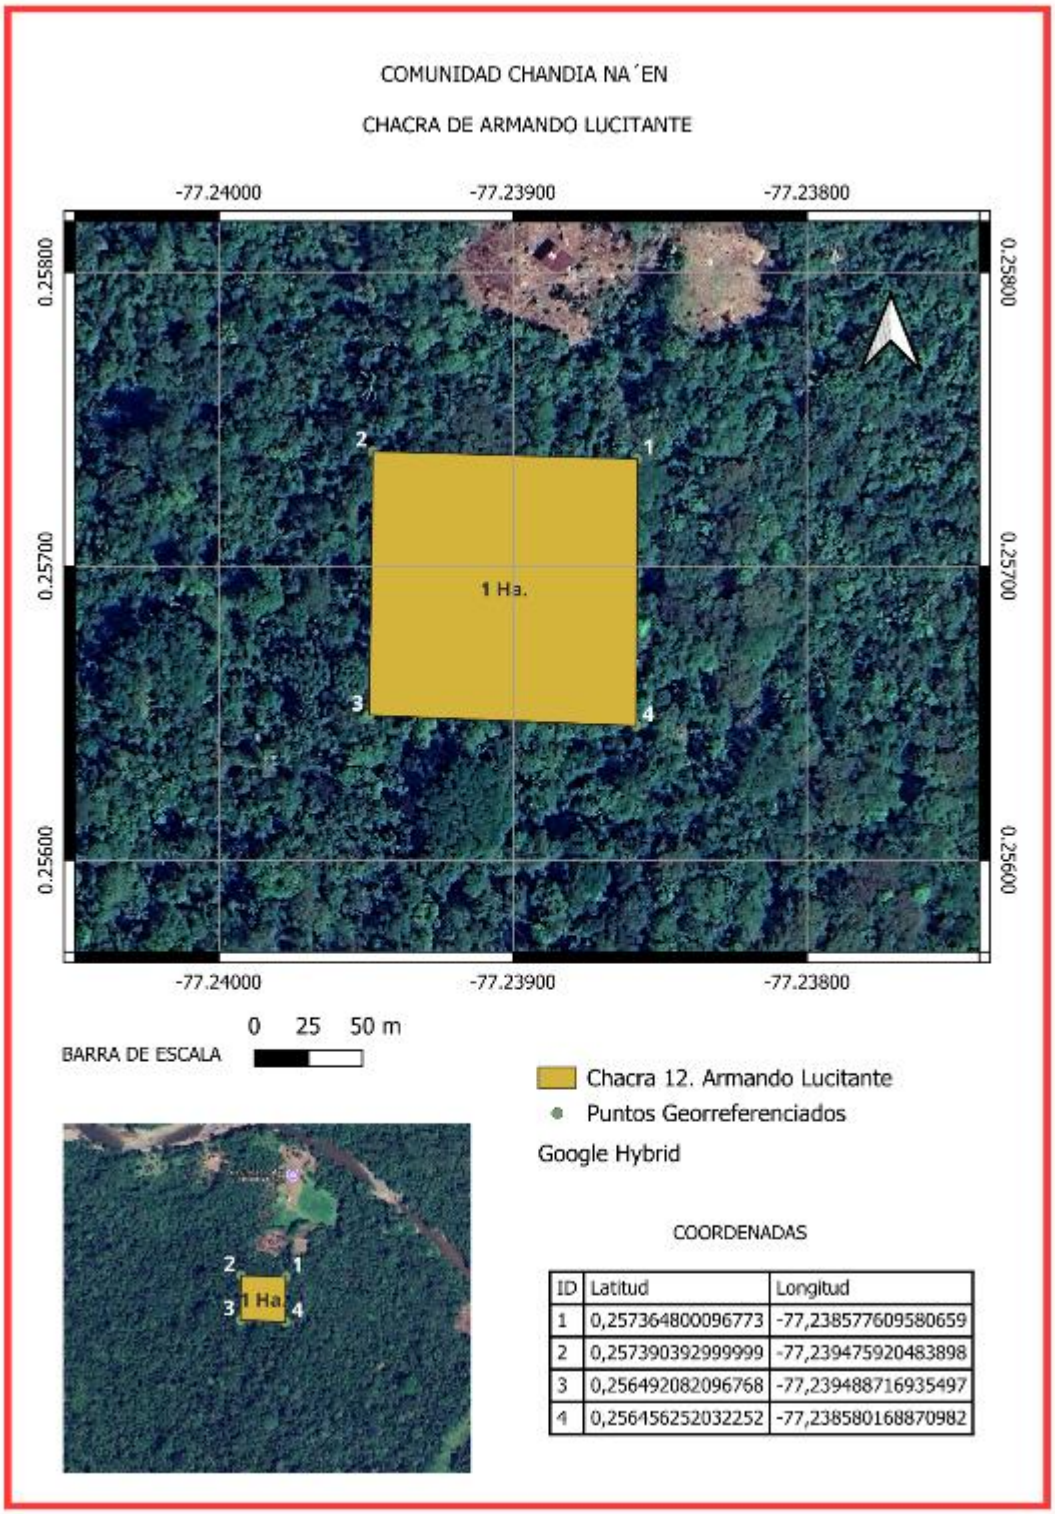

ID	Latitud	Longitud
1	0,257364800096773	-77,238577609580659
2	0,257390392999999	-77,239475920483898
3	0,256492082096768	-77,239488716935497
4	0,256456252032252	-77,238580168870982

COMUNIDAD CHANDIA NAEN

CHACRA DE REYNALDO DESCANSE



0 25 50 m

BARRA DE ESCALA




Chacra 13. Reynaldo Descanse

Puntos Georreferenciados

Google Hybrid

COORDENADAS

ID	Longitud	Latitud
1	0,258819004671502	-77,246406842222711
2	0,257688042862628	-77,246547334372877
3	0,258239474552048	-77,247270868946259
4	0,259184284261945	-77,247200622871162

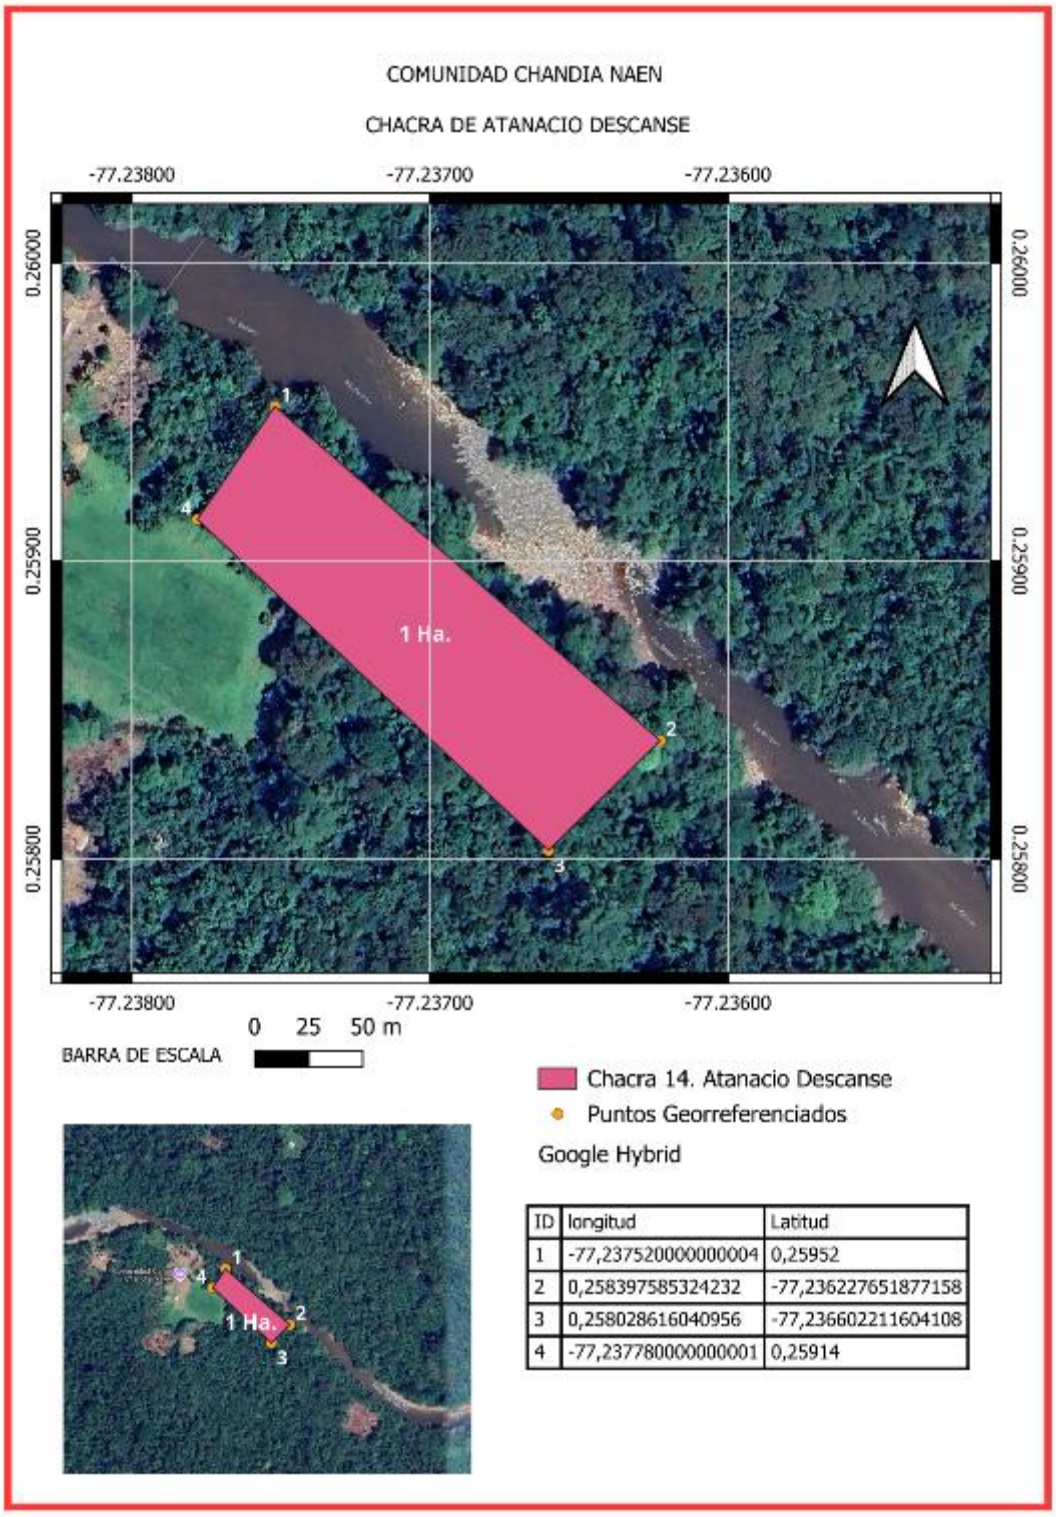

ID	longitud	Latitud
1	-77,237520000000004	0,25952
2	0,258397585324232	-77,236227651877158
3	0,258028616040956	-77,236602211604108
4	-77,237780000000001	0,25914



COORDENADAS

ID	Latitud	Longitud
1	0,2573499	-77,245550199999997
2	0,257422	-77,246446000000006
3	0,25833	-77,246409999999997
4	0,25825	-77,245530000000002

Cuenca Putumayo Içá

SUCUMBÍOS PREFECTURA



CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaria do Meio Ambiente · AMAZONAS Trabalho que transforma · Ambiente · Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica · PERÚ Ministerio del Ambiente

Financiado por: gef fondo para el medio ambiente mundial

Implementado por: GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por: Wildlife Conservation Society

Tabla 1. Tabla resumen de chacras georreferenciadas

Comunidad	N.º de chacras georreferenciadas	Estado del registro	Observaciones técnicas
Sandiyacu	15	Registradas en QGIS	4 cercanas a ribera
Lorenzó	15	Registradas en QGIS	2 cercanas a ribera
San José de Wisuya	15	Registradas en QGIS	Terreno estable
Chandia Na'en	15	Registradas en QGIS	Terreno estable
Total	**60**		

ANEXO 7: Documentación Técnica Productiva

- **Requerimiento de Kit de Herramientas Agrícolas.**

Nueva Loja, 23 de diciembre de 2025
REQUERIMIENTO N° 010-RN-CI-FS-GADPS-WCS-2025

Ingeniero
Cristian Fernández
COORDINADOR GENERAL DEL SUBPROYECTO
Asunto: Solicitud para la adquisición de Kits de Materiales y Herramientas.

De mi consideración:

En atención a las actividades planificadas dentro del subproyecto *"Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las Comunidades: Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en"*, me permito solicitar se sirva **disponer el trámite correspondiente para la ADQUISICIÓN DE LOS KITS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS**, los cuales son indispensables para el desarrollo de las actividades agroforestales y productivas en las comunidades beneficiarias, y que se encuentran contempladas en el cronograma de ejecución del subproyecto y del plan de adquisiciones.

Los materiales y herramientas que se detallan a continuación corresponden a la composición de sesenta (60) kits de herramientas agrícolas, el cual será distribuido hacia los beneficiarios de las comunidades: *Lorenzó, San José de Wisuya, Sandi yacu y Chandia Na'en* (15 beneficiarios por comunidad), en el marco del subproyecto.

Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Material/Herramienta	Descripción Técnica
1	60	Unidad	Bomba de fumigar manual	Fumigadora profesional indicada para el trabajo pesado y en múltiples aplicaciones agropecuarias e industriales • Lanza: en acero inoxidable, de alta resistencia y más liviana. • Bomba: tipo pistón en latón con sistema de válvulas completo. • Kit embolo: nuevo diseño compacto en una sola pieza auto lubricado. • Abrazaderas: en acero inoxidable más resistente y durables. • Palanca: para accionar a los dos lados • Llave: robusta ergonómica con tres posiciones de fumigación continua intermitente y bloqueo total. • Manguera: de alta resistencia en caucho reforzado. • Boquillas: viene de dos boquillas; una metálica de cono hueco de 1000 centímetros

				cúbicos (versión clásica cafetera con boquilla de 300 cc), una de polímero de cortina de 600 CC. • Porta boquilla: universal. • Filtro recipiente: nuevo diseño cónico con mayor capacidad filtrante y no genera salpicaduras • Tapa: ergonómica o fácil manipulación rápido enrosque segura con sello hermético y diafragma de ventilación • Tanque: nuevo diseño en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel resistente al impacto y protegido contraluz ultravioleta • Correas: acolchadas ajustables con reata de 2 mm de espesor mayor comodidad y resistencia para el trabajo pesado • Chasis: tubular 100% plástico de alta resistencia ergonómico, con agarraderas. • Recipiente de 20 litros • Cámara: 1 litro • Presión de 40 PSI +/- 10% • Peso 5.73 kg • Dimensiones 54.5 * 23 * 43.5 cm • Color: Amarilla **Incluye** Vaso dosificador de 250 cc Aceite lubricante de 30 cc
2	60	Unidad	Pala grande punta redonda	Tamaño de la hoja (largo × ancho): 255 × 270 mm. Anchura de la cabeza: 270 mm. Forma de la cabeza: Redonda. Material de la cabeza: Acero (chapa de acero tratada térmicamente). Material del mango: Madera de haya. Peso neto: 0,89 kg. Dimensiones del artículo empacado (aproximadas): 264 × 360 × 50 mm.
3	60	Unidad	Pala cuadrada	Tipo de mango: Mango Largo Material del mango: Madera Longitud del mango (en cm): 100 Diámetro del mango (en mm): 35 Largo artículo (en mm): 1515 Ancho articulo (en mm): 298 Alto articulo (en mm): 150 Peso neto: (en Kg) 1.25 Material: Acero, Madera Color: Negro Acabado Pintado
4	60	Unidad	Tijera de podar en acero inoxidable	Largo: 225 mm. Peso: 0,310 kg. Medida: L. Color: Rojo. Material del mango: Acero.

				Diámetro de corte: 25 mm. • Mangos de aluminio forjado con garantía de por vida. • Hoja con muesca corta-alambres. • Contra-hoja con raspador. • Mangos con agarres antideslizante sin ftalatos. • Todas las piezas son reemplazables
5	60	Unidad	Navaja para injertar en acero inoxidable	Longitud (neta): 100 mm. Profundidad (neta): 12 mm. Peso (neto): 0,05 kg. Profundidad (bruta): 15 mm. Peso (bruto): 0,055 kg. Punta Cuadrada
6	60	Unidad	Machete	Longitud de la hoja (pulgadas): 18 Forma de la hoja: laminada. Material del mango: plástico. Longitud del mango (en mm): 125.5. Largo artículo (en mm): 595. Ancho articulo (en mm): 75. Alto articulo (en mm): 25.4. Peso neto (en Kg): 0.346.
7	60	Unidad	Poncho de agua	Poncho impermeable 100% termosellado, resistente a rasgaduras, elaborado en tela de PVC que cuenta con soporte textil en poliéster, se pueda añadir extras como: cinta reflectiva, logotipos, entre otros. Dimensiones: (1.40 * 1.80 m) Color: amarillo
8	60	Par	Botas Impermeables	Talla 34: 2 pares Talla 35: 1 par Talla 36: 5 pares Talla 37: 5 pares Talla 38: 8 pares Talla 39: 19 pares Talla 40: 10 pares Talla 41: 8 pares Talla 42: 1 par Talla 43: 1 par Impermeabilidad: 100% Altura: 36 Cm Interior: sin forro Suela: Antideslizante excelente agarre. Punta: Acero Temperatura Máxima de Utilización: 40°C Temperatura de Cristalización: -43°C Resistencia a diferentes agentes químicos Color: amarillo
9	60	Unidad	Azadón	Tipo de fabricación: Forjado. Tipo de herramienta: Simple. Forma de los hombros / Forma de las dos figuras: Redondeado.

				Forma del filo: Recto Anchura de la cabeza (en mm): 122. Forma del ojo: Redondo. Material del mango: Madera. Longitud del mango (en cm): 100. Diámetro del mango (en mm): 37. Métrica: M4. Largo artículo (en mm): 206. Ancho articulo (en mm): 122. Alto articulo (en mm): 1000. Peso neto (en Kg): 1.59.
10	60	Unidad	Rastrillo	Con mango de madera. Número de púas: 12. Anchura de la cabeza (en cm): 31.8. Geometría de la púa: Curvo. Diámetro del cubo (en cm): 2.8. Largo artículo (en mm): 94. Ancho articulo (en mm): 320. Alto articulo (en mm): 1500. Peso neto (en Kg): 1.07.
11	60	Unidad	Excavadora manual	Medidas: 240 mm x 140 mm x 1420 mm. Hojas grandes de acero al carbono templado. Palo de madera duro seleccionado, muy durable. Tope doble para confort y seguridad.
12	60	Unidad	Carretilla	Carretilla 4.5 ft3 Imponchable, bastidor tubular. Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, Concha de lámina espesor 0.9 mm. Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes. Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie. Tacón estabilizador. Capacidad (Sólidos / Líquidos) 4.5 ft^3 (127 L) / 2.3 ft^3 (65 L). Medidas de la concha 27" (69 cm) x 37" (94 cm) x 9" (22 cm). Medidas de llanta 4" (10 cm) x 16" (41 cm). Resistencia de carga 580 kg Puente con doble tornillo Calibre 19 (1 mm). Soporte Calibre 15 (1.7 mm). Tacón Calibre 15 (1.7 mm).
13	60	Unidad	Traje de fumigar	• Material: 100% poliolefina • Diseño Reflex: 12% más espacio en el pecho, 6% más largo que el diseño ANSI • Resistencia: 7.5 veces menos propenso al desgarro • Protección: Contra químicos líquidos peligrosos, partículas, salpicaduras a presión • Normativas: ASTM D5034, ASTM D737, ASTM F1670, NFPA 99 antiestático **Tallas**

				Talla M: 40 unidades Talla L: 20 unidades **Características Del Material** fabricados con la tecnología SFL (Spunbond Film Laminated), o Film Microporoso Laminado. La capa interna está hecha con fibras no tejidas de polipropileno acolchadas que proporcionan una combinación de comodidad, suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. La capa externa es un recubrimiento de Spunbond con una película laminada de polietileno, que ofrece protección contra químicos líquidos a presión y 100% de retención de partículas. En conjunto, ambas capas hacen que el material sea más suave y silencioso y que genere menos ruido para el usuario. El traje cumple con la norma NFPA 99 de materiales antiestáticos y no atrae partículas. previene la generación de chispas por descargas que pueden actuar como fuentes de ignición para incendios o explosiones en ambientes con altas concentración de vapores combustibles. **Diseño Del Traje** Los trajes tienen diseño REFLEX*, el cual garantiza comodidad en los movimientos ya que tiene 9% más tela, es 7.5 veces menos propenso desgarres que un traje con diseño ANSI, tiene 12% más espacio en el pecho y 6% más de longitud. **Accesorios** • Gorra en tejido repelente al agua. • Visera para protección del rostro.
14	60	Unidad	Rollo de cinta Parafilm para injertación	Fabricado de una mezcla de poliolefina y parafina. Garantiza excelente resistencia a productos químicos, sales, soluciones inorgánicas y alcalinas hasta 48 horas y ofrece una resistencia a la temperatura entre -45 °C a + 500 °C. Se estira y ensancha hasta un 200% de su longitud original. Se adhiere a la circunferencia del cuello del frasco y sella perímetros irregulares de frascos, erlenmeyers, botellas, vasos, etc. con hermeticidad a prueba de fugas. También previene el riesgo de rotura del cuello del frasco y el derrame del contenido en caso de un vuelco. • Ancho: 100 mm • Largo: 38 m
15	120	Unidad	Lima para afilar	**Descripción:** La lima plana con alta calidad diseñada para el desbaste eficiente de cualquier superficie o herramienta metálica. Fabricada en una sola pieza de acero con tratamiento térmico,

				garantiza durabilidad, resistencia y un rendimiento confiable incluso tras un uso prolongado. Su diseño con cabo permite un agarre cómodo y seguro, facilitando movimientos precisos y controlados durante el desbaste. Tipo de lima: Plana Tecnología de la hoja: Rectangular Tipo de dentado: Fino Anchura de la hoja (en mm): 24 Espesor de la hoja (en mm): 4 Caras con dentado: 4 Tipo de mango: Mango hexagonal Material del mango: Polipropileno Mangos de reposición: Si aplica Material a trabajar: Acero, aluminio y hierro Uso: Especializadas para el afilado y puesta a punto de todo tipo de herramientas. Color del mango: Rojo
16	120	Pares	Guante Textil De Poliéster Recubrimiento Látex Rugoso Mediano	**Descripción** Guante textil 7TXGLTX de poliéster con recubrimiento de látex acabado rugoso están diseñados para ofrecer una mejor resistencia al desgaste y la abrasión, garantizando una larga vida útil incluso en entornos de trabajo exigentes. Su acabado en la palma permite una mayor protección y agarre excepcional en una amplia variedad de superficies, convirtiéndolos en una herramienta indispensable para realizar sus tareas con confianza, sabiendo que sus manos están bien protegidas en todo momento. **Atributos** • Talla: Mediana • Material de la palma: Látex • Material del dorso: Poliéster • Largo artículo (en mm): 200 • Ancho articulo (en mm): 215 • Alto articulo (en mm): 15 • Peso neto (en Kg): 0.062 **Acabados** • Material: Poliéster • Color: Azul • Acabado: Textil
17	60	Pares	Guante Revestido PVC Largo	Producto fabricado con tejido suave que provee un gran nivel de confort. Ideal para la manipulación de ácidos, solventes. Guante libre de silicona y cera. Por el largo y el material del guante es ideal para fumigación. **Características**: • Apariencia: Palma Y Dedos Corrugados; Soporte Textil De Tejido De Algodón Y Recubierto De PVC.

				• Color: Verde • Largo Nominal: 450 mm +/-10mm • Peso: 270 gr Tallas: 9
18	24.000	Unidad	Fundas de polietileno para vivero	Material Polietileno de alta densidad (PEAD). Color: Negro. Dimensión: 14 x 26 cm. Perforaciones De 6 a 12 orificios, distribuidos en los laterales y base para drenaje y aireación. Diámetro de perforaciones: 5 a 8 mm. Capacidad aproximada: 0.5 a 3 litros. Resistencia UV Aditivo anti-UV incorporado. Gruesas y resistentes; ideales para plantar árboles y plantas; y posterior a su crecimiento, ser trasplantadas a la tierra. Pack x 100 unidades.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y reitero mi compromiso con el cumplimiento de los objetivos del subproyecto.

Atentamente,



_____

Ing. Freddy Sarango

CONSULTOR TERRITORIAL INDIVIDUAL GADPS – WCS

- **Anexo 7.1. Requerimiento técnico para viveros**

NUEVA LOJA, 25 DE FEBRERO DE 2026

REQUERIMIENTO N° 012-RN-CI-FS-GADPS-WCS-2026

Ingeniero
Cristian Fernández
COORDINADOR GENERAL DEL SUBPROYECTO
Asunto: Solicitud para la compra de insumos y servicios de Instalación de 4 viveros comunitarios.

De mi consideración:

En atención a las actividades planificadas dentro del subproyecto *"Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las Comunidades: Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en",* **me permito solicitar se sirva disponer el trámite correspondiente para la COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 4 VIVEROS COMUNITARIOS**, **uno por cada comunidad**; los cuales son indispensables para la producción de material vegetal y el fortalecimiento de los sistemas agroforestales en las comunidades beneficiarias, y que se encuentran contemplados en el cronograma de ejecución del subproyecto y el plan de adquisiciones, de la siguiente manera:

Ítem	Cantidad	Unidad	Producto	Descripción técnica
1	4	Unidad	Instalación de viveros en cada comunidad	**1. Dimensión del vivero:** Cada vivero deberá construirse con una dimensión mínima de **15,00 m de largo por 10,00 m de ancho**, equivalente a un área aproximada de **150 m²**, la cual permitirá la correcta distribución de camas de germinación, pasillos de circulación y área funcional interna. **2. Adecuación del terreno:** Previo a la construcción se deberá realizar: • Limpieza total del área. • Desbroce y retiro de material orgánico superficial. • Nivelación y conformación del terreno. • Compactación manual o mecánica del área útil del vivero.

				• El área interior del vivero deberá presentar una pendiente suave (0,5 % a 1 %) que favorezca el escurrimiento superficial sin generar erosión ni empozamientos. **3. Estructura portante:** La estructura deberá ejecutarse en madera tratada o caña guadua madura y curada, libre de fisuras y ataque de insectos. Los postes verticales principales deberán: • Tener diámetro mínimo de 10–12 cm (guadua) o sección equivalente en madera. • Ser empotrados en el terreno a una profundidad mínima de 0,50 m y contar con anclaje en dado de hormigón simple de mínimo 0,30 × 0,30 × 0,30 m, a fin de garantizar estabilidad y durabilidad. • Quedar alineados, aplomados y firmemente fijados. **4. La estructura conformará techo a dos aguas con:** • Altura mínima al cumbrero: 3,50 m • Altura mínima lateral: 2,00 m Las uniones entre elementos estructurales deberán realizarse mediante: • Pernos galvanizados, tornillos estructurales o clavos helicoidales, según corresponda. • En el caso de guadua, se permitirá amarre con alambre galvanizado Nº18 reforzado, debidamente tensado. • Se deberán colocar arriostramientos diagonales en esquinas para garantizar estabilidad frente a viento. **5. Estructura de cubierta:** Se instalarán correas y vigas secundarias en madera o guadua, firmemente fijadas a la estructura principal. La cubierta será de polietileno agrícola transparente con

				protección UV (mínimo 200 micras), la cual deberá: • Instalación continua y debidamente tensada. • Fijación mediante listones de madera, perfiles o sistema equivalente. • Traslapes mínimos de 20–30 cm. • Volado perimetral mínimo de 0,70–0,80 m, firmemente asegurado para resistir condiciones de viento y lluvia de la zona. • El diseño del techo deberá conducir las aguas lluvias hacia el exterior del vivero, evitando descarga directa al interior o sobre las camas. • Se deberá garantizar que el volado y pendiente evacúen el agua hacia el drenaje perimetral. • En los puntos de contacto entre la estructura y el polietileno se deberá colocar cinta anti-calor, manguera partida, espuma o elemento amortiguador equivalente, a fin de evitar perforaciones por fricción o temperatura. **6. Cerramiento lateral:** El vivero contará con un cerramiento perimetral construido con malla antiáfidos o malla plástica negra tipo Saran al 65%, con el fin de impedir el ingreso de insectos plaga y animales, que deberá: • Cubrir completamente los laterales hasta la altura de la estructura. • Estar correctamente tensada y sin holguras. • Fijarse a postes y largueros mediante grapas, amarres plásticos UV o alambre galvanizado. • Incluir refuerzo inferior para evitar ingreso de animales. • Considerar al menos una puerta de acceso en estructura de madera o guadua con su respectiva malla. **7. Sistema de drenaje perimetral:**

				Se ejecutará una zanja perimetral con las siguientes características mínimas: • Ancho: 0,30 m • Profundidad: 0,30–0,40 m • Construida con pendiente que asegure la adecuada evacuación de aguas lluvias hacia un punto de descarga natural. El drenaje deberá: • Rodear completamente el vivero. • Mantenerse libre de obstrucciones. • Incluir conformación y perfilado de taludes para evitar derrumbes. **8. Camas de germinación elevadas:** Cada vivero deberá contemplar diez (10) camas tipo mesa, con las siguientes dimensiones: • Ancho: 1 m • Largo: 4,00 m • Altura: 1 m Características constructivas: • Estructura en madera tratada o material resistente a la humedad. • Diez (10) patas por cama, en madera de 6 × 4 cm mínimo, firmemente clavadas o atornilladas. Las patas de las camas no deberán enterrarse. Estas se apoyarán sobre dados de hormigón simple (mínimo 20 × 20 × 5 cm o solución equivalente), colocados sobre terreno previamente nivelado y compactado. • Las patas deberán fijarse rígidamente al marco estructural y contar con arriostramientos inferiores que eviten desplazamientos laterales o movimientos por uso. • Superficie o base permeable apta para producción (malla plástica resistente, sarán, tablillas separadas u otro material equivalente), que garantice el adecuado escurrimiento del exceso de agua y evite el encharcamiento del sustrato. No se permitirá el uso de superficies completamente cerradas.

				• Elementos clavados o atornillados para evitar movimientos. • Cada cama deberá contar con bordes perimetrales de madera con altura mínima de 18–20 cm, que permitan contener el sustrato sin derrames y faciliten las labores de producción de plántulas. • La superficie de la cama de germinación deberá construirse con una pendiente suave entre 1 % y 2 %, garantizando el adecuado escurrimiento del exceso de agua sin provocar arrastre del sustrato. Las camas deberán quedar: • Estables. • Correctamente distribuidas dentro del vivero. **9. Pasillos de circulación:** • Pasillos entre camas: 0,70–0,80 m mínimo. • Pasillo principal de circulación: mínimo 1,00 m. • Superficie interna libre de obstáculos y con buen drenaje. **10. Área funcional de almacenamiento:** Se deberá prever dentro del vivero un espacio libre funcional destinado a: • Almacenamiento temporal de insumos. • Herramientas. • Bandejas o plántulas. Esta área deberá: • Mantener circulación adecuada. • No interferir con las camas de germinación. • Quedar bajo cubierta. **11. Condiciones de entrega:** La consultora/personal deberá entregar cada vivero: • Totalmente construido y operativo. • Estructuralmente estable. • Con cubierta y mallas correctamente instaladas. • Con área limpia y libre de escombros. La consultora contratada será responsable de proveer y financiar por su cuenta todos

				los medios logísticos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo herramientas, equipos, transporte de personal y materiales, movilización, carguío y descargue, alimentación, hidratación, viáticos, materiales menores, elementos de seguridad y cualquier otro recurso requerido para el cumplimiento del objeto contractual, sin que esto genere costos adicionales para la entidad contratante. Asimismo, deberá priorizar la contratación de mano de obra local de las comunidades beneficiarias y gestionar, en la medida de lo posible, la adquisición de materiales disponibles en las propias comunidades, con el fin de fomentar la participación comunitaria y dinamizar la economía local.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y reitero mi compromiso con el cumplimiento de los objetivos del subproyecto.

Atentamente,



_____

Ing. Freddy Sarango
CONSULTOR INDIVIDUAL GADPS – WCS

Anexo: Cuadro referencial de materiales y diseño de los viveros.


Anexo 1. Cuadro referencial de materiales

Se adjunta el cuadro referencial de materiales por vivero, elaborado con base en el diseño técnico preliminar. Las cantidades presentadas son estimativas y servirán como guía para la correcta ejecución de la obra, sin constituir un presupuesto oficial.

Las cantidades corresponden a un (1) vivero tipo, por lo que para la ejecución total del subproyecto deberán multiplicarse por cuatro (4) unidades.

Material	**Unidad**	**Cantidad referencial por vivero**
Acero de refuerzo	kg	7,4
Agua	m3	0,15
Alambre galvanizado # 18	kg	30,83
Arena	m3	0,52
Caña de guadua	m	298,84
Cemento	saco	4,62
Clavos	kg	6,5
Listones de chuncho de 6x4cm	m	240
Madera, puntales	m	36
Malla sarán 65 %	m2	105
Polisombra al 65%	m2	203,7
Ripio triturado	m3	0,76
Tabla de chuncho 2.4m x .24cm	u	80
Tabla encofrada (2.10 x 0.22)	u	3,79

Anexo 2. Diseño referencial del vivero comunitario

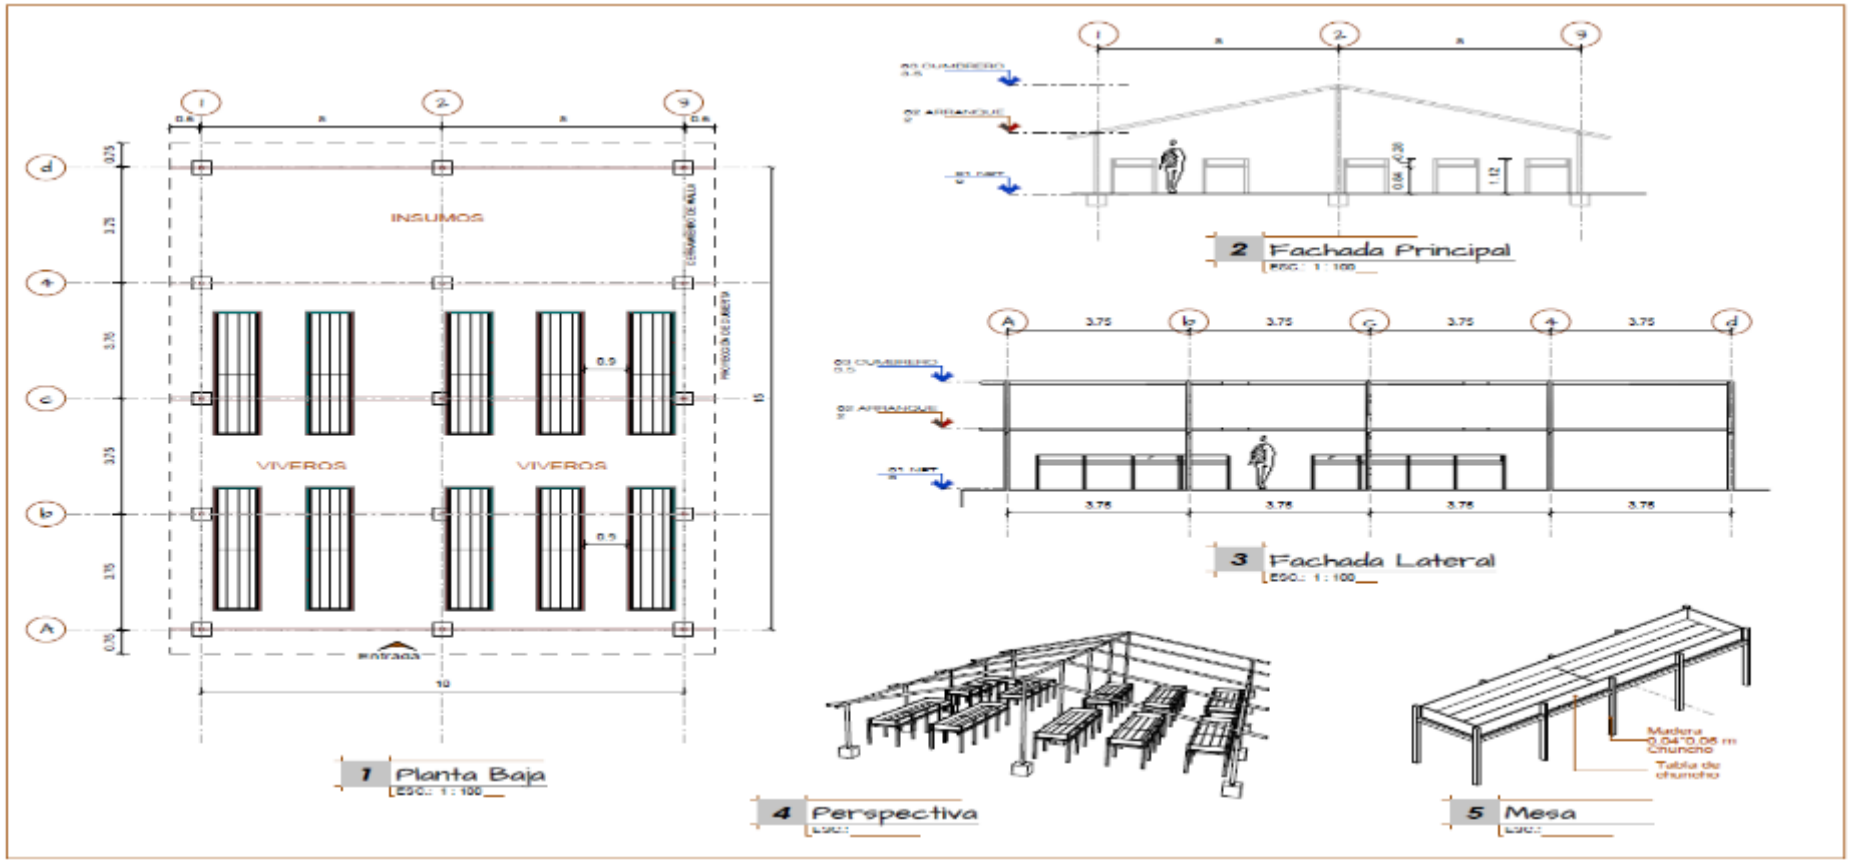

Se adjunta el Diseño refetencial, que establece la disposición general, dimensiones y criterios constructivos mínimos del vivero. La consultora podrá realizar ajustes menores en campo, siempre que no se reduzcan las especificaciones técnicas establecidas.

- **Anexo 7.2. Matriz de especies por comunidad**

N°	Especies	Sandy Yaku	Chandia Na´en	Lorenzó	San José Wisuya	TOTAL
1	Cedro	15	0	0	0	**15**
2	Plátano barraganete	14	15	15	15	**59**
3	Yuca blanca	13	11	15	15	**54**
4	Coco	10	14	15	15	**54**
5	Naranja injerta	11	13	15	15	**54**
6	Uva	11	12	15	0	**38**
7	Cacao nacional	10	8	0	15	**33**
8	Maíz tusilla	10	12	15	15	**52**
9	Piña	10	12	0	0	**22**
10	Zapote	7	13	0	0	**20**
11	Guanábana	6	7	0	15	**28**
12	Mandarina injerta	9	8	15	15	**47**
13	Sábila	8	0	15	5	**28**
14	Jengibre	7	3	0	8	**18**
15	Paico	6	0	0	5	**11**
16	Achapo	5	0	0	0	**5**
17	Amarillo	5	0	0	0	**5**
18	Arroz	4	0	5	0	**9**
19	Banano o guineo	6	1	0	10	**17**
20	Bilibili	6	0	0	0	**6**
21	Café	5	3	0	0	**8**
22	Caimo	4	0	0	5	**9**
23	Granadillo	4	0	0	0	**4**
24	Limón injerto	4	11	0	15	**30**
25	Mango	4	0	15	5	**24**
26	Arazá	3	4	15	5	**27**
27	Bálsamo	3	0	0	0	**3**
28	Borojó	4	9	15	10	**38**
29	Caña	4	5	15	6	**30**
30	Chontaduro	4	14	0	5	**23**
31	Guayusa	3	3	0	0	**6**
32	Maní	5	1	0	0	**6**
33	Orégano	4	0	0	0	**4**
34	Ortiga	3	0	0	0	**3**
35	Papaya	3	0	0	15	**18**
36	Sandia	5	0	0	5	**10**
37	Tabaco	3	0	0	5	**8**
38	Aguacate	2	14	0	0	**16**
39	Ayahuasca	2	0	0	8	**10**
40	Flor de Jamaica	2	0	0	0	**2**
41	Guaba machetona	2	10	0	15	**27**

42	Guama	2	0	7	0	**9**
43	Maní de árbol	0	10	8	0	**18**
44	Guayacán	2	0	0	0	**2**
45	Hierba santa	3	0	0	0	**3**
46	Madroño	2	2	0	0	**4**
47	Manzanilla	2	0	0	0	**2**
48	Matarratón	3	0	0	0	**3**
49	Palo de canela	3	0	0	0	**3**
50	Ruda	2	0	0	0	**2**
51	Achiote rojo	1	0	0	0	**1**
52	Achotillo	2	6	15	0	**23**
53	Ají	1	0	0	0	**1**
54	Ajo macho	1	0	10	0	**11**
55	Albahaca	1	0	0	5	**6**
56	Avenillo	1	0	0	0	**1**
57	Barbasco negro	3	0	0	0	**3**
58	Canguil	1	0	0	0	**1**
59	Cacao blanco	0	5	0	0	**5**
60	Chirimoya	1	3	0	5	**9**
61	Chiro	3	5	15	0	**23**
62	Condición	1	0	0	0	**1**
63	Dulcamara	1	0	0	0	**1**
64	Escancel	1	0	0	0	**1**
65	Flor de muerto	1	0	0	0	**1**
66	Pronto alivio	1	0	0	0	**1**
67	Malva	1	0	0	0	**1**
68	Maracuyá	1	0	0	0	**1**
69	Marañón	1	0	0	0	**1**
70	Palo de volador o algodón	2	0	0	0	**2**
71	Polbillo	1	0	0	0	**1**
72	Sande	1	0	0	0	**1**
73	Tachuelo	2	0	0	0	**2**
74	Verbena	1	0	0	0	**1**
75	Hierbaluisa	2	11	0	0	**13**
76	Cebollín o cebolla china	1	0	0	0	**1**
77	Cilantro	1	0	0	0	**1**
78	Caimito	0	13	0	0	**13**
79	Frutipan	0	9	15	0	**24**
80	Camote	0	6	0	0	**6**
81	Ungurahua	0	5	10	0	**15**
82	Morete	0	4	0	10	**14**
83	Plátano maqueño	0	4	0	0	**4**
84	Huito	0	3	0	0	**3**
85	Lima	0	3	5	0	**8**
86	San pedro	0	2	0	0	**2**

87	Ñame	0	2	10	5	**17**
88	Mamey	0	1	0	0	**1**
89	Guayaba	0	1	0	0	**1**
90	Camu camu	0	1	0	0	**1**
91	Sangre de drago	1	1	5	0	**7**
92	Frejol grandul	0	0	15	0	**15**
93	Totumo	0	0	0	5	**5**
94	Pimentón	0	0	0	15	**15**
95	Mamoncillo	0	0	0	8	**8**
		300	300	300	300	1200

Elaborado por:



_____

Ing. Freddy Sarango

CONSULTOR INDIVIDUAL GADPS – WCS

- **Anexo 7.3. Proceso de Adquisición de Herramientas Agrícolas**
- **Proforma 1:**

AGROFERRETERIA GRAL S.A.S
AGROFERRETERIA GRAL
RUC 2293540600001 TELEFONOS: 0997506199

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 2160000210001
RUC:
Dirección: AV. 20 DE JUNIO S/N y CARCHI
Teléfonos:

PROFORMA
P000000008

Fecha: 18/02/2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	IVA	DESC.	TOTAL
60,00	FOREX FUMIGADORA 20L MANUAL	UND	$70,00	0%	0	$4.200,00
60,00	BLL PALA PUNTONA M/PL	UND	$11,50	15%	0	$690,00
60,00	BLL PALA CUADRA M/PLAST	UND	$11,50	15%	0	$690,00
60,00	TRUPER TIJERA PODAR 8"	UND	$39,10	15%	0	$2.346,00
60,00	ELITE NAVAJA P/INJERTAR	UND	$24,97	0%	0	$1.498,20
60,00	MACHET.HANSA AGUILA C/R	UND	$8,50	15%	0	$510,00
60,00	PONCHO IMPERMEABLE REF AMARILL	UND	$12,00	15%	0	$720,00
60,00	BOTAS HOMBRE NEGRA VENUS T 40	UND	$19,00	15%	0	$1.140,00
60,00	HERRAGRO RASTRILLO 22 D	UND	$12,00	0%	0	$720,00
60,00	HERRAGRO EXCAVADORA GR	UND	$20,00	15%	0	$1.200,00
60,00	CARRETILLA TRUPER TOMATE	UND	$85,00	0%	0	$5.100,00
60,00	AZADÓN FORJADO 252	UND	$18,00	15%	0	$1.080,00
60,00	EL ROLLO DE CINTA PARAFILM M	UND	$19,00	15%	0	$1.140,00
24000,00	FUNDAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)	UND	$0,03	0%	0	$768,00
120,00	GUANTE TEXTIL DE POLIÉSTER RECUBRIMIENTO LÁTEX RUGOSO MEDIANO	UND	$9,85	15%	0	$1.182,00
60,00	GUANTE REVESTIDO PVC LARGO	UND	$5,21	15%	0	$312,60
60,00	TRAJE DE FUMIGAR	UND	$19,29	15%	0	$1.157,40
120,00	LIMAS PLANAS HOJA RECTANGULAR	UND	$6,00	0%	0	$720,00

Vendedor: ALEX PEREIRA

Observaciones:

SUBTOTAL	**25.174,20**
DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL NETO	**25.174,20**
SUBTOTOTAL IVA 15	**13.993,20**
SUBTOTAL IVA 5	**0**
SUBTOTAL 0%	**13.006,20**
IVA 15%	**$1.825,20**
IVA 5%	
TOTAL	**$26.999,40**

- **Proforma 2:**

PROFORMA

FERRETERIA J T
1717489072001
Dirección: AV. CIRCUNVALACION CALLE 23 DE SEPTIEMBRE
Email: intriferreteriajt@gmail.com
teléfono: 0999534636

N°: P0000340

CLIENTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
RUC: 216000021001
DIRECCION: SUCUMBIOS/LAGO AGRIO/NUEVA LOJA
TELEFONO:

EMISIÓN: 11/02/2026
VALIDEZ: 30 días
F. PAGO: EFECTIVO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Total
0125G	Bomba p/fumigar manual 20 LT Sprayer	UND	60	$90,00	0,00	$5.400,00
BE0001	Pala puntona Bellota	UND	60	$12,75	15,00	$765,00
BE0002	Pala cuadrada Bellota	UND	60	$12,75	15,00	$765,00
HS6001	Tijera Altuna de poda 1 mano	UND	60	$35,00	0,00	$2.100,00
8468/1	Navaja de Injertar Plegable Con Pua 8420	UND	60	$24,67	15,00	$1.480,20
17777	Machete Bellota 191-24PPR/SA	UND	60	$6,00	15,00	$360,00
PCH003	Poncho Imperm Tela Poliéster Termosellado Refelcti PVC	UND	60	$15,00	15,00	$900,00
BO2513	Bota Venus Llanera #40	PAR	60	$19,00	15,00%	$1.140,00
4H1AS	Rastrillo Metal 22 Dientes Con Cabo Crowmain	UND	60	$12,30	15,00	$738,00
310559	Excavadora Grand Bellota	UND	60	$22,69	15,00	$1.361,40
OOO1708	Carretilla Truper	UND	60	$78,00	15,00	$4.680,00
AZ002	Azadón Bellota 2a	UND	60	$15,32	0,00	$919,20
15ASD	El Rollo De Cinta Parafilm M	UND	60	$10,00	15,00	$600,00
D2IO11D	Fundas De Polietileno De Alta Densidad (Pead)	UND	24000	$0,03	0,00	$768,00
ASD512	Guante Textil De Poliéster Recubrimiento Látex Rugoso Mediano	PAR	120	$7,54	15,00	$904,80
DF1G	Guante Revestido PVC Largo	PAR	60	$4,05	15,00	$243,00
SD2F11	Traje De Fumigar	UND	60	$19,20	15,00	$1.152,00
1SDF	BLL Lima Triangular 10" Mp	UND	120	$4,00	0,00%	$480,00

subtotal 0%	$9.667,20
subtotal 12%	$0,00
subtotal 15%	$15.089,40
subtotal 5%	$0,00
subtotal 8%	$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$24.756,60
Total Descuento	$0,00
IVA 12%	$0,00
IVA 15%	$2.263,41
IVA 5%	$0,00
IVA 8%	$0,00
VALOR TOTAL	**$27.020,01**

Correo: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

- **Proforma 3:**



FERRECONSTRUC ELOY ALFARO CIA. LTDA
MANABI Y LATACUNGA ESQ. TRAS LA FERIA LIBRE
RUC 2191774119001 TELEFONOS: 062358503-0981308114

Cliente:	Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia De Sucumbíos
RUC:	216000021001
Dirección:	Sucumbíos/Lago Agrio/Nueva Loja
Teléfonos:	
Fecha:	18/02/2026

PROFORMA

P000011453

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	IVA	DESC.	TOTAL
60,00	BOMBA P/FUMIGAR MANUAL 20 LT ROYAL CONDOR	UND	$90,00	15%	0	$5.400,00
60,00	BELLOTA PALA PUNTA REDONDA OPTIMA H13	UND	$12,35	15%	0	$741,00
60,00	BELLOTA PALA PUNTA CUADRADA D13	UND	$12,35	15%	0	$741,00
60,00	TIJERA DE PODA 1 MANO	UND	$37,45	15%	0	$2.247,00
60,00	NAVAJADE INJERTAR PLEGABLE CON PUA 8420	UND	$23,75	15%	0	$1.425,00
60,00	MACHETE BELLOTA 24"	UND	$7,87	15%	0	$472,20
60,00	PONCHO IMPERMEABLE PVC NEGRO 2.10CMX1.40CM	UND	$16,55	15%	0	$993,00
60,00	BOTA AGRICOLA NEGRA T-38	PAR	$15,20	15%	0	$912,00
60,00	TRUPER RASTRILLO DE JARDIN REFORZADA 22D	UND	$12,00	15%	0	$720,00
60,00	BELLOTA ESCABADORA D17 GRANDE TRIFI	UND	$15,00	15%	0	$900,00
60,00	CARRETILLA METALICA 80L TRUPER SXMLGO10722	UND	$74,00	15%	0	$4.500,00
60,00	AZADON GRANDE CON CABO 310-A BELLOTA	UND	$14,00	15%	0	$840,00
60,00	EL ROLLO DE CINTA PARAFILM M	ROLLO	$12,00	0%	0	$720,00
24000,00	FUNDAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)	UND	$0,03	15%	0	$648,00
120,00	GUANTE TEXTIL DE POLIÉSTER RECUBRIMIENTO LÁTEX RUGOSO MEDIANO	PAR	$6,25	15,00%	0	$798,00
60.00	GUANTE REVESTIDO PVC LARGO	PAR	$3,55	15,00%	0	$213,00
60.00	TRAJE DE FUMIGAR	UND	$19	15,00%	0	$1.149,00
120,00	BLL LIMA PLANA 10" MP	UND	$4,00	0,00%	0	$480,00

* Productos y Servicios Sujetos a Impuestos, no estan incluidos en la proforma

Vendedor: JHON TORRES

Observaciones:

SUBTOTAL	**23617,20**
DESCUENTO	**0,00**
SUBTOTAL NETO	**21034,20**
SUBTOTAL IVA 15	**20314,20**
SUBTOTAL IVA 5	**0,00**
SUBTOTAL 0%	**720,00**
IVA 15 %	**3362,58**
IVA 5%	**0,00**
TOTAL	**26979,78**

EMITIDO POR:

RECIBI POR:

- **Anexo 7.4. Estudio de mercado kits de herramientas**

Wildlife Conservation Society								
1.Datos generales								
Proyecto	"Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano, Mediante el sistema agroforestal en las comunidades: Lorenzó, San José de Wisuya, Sandi Yaku, Chandia Na´en".							
Objeto	Adquisicion de Kit de Herramientas y Materiales Agrícolas							
Fecha sondeo de mercado	11-feb-25							
. Identificacion de proveedores								
Criterio	**Oferente 1**		**Oferente 2**		**Oferente 3**		**Oferente 4**	
Tarifa administrativa	26.999,40		27.020,01		26.979,78			
Fecha de cotizacion o recepcion	18/2/2026		11/2/2026		18/2/2026			
Tipo de persona (natural/juridic	NATURAL		NATURAL		NATURAL			
Pais de ubicación	ECUADOR		ECUADOR		ECUADOR			
valorar desde perspectiva técnica p.e experiencia en la								
Estimacion de presupuesto								
	Oferente 1		**Oferente 2**		**Oferente 3**		**Oferente 4**	
	Nombre	AGROFERRETERIA GRAL S.A.S	Nombre	FERRETERIA J T	Nombre	FERRECONSTRUC ELOY ALFARO CIA. LTDA		
	Detalle producto/ actividad	**Valor**	**Detalle producto/ actividad**	**Valor**	**Detalle producto/ actividad**	**Valor**	**Detalle producto/ actividad**	**Valor**
5.270,00	Forex Fumigadora 20l Manual	4.200,00	Bomba p/fumigar manual 20 LT Sprayer	5.400,00	Bomba P/Fumigar Manual 20 Lt Royal Condor	6.210,00		
841,80	Bll Pala Puntona M/Pl	793,50	Pala puntona Bellota	879,75	Bellota Pala Punta Redonda Optima H13	852,15		
841,80	Bll Pala Cuadra M/Plast	793,50	Pala cuadrada Bellota	879,75	Bellota Pala Punta Cuadrada D13	852,15		
2.414,65	Truper Tijera Podar 8"	2.697,90	Tijera Altuna de poda 1 mano	2.100,00	Tijera De Poda 1 Mano	2.446,05		
1.595,81	Elite Navaja P/Injertar	1.498,20	Navaja de Injertar Plegable Con Pua 8420	1.702,23	Navaja de Injertar Plegable Con Pua 8420	1.587,00		
514,51	Machet.Hansa Aguila C/R	586,50	Machete Bellota 191-24PPR/SA	414,00	Machete Bellota 24"	543,03		
1.001,65	Poncho Impermeable Ref Amarill	828,00	Poncho Imperm Tela Poliéster Termosellado Refelcti PVC	1.035,00	Poncho Impermeable Pvc Negro 2.10cmx1.40cm	1.141,95		
1.223,60	Botas Hombre Negra Venus T 40	1.311,00	Bota Venus Llanera #40	1.311,00	Bota Agricola Negra T-38	1.048,80		
798,90	Herragro Rastrillo 22 D	720,00	Rastrillo Metal 22 Dientes Con Cabo Crowmain	848,70	Truper Rastrillo De Jardin Reforzada 22d	828,00		
1.326,87	Herragro Excavadora Gr	1.380,00	Excavadora Grand Bellota	1.565,61	Bellota Excavadora D17 Grande Trifi	1.035,00		
5.196,00	Carretilla Truper Tomate	5.100,00	Carretilla Truper	5.382,00	Carretilla Metálica 80l Truper Sxmlgo10722	5.106,00		
1.042,40	Azadón Forjado 252	1.242,00	Azadón Bellota 2a	919,20	Azadón Grande Con Cabo 310-A Bellota	966,00		
907,00	El Rollo De Cinta Parafilm M	1.311,00	El Rollo De Cinta Parafilm M	690,00	El Rollo De Cinta Parafilm M	720,00		
760,40	Fundas De Polietileno De Alta Densidad (Pead)	768,00	Fundas De Polietileno De Alta Densidad (Pead)	768,00	Fundas De Polietileno De Alta Densidad (Pead)	745,20		
1.087,44	Guante Textil De Poliéster Recubrimiento Látex Rugoso Mediano	1.359,30	Guante Textil De Poliéster Recubrimiento Látex Rugoso Mediano	1.040,52	Guante Textil De Poliéster Recubrimiento Látex Rugoso Mediano	862,50		
294,63	Guante Revestido Pvc Largo	359,49	Guante Revestido PVC Largo	279,45	Guante Revestido PVC Largo	244,95		
1.322,27	Traje para Fumigar en PVC	1.331,01	Traje impermeable de fumigación de dos piezas C16	1.324,80	Traje De Fumigar PVC	1.311,00		
560,00	Limas Planas Hoja Rectangular	720,00	BLL Lima PLANA 10" Mp	480,00	BLL Lima Plana 10" MP	480,00		
Valor total		*26.999,40*		*27.020,01*		*26.979,78*		
Valor total estimado	*$ 27.000*							
Mecanismo utilizado								
4. Conclusion								
Concepto de los analistas								
5.Firmas								
Analista 1	Nombre		Cargo		Entidad			
Analista 2	Nombre		Cargo		Entidad			


- **Anexo 7.5. Coordinación con INABIO**


Dirección de Gestión de Innovación


13 enero 2025

El diseño general se compone de un total de 108 muestras para el estudio. Son nueve réplicas por parcela; siendo cada parcela una chacra, un control positivo (bosque) y un control negativo (descampado). Este patrón de muestreo se repite por cada una de las comunidades seleccionadas. Las muestras serán equidistantes, separadas por aproximadamente 30 metros al interior de cada chacra y parcela. Los mapas a continuación describen espacialmente el sistema de muestreo propuesto.

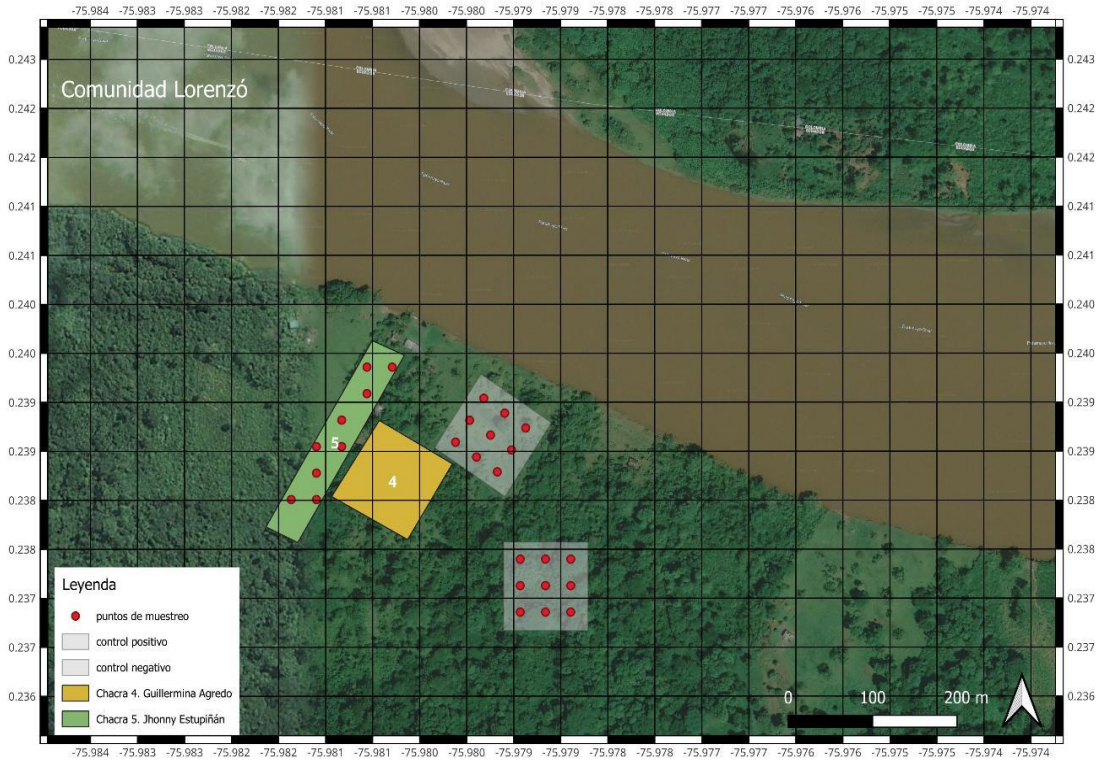


Comunidad Lorenzó
Leyenda
puntos de muestreo
control positivo
control negativo
Chacra 4. Guillermina Agredo
Chacra 5. Jhonny Estupiñán
0
100
200 m

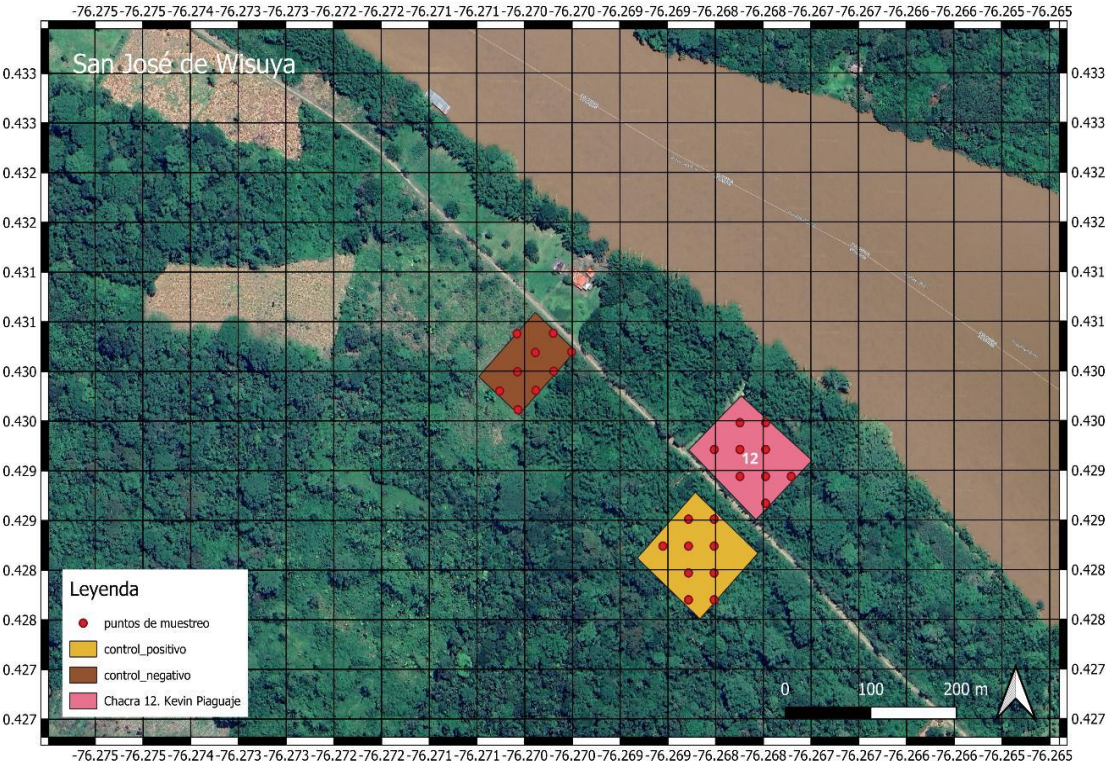
San José de Wisuya
Leyenda
puntos de muestreo
control_positivo
control_negativo
Chacra 12. Kevin Piaguaje
0
100
200 m

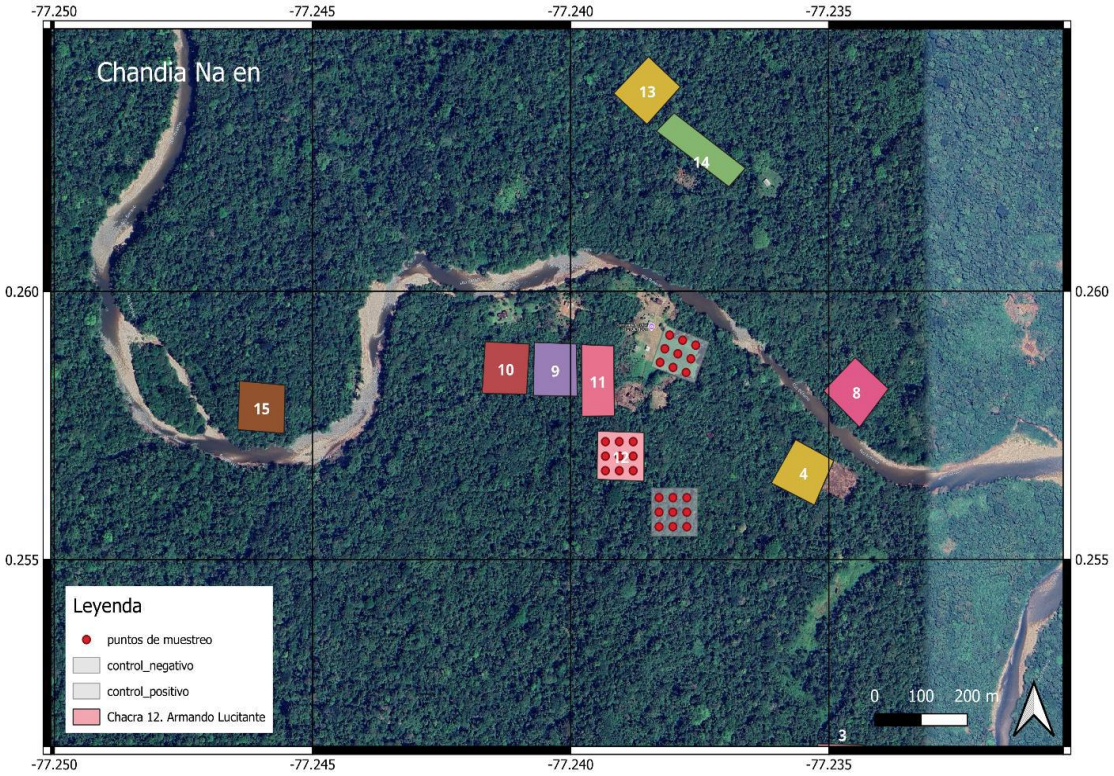
Chandia Na en
-77.250
-77.245
-77.240
-77.235
0.260
0.255
13
14
10
9
11
8
15
12
4
3
Leyenda
puntos de muestreo
control_negativo
control_positivo
Chacra 12. Armando Lucitante
0 100 200 m

- **Lista de materiales**

Lista de materiales requeridos para colecta de Flora EF 2025			
Material	**Uso/ Descripción**	**Cantidad**	**Proveedor**
Fundas de basura color negro con cinta de amarre, 23"x27" (58 cm x 68 cm)	Paquetes de 20 unidades de fundas plásticas para almacenar muestras botánicas en campo.	6	https://futuriplast.com/producto/rollo-basura-champion-23x27-la-dura-x-20-unds/
Fundas quintaleras de plástico.	Fundas de plástico gruesas para recoger muestras de herbario en campo.	12	https://www.lacobacha.com.ec/nosotros/
Paquete de 100 fundas plásticas. Tamaño 40 x 30 cm	Para colecta de muestras de herbario.	4	https://www.kywi.com.ec/hogar/limpieza/bolsas-y-fundas-de-basura?srsltid=AfmBOoqGXeh5Py2hK1eX0E1aHOnH1k33r0t7N-ieqII9skYLIScOjTr_
Cartulinas de herbario. Libre de ácidos.Tamaño INEN A-3 (29,7 cm x 42 cm. Peso 300 gr.	Para montaje de ejemplares de herbario.	500	Gonzalo Sánchez/0989080107
Galón de pega blanca	Para montaje de muestras botánicas.	1	https://tienda.demaco.ec/plasticola-fuller-gl
Hilo dental	Para montaje de muestras botánicas.	10	https://www.fybeca.com/hilo-dental-expansion-plus-johnson-and-johnson-50-mts-caja/ECFY_9675.html?srsltid=AfmBOorN_EmWnMYs0G4ENbpkO5ihcgsp0sIsHvtkXOJMpGdkSW3Coh2m
Cinta de papel engomado.	Para montaje de muestras botánicas.	2	https://www.tiatula.com.ec/tienda/contactanos/
Resmas de papel de 90 g.	Para elaboración de etiquetas.	2	https://www.pa-co.com/
Resmas de papel de 75 g.	Para elaboración de sobres.	2	https://www.pa-co.com/
Libras de papel periódico	Para prensado de muestras botánicas	50	https://www.lacobacha.com.ec/producto/comercio-usado-periodico-diario/
Cinta de color para marcación	Delimitacion de transectos	2	Kywi
Piola plastica #8	Hacer paquetes muestras	2	Kywi
Cinta Dactape	Para marcación y paquetes	1	https://www.pa-co.com/

Caja de lapiz 6B	Para escribrir codigos de muestras	1	https://www.pa-co.com/
Caja marcadores negros micropunta	Rotular muestras	1	https://www.pa-co.com/
Libreta de campo	Descripción de muestras	2	https://www.pa-co.com/
Costales	Transportar muestras	4	Gymi Guanoluiza/ 0998259898
Alcohol galones	Preservar muestras colectadas	3	https://www.pa-co.com/
Frasco de Vidrio con Tapa Plástica Roja 4.5 Litros	Laboratorio	100	BOYACA
Limpión industrial "Econatural" sin precorte, de 600 m. - BLANCHY	Laboratorio	12	Kywi

- **Monitoreo microbioma presupuesto**

MONITOREO MICROBIOMA EN MUESTRAS DE SUELO
Proyecto:
Cantidad de muestras: 108

Proceso	Casa Comercial/ Proveedor	Reactivo o insumo	Número	Precio sin IVA	I.V.A.	Total
Colecta de muestra	AMP Ecuador	Tubos de colección de muestras de 50 mL (paquete x 25 tubos)	13	$13,00	$1,95	$194,35
Extracción de ADN	Gustavo Venegas Representaciones	PURELINK™ MICROBIOME DNA PURIFICATION KIT. 1 KIT. INVITROGEN. 50 rx	3	$467,00	$70,05	$1.611,15
Extracción de ADN	AMP Ecuador	Etanol absoluto grado analítico. 5L	2	$83,00	$12,45	$190,90
Extracción de ADN	AMP Ecuador	Agua grado biología molecular (1L)	1	$72,00	$10,80	$82,80
Extracción de ADN	AMP Ecuador	Tubos de centrífuga de 15 mL (paquete x 50 tubos)	3	$18,00	$2,70	$62,10
Extracción de ADN	AMP Ecuador	1,5 mL tubos de microcentrífuga de máxima recuperación, libre de DNAsas y RNAsas (paquete de 500 unidades)	1	$20,00	$3,00	$23,00
Extracción de ADN	AMP Ecuador	2 mL tubos de microcentrífuga, libre de DNAsas y RNAsas (paquete de 500 unidades)	1	$26,00	$3,90	$29,90
Extracción de ADN	AMP Ecuador	Cajas para criopreservación de 81 posiciones (paquete x 5 u). Cajas para almacenamiento de tubos de 1,5 mL	1	$49,00	$7,35	$56,35
Amplificación	AMP Ecuador	Cajas para almacenamiento de tubos PCR de 96 posiciones. (paquete x 5 u)	1	$52,00	$7,80	$59,80
Amplificación	Gustavo Venegas Representaciones	BSA (Albúmina sérica bovina) 5 mg	1	$54,00	$8,10	$62,10
Amplificación	BioGena	LongAmp HotStart Taq 2X Master Mix. M0533S. 100 rxn	2	$602,36	$90,35	$1.385,44
Secuenciación	Biomol Ecuador	16S Barcoding Kit 24 V14. SQK-16S114.24	1	$1.443,75	$216,56	$1.660,31
Secuenciación	Biomol Ecuador	Flongle Flow Cell R10.4.1. FLO-MIN114	3	$1.050,00	$157,50	$3.622,50

Secuenciación	Biomol Ecuador	Flow cell Wash Kit. EXP-WSH004	1	$187,50	$28,12	$215,62
Secuenciación	BioGena	PCR-8 strips tapa plana (paquete x 120 u)	2	$66,18	$9,93	$152,22
Cuantificación de ADN en los procesos de extracción, amplificación y secuenciación	Gustavo Venegas Representaciones	Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit. 500 rx	1	$744,00	$111,60	$855,60
Todos los procesos de laboratorio	AMP Ecuador	Puntas de micropipetas 0,2-2 µL (bolsa x 1000)	2	$12,00	$1,80	$27,60
Todos los procesos de laboratorio	AMP Ecuador	Puntas de micropipetas 20-200 µL (bolsa x 1000)	2	$15,00	$2,25	$34,50
Todos los procesos de laboratorio	AMP Ecuador	Limpión industrial de fibra natural de hoja simple de 20 cm x 300 m, de color natural (café)	2	$17,00	$2,55	$39,10
Todos los procesos de laboratorio	AMP Ecuador	Guantes de nitrilo powder free XS	5	$8,80	$1,32	$50,60
	Técnico de campo	Técnico de campo	3	$900,00	$135,00	$3.105,00
					GRAN TOTAL	**$13.520,94**

ANEXO 8: Actas de recepción de bienes.

COMPU SECURITY

AUTOMATIZACIÓN · VIDEOVIGILANCIA · GAME SHOP · ACCESO · COMPUTADORES · SERVICIO TÉCNICO · CONECTIVIDAD · ACCESORIOS

NOTA DE ENTREGA N.º CSLA 0025 – 2026

CODIGO PROCESO:	GADPS-210456-006
CONTRATISTA:	GUZMÁN SANCHO MARCO PATRICIO
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS EN SU REPRESENTACION
FECHA:	NUEVA LOJA, MIERCOLES 19 DE FEBRERO 2026
OBJETO:	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN DE LA CHACRA AGRÍCOLA ANCESTRAL DE LAS NACIONALIDADES Y EL PUEBLO AFROECUATORIANO MEDIANTE EL SISTEMA AGROFORESTAL

ITEM	DETALLE DE LOS BIENES	MARCA	CANT	UND/MED.	SERIE
01	CAMARA CANON EOS Rebel T7 con EF-S 18-55 IS II con SD de 256GB, incluye batería, cargador y cordón	CANON	1	Unidad	Camara: 932079048203 Lente: 5789029046
02	GPS GARMIN GPSMAP 65s incluye pilas recargables incluye cable USB y colgante.	GARMIN	1	Unidad	6qd055210
03	PROYECTOR EPSON 3400LUMNES con cable de poder, control y pilas incluye generador portatil de 1200w con cable de poder y cable de carga para carro	EPSON	1	Unidad	ee

Firmado electrónicamente por: MARCO PATRICIO GUZMAN SANCHO. Validar únicamente con FirmaEC

ENTREGUE CONFORME
Tnlgo. Guzmán Sancho Marco Patricio
CONTRATISTA
Ruc: 2100404587001

Firmado electrónicamente por: ISMAEL REYNERIO SILVA PAREDES. Validar únicamente con FirmaEC

RECIBÍ CONFORME
Ing. Ismael Silva

Firmado electrónicamente por: RONAL MILLAN LUDEÑA JARAMILLO. Validar únicamente con FirmaEC

RECIBÍ CONFORME
Lic. Ronal Ludeña
JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

ANEXO 9: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL

- **Revisión y acompañamiento técnico al Plan para Pueblos Indígenas (PPI)**

Tabla 1. Tabla de presupuesto del PPI.

Actividad	Descripción / Implementación	Riesgo potencial identificado	Medidas de mitigación	Fecha referencial	Responsables	Presupuesto
Socialización del PPI y acuerdos comunitarios	Talleres participativos en cada territorio con comunidades beneficiarias para explicar alcances, beneficios y mecanismos de participación.	Baja participación o desconocimiento de procesos del proyecto.	Realizar consultas previas con líderes y sabios comunitarios y aplicar metodologías participativas adaptadas al contexto cultural.	nov-25	Equipo técnico del GADPS en coordinación con presidentes y líderes comunitarios.	1500
Conformación del comité del PPI	Planificación participativa para definir roles y responsabilidades mediante selección de promotores comunitarios.	Limitada participación de mujeres y jóvenes en procesos de planificación.	Promover participación equitativa y liderazgo de mujeres y jóvenes dentro del comité.	nov-25	Equipo técnico del GADPS y comunidades beneficiarias.	1500
Formación en enfoque de género e inclusión	Jornadas de sensibilización y talleres sobre igualdad de género, liderazgo y participación activa de mujeres y jóvenes.	Exclusión de mujeres, ancianos o jóvenes en procesos del proyecto.	Planificar actividades con enfoque intercultural y horarios adecuados que permitan la participación equitativa.	nov-25	Equipo técnico de Sucumbíos Solidario y GADPS.	1000
Capacitación en liderazgo y gobernanza local	Talleres y asesoría técnica dirigidos a dirigencias comunitarias para fortalecer la gestión organizativa.	Débil gobernanza o limitada articulación organizativa.	Fortalecer estructuras organizativas respetando normas y formas tradicionales de organización comunitaria.	ene-26	Equipo técnico especializado de la Dirección de Nacionalidades y Afroecuatoriano del GADPS.	1500
Talleres de saberes y conocimientos ancestrales	Talleres prácticos facilitados por sabios y sabias de las nacionalidades y pueblo afroecuatoriano para rescatar prácticas	Pérdida, desvalorización o uso inadecuado del conocimiento ancestral.	Fortalecer y revalorizar conocimientos tradicionales mediante espacios de intercambio intergeneracional.	jun-26	Equipo técnico del GADPS y sabios comunitarios.	2000

	tradicionales.					
Talleres de conservación y manejo agroforestal	Capacitación sobre manejo sostenible del suelo y sistemas agroforestales.	Uso inadecuado del suelo o de recursos naturales.	Promover manejo agroforestal sostenible respetando planificación territorial y normas culturales.	Ago – Nov 2026	Equipo técnico del GADPS.	1500
Pasantías e intercambio de experiencias (Ecuador – Colombia)	Intercambio de experiencias exitosas entre comunidades para fortalecer capacidades.	Aislamiento organizativo o baja cohesión comunitaria.	Promover aprendizaje colectivo e intercambio intercultural respetando contextos socioculturales.	Jun 2026 – Ene 2027	Equipo técnico del GADPS y comunidades.	2500
Incorporación del enfoque cultural y de género en la planificación institucional	Revisión de la planificación institucional para integrar enfoque intercultural y de género.	Imposición de criterios externos a la cosmovisión de las comunidades.	Implementar procesos de diálogo intercultural y sensibilización a técnicos externos.	May 2026 – May 2027	Equipo técnico y Dirección de Nacionalidades y Pueblo Afroecuatoriano del GADPS.	2000
Difusión y comunicación del proyecto	Materiales audiovisuales, mingas comunitarias y difusión de actividades con enfoque cultural.	Invisibilización de la interculturalidad o baja valoración cultural.	Promover la valoración cultural y el respeto a la diversidad mediante estrategias de comunicación intercultural.	Nov 2025 – Jul 2027	Equipo técnico de comunicación del GADPS.	1500
Monitoreo y evaluación participativa	Sistema participativo de seguimiento con comunidades y equipo técnico.	Falta de seguimiento o debilidad en la aplicación del enfoque				1000

- **Nota técnica sobre identificación de riesgo estacional de inundación en chacras agroforestales**

Proyecto: Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral mediante Sistema Agroforestal
Periodo evaluado: agosto 2025 – febrero 2026
Elaborado por: Freddy Eulogio Sarango Lapo
Fecha: noviembre 2025

1. Antecedentes

En el marco de las actividades de georreferenciación y sistematización cartográfica de chacras agroforestales en las comunidades de Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en, se realizó el registro espacial mediante dispositivos GPS y procesamiento en sistema de información geográfica (QGIS).

Durante el levantamiento de información territorial y validación comunitaria, se identificó que algunas chacras se encuentran ubicadas en zonas cercanas a riberas y áreas con influencia directa de dinámica fluvial.

2. Identificación de riesgo estacional

Con base en la información comunitaria y la experiencia territorial, se reconoce que durante los meses de junio y julio se presentan inundaciones recurrentes propias del régimen hidrológico amazónico, las cuales pueden generar:

- Afectación temporal de áreas productivas.
- Dificultades de acceso y movilidad fluvial.
- Pérdida parcial de cultivos en zonas bajas.
- Saturación de suelos y alteración de sistemas radiculares.

A partir del análisis cartográfico preliminar, se identificaron chacras ubicadas en proximidad a cuerpos hídricos, lo que implica un nivel diferenciado de exposición a eventos de inundación estacional.

3. Consideraciones técnicas

El análisis realizado no constituye un estudio hidrológico detallado, sino una identificación preventiva basada en:

- Georreferenciación de chacras.
- Observación territorial directa.
- Validación con autoridades y productores comunitarios.
- Reconocimiento de patrones históricos de inundación.

4. Recomendaciones técnicas

- Con el fin de reducir riesgos productivos y fortalecer la resiliencia del sistema agroforestal, se recomienda:

1. Priorizar la implementación de sistemas agroforestales diversificados en zonas con menor exposición a inundación.
2. Promover especies tolerantes a condiciones de humedad en áreas cercanas a riberas.
3. Integrar criterios de riesgo climático en la planificación de viveros comunitarios.
4. Mantener actualización periódica de la base cartográfica para monitoreo preventivo.
5. Considerar el calendario hidrológico amazónico en la planificación de entregas de material vegetativo.

5. Conclusión

- La identificación temprana de chacras en zonas potencialmente expuestas a inundación constituye una medida preventiva que fortalece la planificación técnica del subproyecto y contribuye al cumplimiento de estándares ambientales y sociales, promoviendo la sostenibilidad productiva y la reducción de riesgos en el territorio.
- En relación al establecimiento de parcelas productivas en zonas próximas a las riberas se encuentra respaldado por el marco normativo vigente del Ecuador, el cual reconoce la validez y continuidad de las prácticas ancestrales en territorios indígenas.
- La Constitución de la República, en su artículo 57, garantiza los derechos colectivos de las comunidades a mantener sus formas tradicionales de ocupación y manejo de la tierra. Complementariamente, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales establece la posesión ancestral y el derecho al uso, usufructo y administración de los territorios comunitarios, incluidos aquellos ubicados en zonas ribereñas. A su vez, el Código Orgánico del Ambiente incorpora el enfoque intercultural, permitiendo actividades tradicionales que se desarrollen en equilibrio con el entorno. En conjunto, este marco jurídico legitima la permanencia y fortalecimiento de sistemas productivos como las chacras y los sistemas agroforestales, propios de las comunidades que históricamente han gestionado estos espacios.

ANEXO 10: REFERENCIA A INFORMES MENSUALES

Como respaldo técnico del presente informe semestral, se deja constancia de que las actividades aquí reportadas se sustentan en los informes mensuales correspondientes a:

- Octubre 2025
- Noviembre 2025
- Diciembre 2025
- Enero 2026
- Febrero 2026

Los documentos completos reposan en el archivo institucional del proyecto y podrán ser remitidos en caso de requerimiento formal.

10. Bibliografía

No se utilizaron fuentes bibliográficas externas para la elaboración del presente informe técnico, el cual se basa en información primaria generada en campo y documentación institucional del proyecto.

MARCO DE RESULTADOS DEL SUBPROYECTO

Objetivo principal	*Promover la seguridad Alimentaria mediante el desarrollo e implementación de un modelo integral participativo que combine la producción sostenible de alimentos con una estrategia comunicacional basada en un enfoque intercultural que garantice el abastecimiento continuo de alimentos, revalorizando sus saberes ancestrales.*		
Objetivo específico 1:	**Fortalecer los sistemas de producción de alimentos mediante la integración de técnicas modernas y tradicionales para asegurar el acceso y abastecimiento continuo de alimentos saludables.**		
Actividad	**Indicador** *(Establecidos en el Marco de resultados)*	**Avance** *(Indicar avance en el indicador hasta la fecha de entrega de este reporte)*	**Medios de verificación** *(Listar los medios de verificación que hace entrega. Ej: Listas de asistencias, base de datos, informes, actas, memorias, fotos, etc)*
Georreferenciación y registro técnico de chacras agroforestales	Número de chacras georreferenciadas y registradas en sistema SIG.	60 chacras georreferenciadas y sistematizadas en QGIS hasta febrero 2026.	Base de datos geoespacial, archivos shapefile, mapas impresos, registros GPS, informes técnicos, fotografías.
Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas y Ambientales	Número de talleres realizados y número de participantes capacitados.	8 talleres ejecutados (4 BPA + 4 BPPAA) en las cuatro comunidades.	Listas de asistencia, registro fotográfico.
Capacitación en toma y manejo de muestras de suelo	Número de capacitaciones técnicas realizadas.	1 capacitación especializada realizada a promotores comunitarios.	Lista de asistencia, registro fotográfico.
Objetivo principal	*Promover la seguridad Alimentaria mediante el desarrollo e implementación de un modelo integral participativo que combine la producción sostenible de alimentos con una estrategia comunicacional basada en un enfoque intercultural que garantice el abastecimiento continuo de alimentos, revalorizando sus saberes ancestrales.*		

Objetivo específico 2	*Desarrollar capacidades técnicas y organizacional con enfoque de seguridad alimentaria sostenible*		
Actividad	**Indicador**	**Avance**	**Medios de verificación**
Identificación y perfilamiento de bioemprendimientos comunitarios	Número de comunidades con bioemprendimientos identificados.	Proceso participativo desarrollado en las 4 comunidades para identificación de potenciales bioemprendimientos.	Registro de asistencia y fotográfico. Informe técnico consolidado elaborado por el ISTEC (documento bajo custodia institucional).
Fortalecimiento técnico a promotores comunitarios	Número de promotores capacitados.	Promotores de las 4 comunidades capacitados en manejo técnico y seguimiento productivo.	Listas de asistencia, informes de acompañamiento, fotografías.
Fortalecimiento operativo mediante adquisición de equipos técnicos	Número de equipos adquiridos y operativos.	4 equipos electrónicos adquiridos y en funcionamiento (cámara fotográfica, proyector multimedia, GPS, estación de energía portátil).	Actas de recepción, facturas, registros fotográficos.
Objetivo principal	*Promover la seguridad Alimentaria mediante el desarrollo e implementación de un modelo integral participativo que combine la producción sostenible de alimentos con una estrategia comunicacional basada en un enfoque intercultural que garantice el abastecimiento continuo de alimentos, revalorizando sus saberes ancestrales.*		
Objetivo específico 3	*Desarrollar e implementar campañas de comunicación y programas educativos que difundan información sobre nutrición, beneficios de la producción sostenible y prácticas alimentarias saludables*		
Actividad	**Indicador** *(Establecidos en el Marco de resultados)*	**Avance** *(Indicar avance en el indicador hasta la fecha de entrega de este reporte)*	**Medios de verificación** *(Listar los medios de verificación que hace entrega. Ej: Listas de asistencias, base de datos, informes, actas, memorias, fotos, etc)*

Socialización del proyecto y acompañamiento comunitario	Número de espacios comunitarios de socialización realizados.	4 procesos de socialización inicial (septiembre 2025) y acompañamiento continuo durante implementación.	Actas comunitarias, listas de asistencia, registro fotográfico.
Objetivo principal	*Promover la seguridad Alimentaria mediante el desarrollo e implementación de un modelo integral participativo que combine la producción sostenible de alimentos con una estrategia comunicacional basada en un enfoque intercultural que garantice el abastecimiento continuo de alimentos, revalorizando sus saberes ancestrales.*		
Objetivo específico 4	*(Indicado en el Anexo 1 de la convocatoria)*		
Actividad	**Indicador**	**Avance**	**Medios de verificación**
Estructuración técnica para implementación de viveros comunitarios	Número de viveros planificados técnicamente.	4 viveros comunitarios estructurados técnicamente y con requerimiento elaborado.	Documento de requerimiento técnico
Consolidación de requerimiento de especies vegetales	Número de listados técnicos consolidados por comunidad.	4 listados técnicos de especies priorizadas consolidados.	Matrices de consolidación y base de datos técnica.
